

Název akce:

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV**ZMĚNA****01**

SCHVÁLENO:

Změna trasy kanalizace C2-3**OBJEDNATEL:****Město Strmilov**

Se sídlem: Náměstí 60, 378 53 Strmilov

Zastoupení: Martin Novák, starosta

IČ: 00247511

ZHOTOVITEL:**VHST s.r.o.**

Se sídlem: Myslotínská 1430, Pelhřimov 393 01

Zastoupení: Ing. David Štursa, VHST s.r.o.

IČ: 02464471

STRUČNÝ POPIS:**Změna trasy kanalizace C2-3****POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

Během výstavby kanalizace bylo v místě provádění stoky C2-3 po vytýčení trasy zjištěno, že v úseku mezi šachtami Š99 a Š104 nelze realizovat kanalizaci dle projektu. Vzhledem k tomu, že prostor v navrhovaném místě je velmi stísněný, nebylo možno provádět kanalizaci v projektovaných hloubkách ani umístit kanalizační šachty bez vysoké míry rizika poškození okolních objektů, které s místem stavby jednak těsně sousedí, a současně mají nekvalitně provedené a degradované založení.

Nový stav změny: Stoka C2-3 byla posunuta na sousední pozemek p.č. 1341. Touto úpravou došlo k přemístění stoky ze schodiště do zahrady. Tato změna zajistila, aby se stávající nemovitost v havarijním stavu ještě více nepoškodila a současně umožnila uložení kanalizace do menší hloubky.

Z výše uvedeného důvodu bylo při jednání zhotovitele s investorem, za účasti technického dozoru investora a projektanta, rozhodnuto o zpracování změny stavby před dokončením.

S ohledem na nové zjištěné skutečnosti byla stavba v řešeném úseku pozastavena, projektantem byla vypracována změna projektu a následně podána žádost o změnu stavby před dokončením a tato řešena s příslušným stavebním úřadem. Po nabytí právní moci změna stavebního povolení budou práce započaty.

Tato změna se dle odst. 4 § 222 Zákona o veřejných zakázkách nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

DOPAD DO CENY:**-18 928,22 Kč bez DPH****SEZNAM PŘÍLOH:**

- Příloha č. 1 – Rozpočet změny
- Příloha č. 2 – Projekty původního a nového řešení
- Příloha č. 3 – Zápisy k kontrolním dnům

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

01

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Změna bude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení stavby.

Datum:

29.8.19

Jméno:

Restis au Kozel

Podpis:

VHST S.R.O.
Mysloňská 1430, 393 01 Pálhřimov
IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Sweco Hydroprojekt a.s.

Datum:

29.8.2019

Jméno:

CTIBOR

Podpis:

CTIBOR

pracoviště České Budějovice
Zátkovo nábreží 7

370 21 České Budějovice

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

29.8.2019

Jméno:

MARTIN NOVAK

Podpis:

MARTIN NOVAK



MĚSTO
STRMILOV

okres Jindřichův Hradec
PSČ: 378 53
IČ: 00747511, DIČ: CZ00747511

KONTROLA TDS:

ZMĚNU SCHVALUJI

Datum:

29.8.19

Jméno:

3.1.19

Podpis:

3.1.19

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 41_5016_01_01

Stavba: Rozšíření kanalizace Strmilov - Změnový list 01 - změna trasy C2-3

JKSO:

Místo: Strmilov

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Město Strmilov

IČ: 00247511

DIČ:

Zhotovitel:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: 02464471

DIČ: CZ02464471

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-18 928,22
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-18 928,22
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-18 928,22	-3 974,93
snížená	15,00%	ze		

Cena s DPH	v	CZK	-22 903,15
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kanalizace Strmilov - Změnový list 01 - změna trasy C2-3

Objekt: SO01 - Kanalizace - SO01 - Kanalizace

JKSO:

Místo: Strmilov

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Město Strmilov

IČ: 00247511

DIČ:

Zhotovitel:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: 02464471

DIČ: CZ02464471

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-18 928,22

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-18 928,22

DPH základní

21,00%

ze

-18 928,22

-3 974,93

snížená

15,00%

ze

Cena s DPH

v CZK

-22 903,15

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kanalizace Strmilov - Změnový list 01 - změna trasy C2-3

Objekt: S001 - Kanalizace - S001 - Kanalizace

Místo: Strmilov

Datum:

Objednatel: Město Strmilov

Projektant:

0

Zhotovitel: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -18 928,22

HSV - Práce a dodávky HSV -18 928,22

1 - Zemní práce -41 154,15

8 - Trubní vedení 22 225,93

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -18 928,22

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kanalizace Strmilov - Změnový list 01 - změna trasy C2-3

Objekt: SO01 - Kanalizace - SO01 - Kanalizace

Místo: Strmilov

Datum:

Objednatel: Město Strmilov

Projektant: 0

Zhotovitel: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-18 928,22

HSV - Práce a dodávky HSV

-18 928,22

1 - Zemní práce

-41 154,15

15	K	132101204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3	m3	-6,248	64,94	-405,75
17	K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	-8,590	364,91	-3 134,58
18	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-2,148	9,11	-19,56
21	K	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	-8,590	456,16	-3 918,41
22	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-2,148	9,11	-19,56
25	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-7,810	1 013,42	-7 914,81
27	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	-7,810	2 318,69	-18 108,97
47	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-23,428	27,31	-639,82
48	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-15,620	27,31	-426,58
49	K	162501152	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-15,620	181,87	-2 840,81
50	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	-15,620	110,11	-1 719,92
51	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	-23,428	75,35	-1 765,30
52	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-15,620	15,37	-240,08

8 - Trubní vedení

22 225,93


211	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	-84,400	14,82	-1 250,81
212	M	28615200R2	potrubí PVC, hladké, SN 12, DN 200, dl. 5,0 m	kus	-17,133	3 870,00	-66 305,48
213	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	84,980	14,82	1 259,40
214	M	28615200R3	potrubí PVC, hladké, SN 12, DN 300, dl. 5,0 m	kus	17,251	5 371,50	92 663,42
138	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	-1,000	1 004,25	-1 004,25
139	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	-1,000	1 220,55	-1 220,55
140	M	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	-1,000	1 915,80	-1 915,80

Název akce:

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 01

Změna trasy kanalizace C2-3

Příloha č. 2a – PD původního řešení

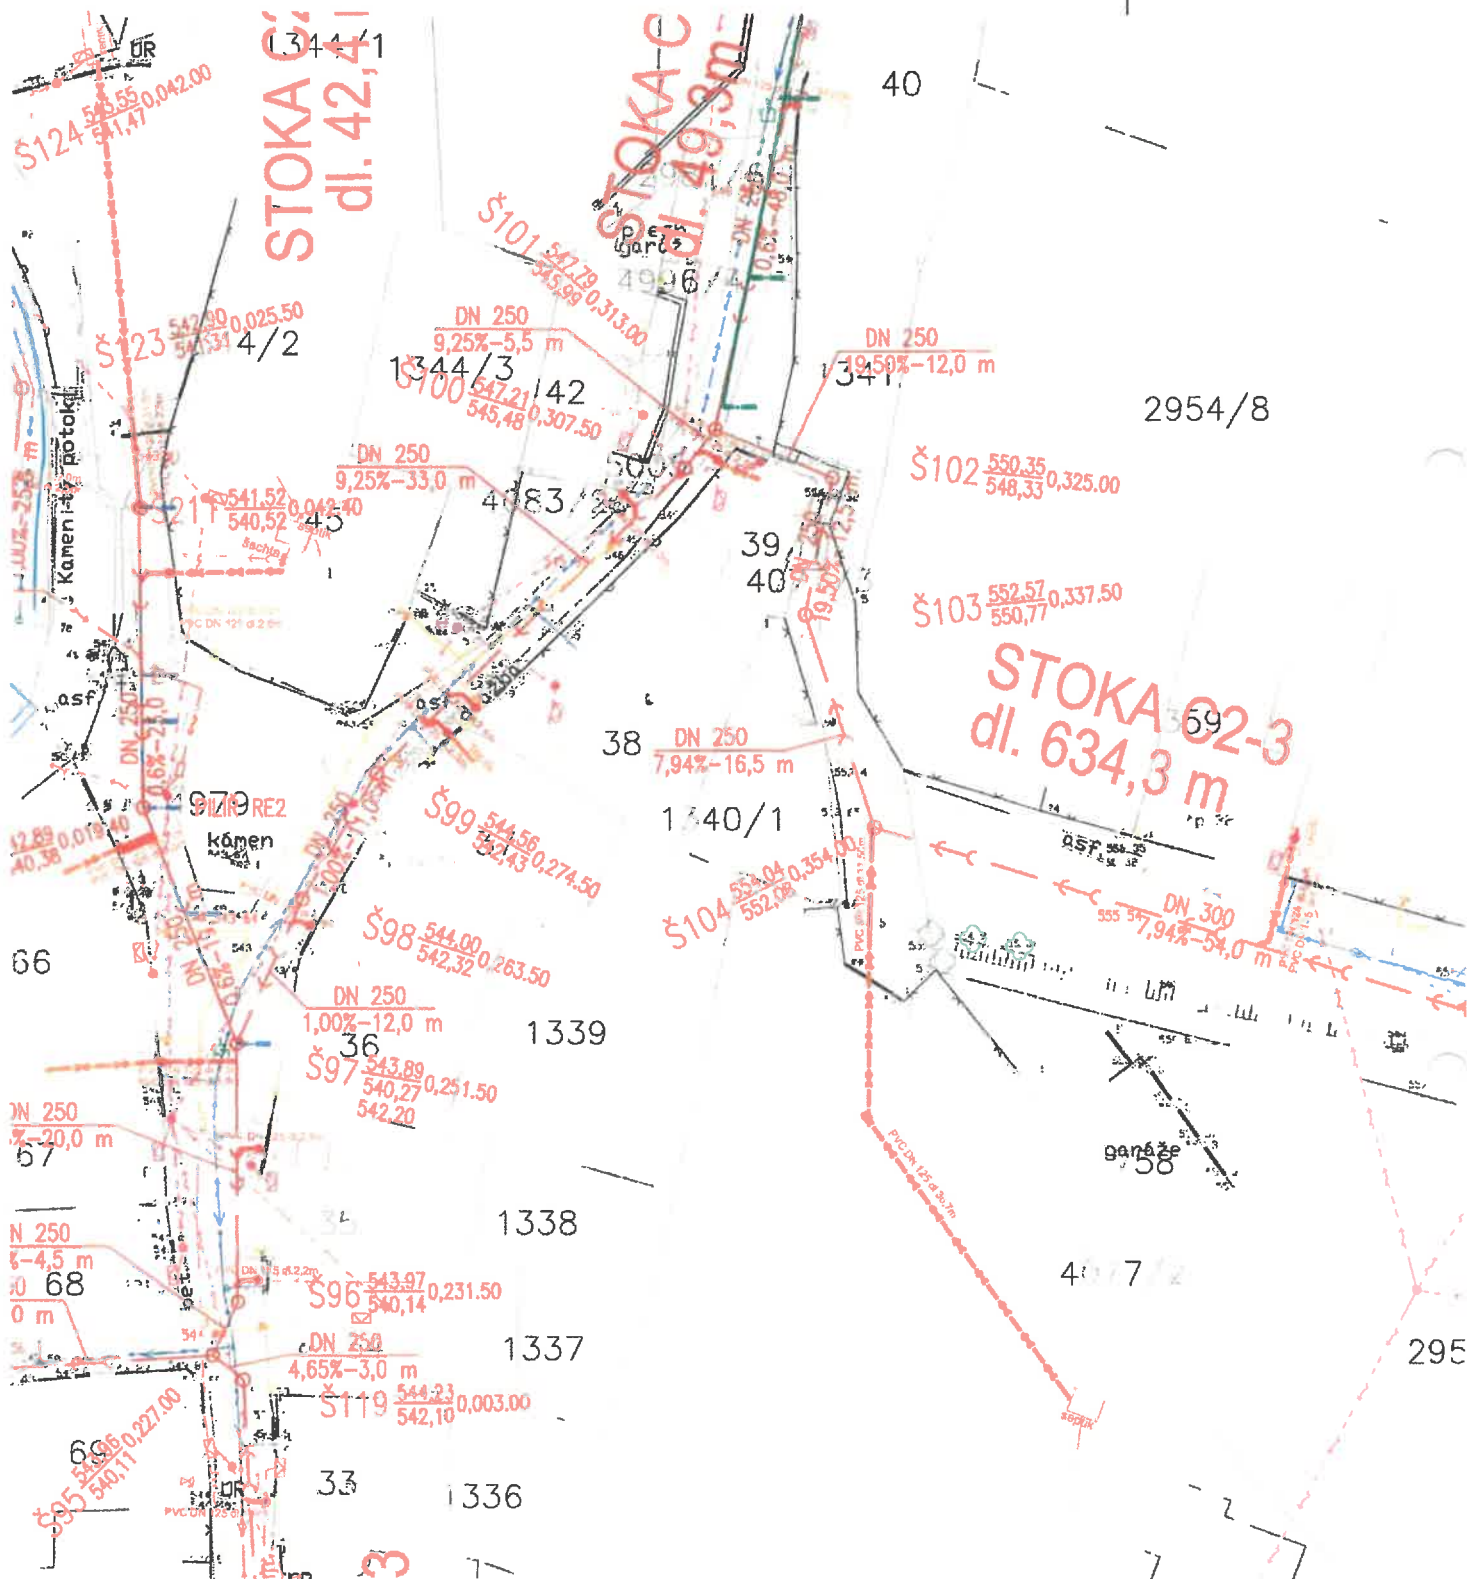

Název akce:

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 01

Změna trasy kanalizace C2-3

Příloha č. 2b – PD nového řešení

2-0.042.00

STOKA C2-3-5
dl. 42,4 m

STOKA C2-3-6
dl. 49,3 m

*212 $\frac{547,98}{546,28}$ 0,048.00

*23 $\frac{542,90}{541,31}$ 0,025.50

*100 $\frac{547,21}{545,40}$ 0,027.50

*211 $\frac{541,52}{540,52}$ 0,042.40

*102 $\frac{550,35}{548,33}$ 0,325.00

*103 $\frac{552,57}{550,77}$ 0,337.50

STOKA C2-3
dl. 634,3 m

*99 $\frac{541,68}{540,37}$ 0,274.50

*104 $\frac{554,84}{552,88}$ 0,354.00

*98 $\frac{544,00}{542,32}$ 0,263.50

*97 $\frac{543,89}{540,27}$ 0,251.50

*95

*9338

*96 $\frac{543,97}{540,14}$ 0,231.50

*9337

*119 $\frac{544,23}{542,10}$ 0,003.00

*933

*9336

0,227.00

2-3-3

*9335

*67

2994/8

*958

Název akce:

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 01

Změna trasy kanalizace C2-3

Příloha č. 3 – Zápisy z kontrolních dnů



ZÁPIS Z KD č. 01 ze dne 10.5.2015

Název stavby:	" Město Strmilov – rozšíření kanalizace a novostavba ČOV "		
Datum konání:	10.5.2018 v 9:00 hod		
Místo konání:	Městský úřad Strmilov		
Zapsal:	Ing. Miroslav Bém - TDI		
Účastníci:	Viz. Prezenční listina		
Přílohy:	Č. 1 – Prezenční listina		
Obdržel:	Účastníci tohoto jednání	Počet stran:	1

- 1 / 1 Harmonogram – zahájeny práce na stoce C2–9 cca 50 m a stoce B– frézování povrchu
- 1 / 2 Zhotovitel předal TDI schválený projekt DIO a rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, aktualizovaný časový a finanční harmonogram stavby – **informace**
- 1 / 3 Zhotovitel předložil TDI seznam navrhovaných materiálů k zabudování do stavby a seznam subdodavatelů . TDI odsouhlasil – **Info**
- 1 / 4 TDI vyzval zhotovitele – ke zpracování pasportu objektů a komunikací , 2x předat objednateli – **VHST**
- 1 / 5 TDI připomínkoval zhotoviteli předložený KZP a TP, žádám o opravu a předložení ke schválení – **VHST**
- 1 / 6 Objednatel projednal se správcem SUSJK způsob opravy krajské komunikace II/164, viz. vyjádření „souhlas s realizací zvláštního užívání silnice– úprava podmínek – **Informace**
- 1 / 7 **Objednatel požádal projektanta o zpracování návrhu změny technického řešení stoky C2–3 od Š 104 – 101, včetně projednání s stav. Úřadem – SWECO**
- 1 / 8 Zhotovitel zpracovává prováděcí dokumentaci monolitické části ČOV, předložit k odsouhlasení – **VHST**
- 1 / 9 Objednatel sdělil záměr společnosti EoN provést zakabelování vedení NN v úseku stoky B před provedením konečných povrchů. Starosta přizve zástupce společnosti EoN na příští kontrolní poradu – **objednatel**

Příští kontrolní den ve čtvrtek 7.6.2018 se srazem na stavbě stoka C2–9 .

Pokud není uveden konkrétní termín splnění zadaného úkolu, má se za to, že je to termín příštího kontrolního dne. Tento zápis nabývá platnosti podpisem zúčastněných stran. Odsouhlasené originály jsou uloženy v archivu TDI.



ZÁPIS Z KD č. 10 ze dne 22.11.2018

Název stavby:	" Město Strmilov – rozšíření kanalizace a novostavba ČOV "		
Datum konání:	22.11.2018 v 9:00 hod		
Místo konání:	Městský úřad Strmilov		
Zapsal:	Ing. Miroslav Bém - TDI		
Účastníci:	Viz. Prezenční listina		
Přílohy:	Č. 1 – Prezenční listina		
Obdrží:	Účastníci tohoto jednání	Počet stran:	2

KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ :

1/7 Objednatel požádal projektanta o zpracování návrhu změny technického řešení stoky C2-3 od Š 104 – 101, včetně projednání s stav. úřadem – SWEKO – SPLNĚNO, vypouští se

6/2 Objednatel požádal projektanta o zpracování změny projektu :

- Navrhujeme přizvednutí stoky C2.3 od Š101 – Š119 a Š95 z důvodu stísněných podmínek a kolize se stávajícími sítěmi. Stoka splaškové kanalizace bude uložena v trase vodovodu, souběžně s kanalizací se provede přeložka vodovodního řádu. Provede zhotovitel. **předáno projektantem**
- Připojení RD čp.167 a 168 bude napojeno gravitací do čerpací stanice a tlakovou kanalizací – **TRVÁ**
- Šachta Š97 nebude spádišťová – **předáno projektantem**
- Z důvodu prostorové kolize budou revizní šachty Š96,119 a 95 zrušeny a nahrazeny jedinou šachtou – **TRVÁ**

KD 10 – žádám projektanta o urychlené zpracování

8/2 Dodavatel p. Brach zpracuje nabídku na opravu dešťové kanalizace na stoce C2-3, **objednatel odsouhlasil nabídku, dále nesledovat**

8/3 Objednatel žádá o provedení úklidu po ukončení prací na ul. Kunžatecké, odvoz přebytečného materiálu, urovnání povrchu komunikace, **TRVÁ**, provedeno nedostatečně **žádám o okamžitou opravu**

KD 10 – provedeno, zhotovitel bude provádět celé zimní období pravidelnou denní kontrolu povrchu komunikace a případně bude dosypávat výmoly

9/2 Stoka C2-3- u nově vybudovaného spádiště provést u tarasu opravu nopové folie. Uvést zahradu do původního stavu – T: **ihned NESPLNĚNO, ŽÁDÁM O OKAMŽITOU NÁPRAVU**

9/3 Stoka C 2 bude od šachty Š61 prostorově posunuta z důvodu kolize s vodovodem a ostatními sítěmi. Šachta Š 64 a Š 65 budou nahrazeny za plastové DN 600- zhotovitel

KD 10 – v místě navržené šachty se nachází vodovodní šachta, z toho důvodu bude navržena Š 61 plastová DN 600

Pokud není uveden konkrétní termín splnění zadaného úkolu, má se za to, že je to termín příštího kontrolního dne. Tento zápis nabývá platnosti podpisem zúčastněných stran. Odsouhlasené originály jsou uloženy v archivu TDI.

Název akce:

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 01

Změna trasy kanalizace C2-3

Příloha č. 4 – Fotodokumentace



