


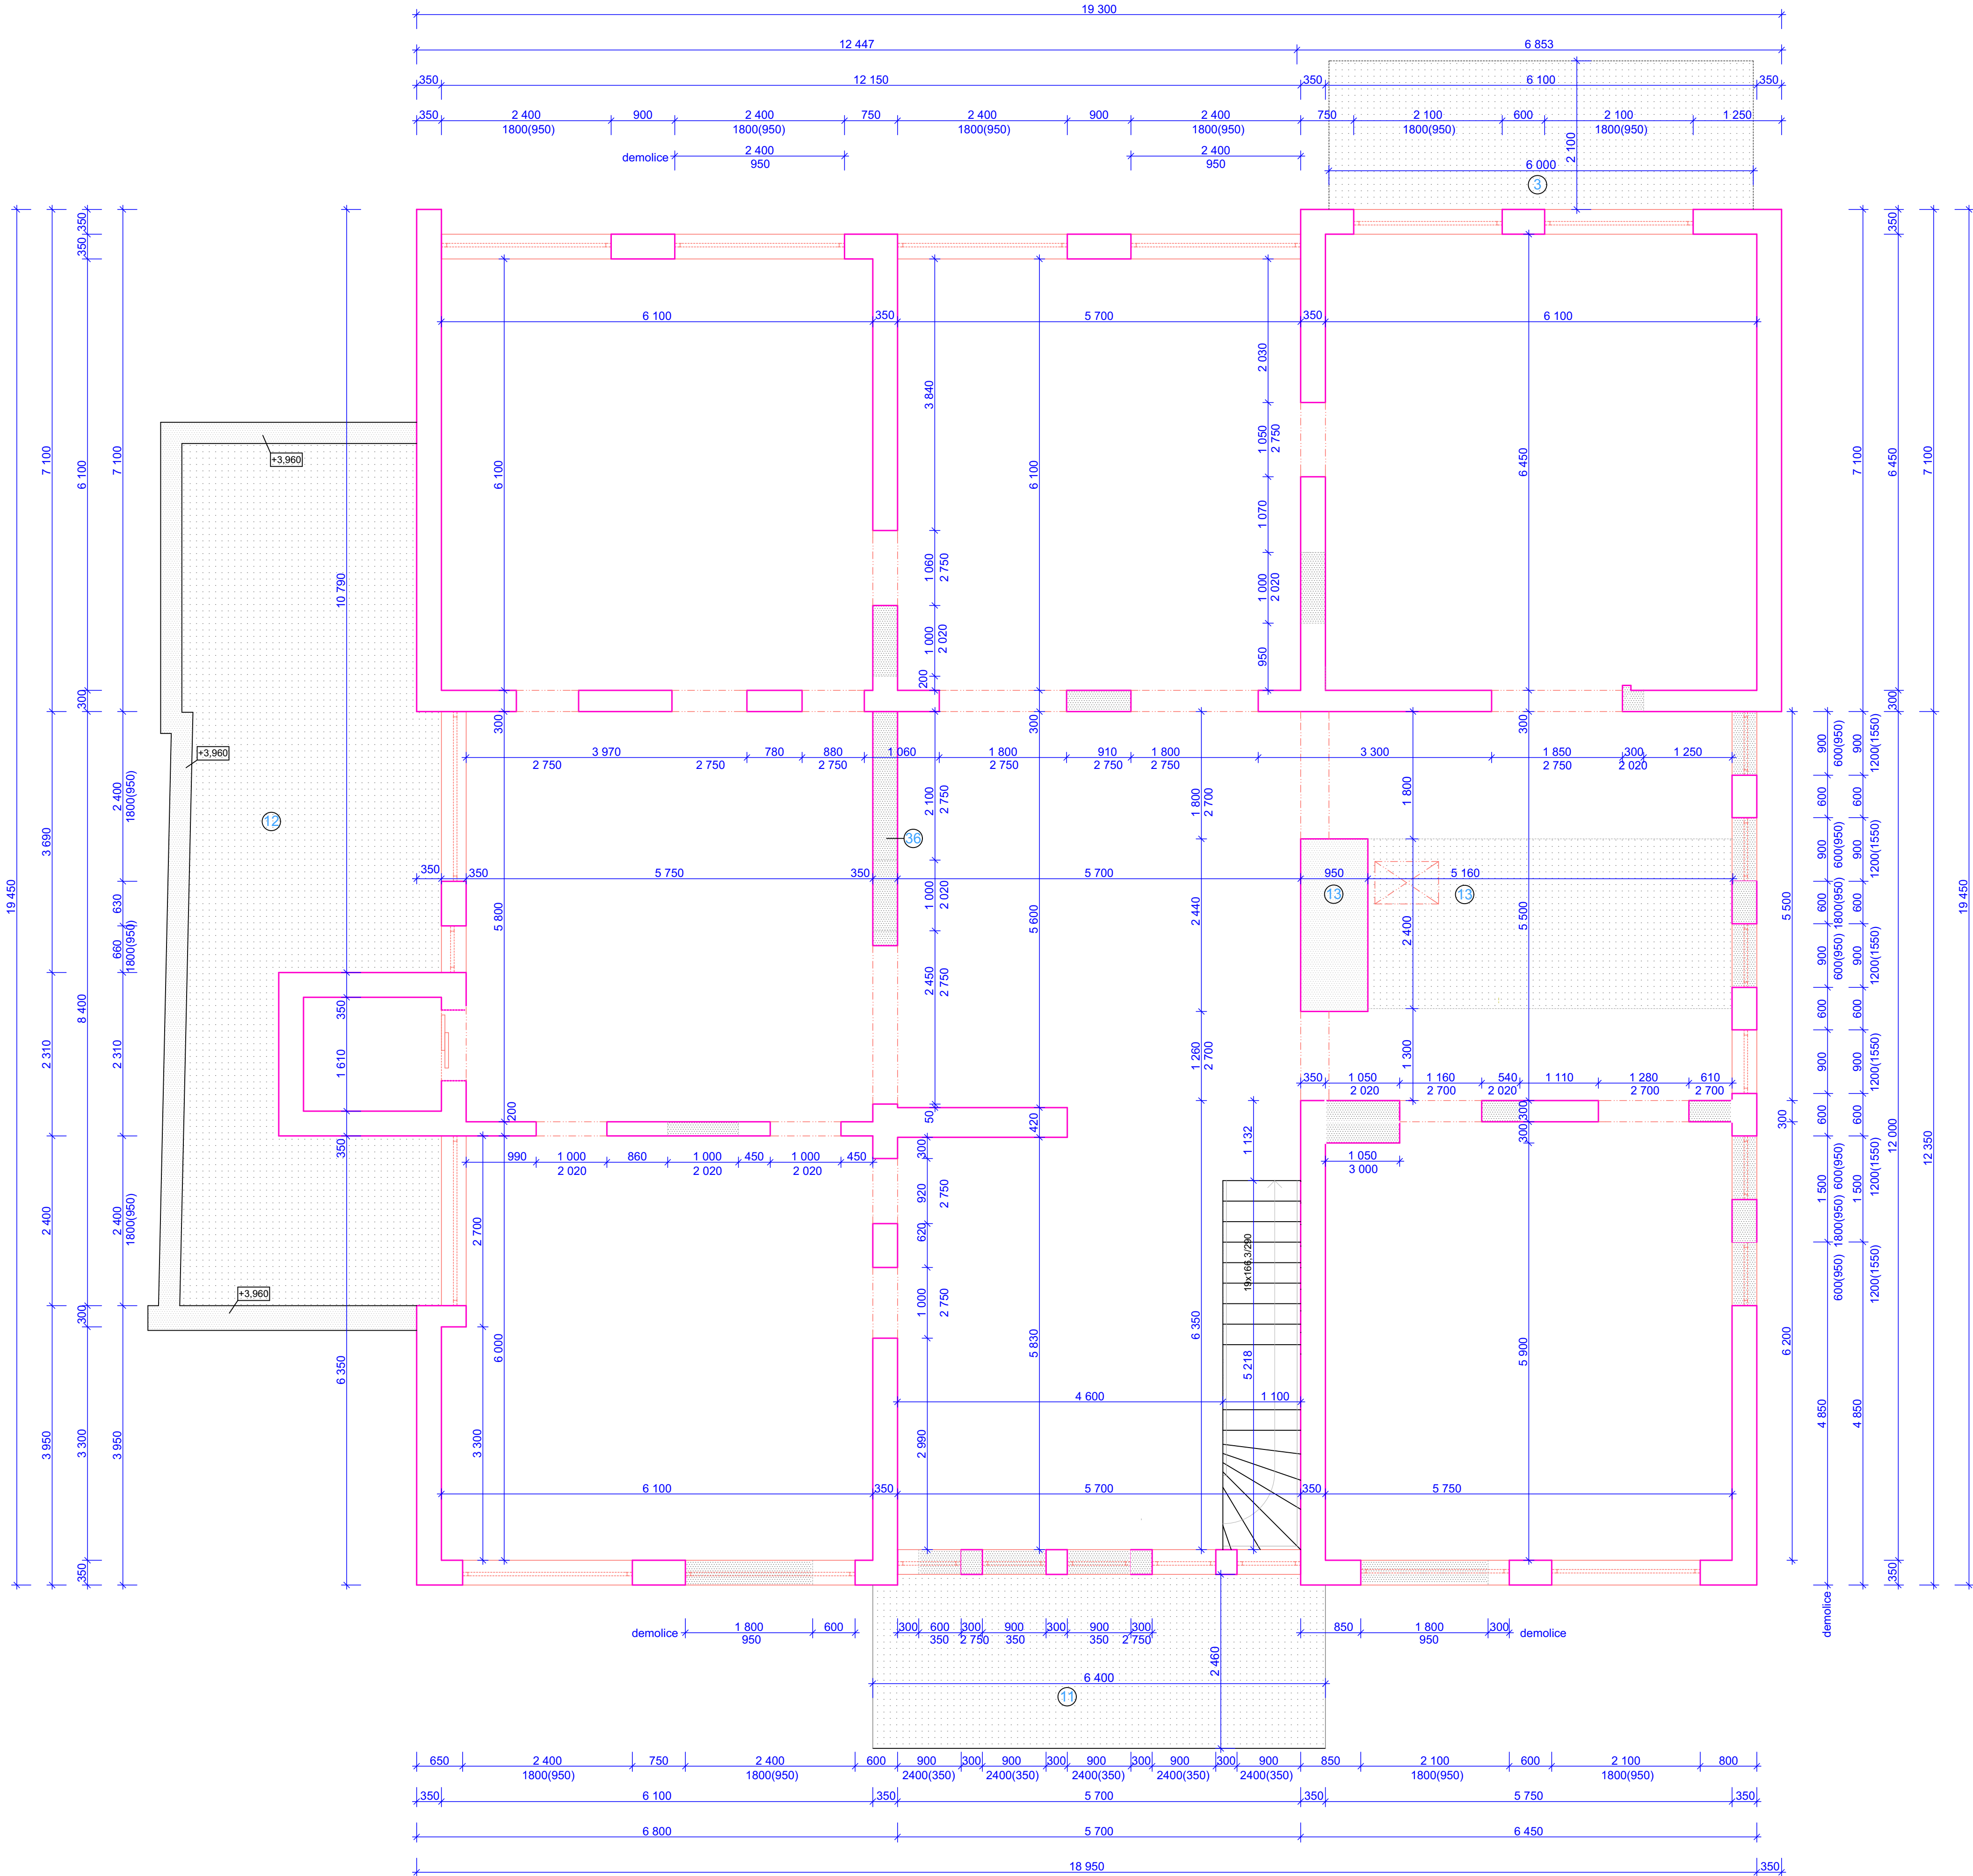

Půdorys 2.NP - demolice M. 1:50

Legenda hmot

- Stávající konstrukce
- Demolované konstrukce

Poznámka

V celém podlaží bude stávající podlaha vybourána po konstrukci stropu. Veškerá stávající okna a dveře budou vybourány.

V místě nově bouraných otvorů budou v předstihu osazeny nové překlady za dodržení technologického postupu pro dodatečné osazování překladů nad nově budovanými otvory. Nejříve bude v místě budoucího překladu vybourána drážka ve zdivu cca do poloviny tloušťky zdi. Následně bude osazen nosník, který bude uklínován proti zdivu v nadpraží. Poté lze vybourat drážku z druhé strany na zbývajících tloušťku zdiva a osadit zbývající část překladu stejným způsobem. Potom bude možno přistoupit k vybourání nového otvoru pod překlady.

- 3 Stávající přístřešek (oc. konstrukce + Lexan) bude demontován
- 11 Stávající konstrukce zastřešení bude zdemolováno (dř.podbití, fošny výšky 220mm, záklop, krytina) včetně nosného zdiva.
- 12 Stávající konstrukce zastřešení bude zdemolováno (dř.podbití, fošny výšky 220mm, záklop, krytina) atiky a části zdiva budou odbourány do výšky +2,950 (cca.1010mm)
- 13 V předstihu bude vybourána část stropu určená k demolici, následně bude provedeno podepření stropu a stávajícího průvlak u bouraného komínu. Potom bude provedena demolice komínu, následně se zabetonují stávající průduchy komínu z 1.NP a poté bude proveden nový ocelový průvlak s nosným sloupkem. Nový ocelový průvlak bude proti stávajícím průvlakům podklínován a v místě uložení nových stropních panelů bude nadbetonován. Následně bude možno odstranit provizorní podepření stropů a osadit nové stropní panely.
- 16 Před demolicí kompletní nosné stěny bude v předstihu vydemolována svislá část stěny v místě budoucího pilíře, pak bude postaven nový pilíř. Po získání dostatečné pevnosti zdiva bude provedeno osazení nových průvlaků za dodržení technologických postupů pro budování dodatečně zřizovaných průvlaků a následně bude vybourána zbývající část zdiva.

Podlaha byla zvednuta v 1. etapě na úroveň +0,100. Výškové kóty jsou vztaženy k původní podlaze +0,000 !

				geprostav projekce s.r.o. Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Kreslil	Ing. F.Koliba				
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Obec. úřad	Doni Bojanovice	Datum	6 / 2016
Investor	Obec Dolní Bojanovice,Hlavní 383,696 17 Dolní Bojanovice			Dokumentace	DPS
Akce	Stavební úpravy zdravotního střediska - 7 BJ, pečovatelské byty Dolní Bojanovice			Formát	8 x A4
	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení			Měřítko	1/50
Obsah	Půdorys 2.NP - demolice				Číslo výkresu 2
