


Komunitní kompostárna - Svitavy

příloha č.1


přehled víceprací a neprovedených prací změnových listů č. 1 - 6

	vícepráce		neprovedené práce		rozdíl	
	základ	s DPH	základ	s DPH	základ	s DPH
ZL 1 Odstranění větví a pařezů	124 920	151 154	0	0	124 920	151 154
ZL 2 Úprava váhy	116 554	141 031	33 390	40 402	83 164	100 629
ZL 3 Přemístění výkopků - vyšší výměra	45 218	54 714	0	0	45 218	54 714
ZL 4 Změna vedení trasy přípojky nízkého napětí, připojení	27 577	33 369	1 690	2 045	25 887	31 324
ZL 5 Změna umístění hydrantu užitkové vody	35 554	43 021	16 839	20 376	18 715	22 645
ZL 6 Úprava kanalizačních šachet dešťové a splaškové kanalizace	47 993	58 072	3 217	3 893	44 776	54 179
Celkem	397 816	481 361	55 136	66 716	342 680	414 645
Z toho způsobilé výdaje	200 101	242 124				

Centrum podpory projektů
města Svitavy
T. G. Masaryka 40/25
568 02 Svitavy



Pavel Čížek
místostarosta města Svitavy





S V I T A V Y

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 ✓

Název akce : Komunitní kompostárna - Svitavy

Akceptační číslo projektu : 11086084

Zkotevovitel stavby : Ivan Úlehla, Kpt. Jaroše 560/99, Svitavy, (IČ 86677209)

Zpracovatel změnového listu : Ing. Dalibor Dvořáček. Ing. Jiří Škrabal.

Výchozí právní vztah : Smlouva o dílo č. 330/2013 ze dne 3.7.2013

Část popisná -----

Předmět změny : Odstranění pařezů a větví z plochy staveniště před zahájením stavby.

Soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný dodavatelem obsahoval položky pro odstranění pařezů. Při realizaci se však ukázalo, že jejich počet byl proti výkazu výměr vyšší.

Stanovisko projektanta : Do soupisu prací nebyly zahrnuty všechny dřeviny, které bylo nutné před zahájením stavby odstranit z plochy staveniště.
Zhotovitel stavby nemohl při oceňování soupisu prací tuto skutečnost předpokládat.

Dokumentace změny : Viz. přiložené položkové rozpočty.

Stanovisko TDI : Veškeré dodatečné práce splňují podmínky smlouvy o dílo a jsou provedeny ve stejné kvalitě a vysoutěžených položkových cenách.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

část finanční -----

	základ	DPH	cena celkem
Cena víceprací	124 920.- Kč	26 234.- Kč	151 154.- Kč
Cena neprovedených prací	0.- Kč	0.- Kč	0.- Kč
Souhrn	124 920.- Kč	26 234.- Kč	151 154.- Kč

Přílohy : Položkový rozpočet víceprací, položkový rozpočet méněprací

datum, podpisy -----

Datum zpracování : 11.4.2014

Zhotovitel :

ZEMNÍ PRÁCE
ULEHLA IVAN

Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy
IČO: 866 77 209, DIČ: CZ 780329348
Tel.: 776 334 460


BETA - PROJEKT spol. s r. o.
Pavlovova 43 605 02 SVITAVY
DIČ: CZ64257614 + IČO: 64257614
- 3 -

Technický dozor investora :

 **SPORDES**
Svitavy s.r.o.
Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
IČ: 62062620, DIČ: CZ-62062620
č. 07

Statutární zástupce investora :

Pavel Čížek
MÍSTOSTAROSTA



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Odstranění pařezů	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO99	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014/002	Komunitní kompostárna Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	99 009	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	99 009	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	99 009	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	99 009	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		99 009 Kč
DPH		21,0 %		20 792 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				119 801 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet : 1
Objekt :	SO99 Změnové listy	Odstranění pařezů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	99 009	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	99 009	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	99 009	0
Oborová přírážka	0	0,0	99 009	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	99 009	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	99 009	0
Zařízení staveniště	0	0,0	99 009	0
Provoz investora	0	0,0	99 009	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	99 009	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	99 009	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet: 1
Objekt :	SO99 Změnové listy	Odstranění pařezů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm navýšení výměry (PD 250ks skutečnost 300ks)	kus	50,00	501,40	25 070,00
2	112201103RT1	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm změna průměru (PD 10-30 skutečnost 50-70) 40%	kus	70,00	410,70	28 749,00
3	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	50,00	483,60	24 180,00
4	162301913R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm	kus	50,00	169,40	8 470,00
5	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	50,00	225,80	11 290,00
6	979	Poplatek za uložení pařezů na skládce	ks	50,00	10,00	500,00
7	Naložení	Naložení pařezů na dopravní prostředek pr.do 70cm	ks	50,00	15,00	750,00
	Celkem za	1 Zemní práce				99 009,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Přesun klesť	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO99	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014/002	Komunitní kompostárna Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	25 911	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	25 911	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	25 911	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	25 911	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		25 911 Kč
DPH		21,0 %		5 441 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				31 353 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet : 2
Objekt :	SO99 Změnové listy	Přesun kleslí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 911	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	25 911	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	25 911	0
Oborová přírážka	0	0,0	25 911	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	25 911	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	25 911	0
Zařízení staveniště	0	0,0	25 911	0
Provoz investora	0	0,0	25 911	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	25 911	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	25 911	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet: 2
Objekt :	SO99 Změnové listy	Přesun klestí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111101102R00	Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha (75% plochy 2486m2) ----- 1864,5000/10000	har	0,19 0,19	12 161,00	2 268,03
2	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m (50% výměry pařezů)	kus	90,00	17,30	1 557,00
3	162201403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70 cm do 1000 m (50% výměry pařezů)	kus	60,00	345,60	20 736,00
4	Naložení	Naložení větví na dopravní prostředek pr.do 70cm	kus	60,00	15,00	900,00
5	Naložení	Naložení větví na dopravní prostředek pr.do 30cm	kus	90,00	5,00	450,00
	Celkem za	1 Zemní práce				25 911,03



S V I T A V Y

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Název akce : Komunitní kompostárna - Svitavy

Akceptační číslo projektu : 11086084

Zhotovitel stavby : Ivan Úlehla, Kpt. Jaroše 560/99, Svitavy, (IČ 86677209)

Zpracovatel změnového listu : Ing. Dalibor Dvořáček. Ing. Jiří Škrabal.

Výchozí právní vztah : Smlouva o dílo č. 330/2013 ze dne 3.7.2013

část popisná -----

Předmět změny : Úprava uložení silniční mostní váhy.

Změnou typu silniční mostní váhy dochází ke změnám v základových stavebních konstrukcích a nájezdech na váhu.

Stanovisko projektanta : V době zpracování projektové dokumentace komunitní kompostárny byla jímka pro váhu, a s ní související pomocné konstrukce navrhovány podle sériově vyráběného typu, jehož použití pro potřeby kompostárny bylo konzultováno s možnými budoucími dodavateli. Podle této dokumentace zhotovitel stavebních prací základové konstrukce ocenil. V průběhu realizace se však typ váhy, pro níž bylo uložení určeno, přestal vyrábět. Bylo nutné vybrat jiný vhodný dodávaný typ, který však vyžadoval stavební úpravu základů a okolí. Základové konstrukce a nájezdy tak musely být přeprojektovány. Zhotoviteli stavebních prací změnou vznikly vícepráce, které nemohl při oceňování soupisu prací předpokládat.

Dokumentace změny : Výkres nového uložení silniční váhy.

Stanovisko TDI : Veškeré dodatečné práce splňují podmínky smlouvy o dílo a jsou provedeny ve stejné kvalitě a vysoutěžených položkových cenách.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

	základ	DPH	cena celkem
Cena víceprací	116 554.- Kč	24 476.- Kč	141 031.- Kč
Cena neprovedených prací	33 390.- Kč	7 012.- Kč	40 402.- Kč
Souhrn	83 164.- Kč	17 464.- Kč	100 629.- Kč

Přílohy : Projektová dokumentace nového uložení váhy, položkový rozpočet víceprací, položkový rozpočet méněprací.

datum, podpisy

Datum zpracování : 21.6.2014

Zhotovitel :

ZEMNÍ PRÁCE

ULEHLA IVAN

Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy

IČO: 866 771 09, DIČ: CZ 780329348

Telex: 076 334 460

BETA - PROJEKT spol. s r. o.

Pavlovova 43 + 568 02 SVITAVY

DIČ: CZ64257614 * IČO: 64257614

- 3 -


Technický dozor investora :

SPORTES
Svitavy s.r.o.

Ringrova 2089/5, 568 02 Svitavy
IČ: 62062620, DIČ: CZ: 62062620
č. 07

Statutární zástupce investora :

Pavel Čížek
MÍSTOSTAROSTA



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

ČEŠKA

projektování, inženýrské investorské služby

Stavba

SILNIČNÍ MOSTNÍ VÁHA

místo stavby

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY

charakter stavby

nová stavba

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY


podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění (62/2013)

investor

Město Svitavy

T. G. Masaryka 5/35, 56802 Svitavy

Zakázkové číslo	: 13962
Datum	: 21.1.2014
Vypracoval	: Ing. František Češka
Adresa	: Jugoslávská 1810/3, 56802 Svitavy
Telefon	: 774487632
E-mail	: frantisek.ceska@svi.cz



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje

Investor	: Město Svitavy, Městský úřad Svitavy
Adresa	: T. G. Masaryka 5/35, 56802 Svitavy
Stavba	: MOSTNÍ VÁHA PB2TR
Charakter stavby	: Novostavba
Místo stavby	: Svitavy, komunitní kompostárna
Stavební úřad	: Městský úřad Svitavy
Speciální stavební úřad	: -
Termíny výstavby - zahájení	: neurčeno
- dokončení	: neurčeno
Projektant	: >ČEŠKA<, projektování, inženýring
Adresa	: 568 02 Svitavy, Jugoslávská 1810/3
Telefon	: 774487632
E-mail	: frantisek.ceska@svi.cz

2. Základní údaje o stavbě a budoucím provozu

Silniční mostní váha PB2TR je projektována jako nová stavba na zpevněné ploše provozního areálu komunitní kompostárny ve Svitavách. Váha o délce 7,0 m je určena ke zjišťování a registraci hmotnosti silničních motorových a přípojných vozidel.

3. Technické údaje

Váživost max.	:		30 t
Délka mostu	:		7 m
Šířka mostu	:		3 m

4. Přehled výchozích podkladů

- [1] Objednávka investora ze dne 21.1.2014 a její technická specifikace
- [2] Situační podklad
- [3] Část B. Inženýrské objekty IO 02 - Plocha pro kompostování projektu „Komunitní kompostárna Svitavy“ zak.č. 34/2012 DPS říjen 2012, Beta projekt s.r.o. Svitavy
- [4] Technická a výrobní dokumentace váhy PB2TR

5. Seznam pozemků dotčených výstavbou

Pozemky dotčené výstavbou

k.ú. p.č.	výměra (m2)	kultura	vlastník	č.LV

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Situace

Mostní váha v areálu komunitní kompostárny ve Svitavách je projektována jako novostavba na plánované zpevněné ploše provozního areálu. Pozemek v místě stavby je mírně svažité a je na něm plánováno zřízení zpevněné plochy s živičným povrchem. Pod povrchem terénu v okolí navrhované stavby mostní váhy se dle dostupných podkladů nenacházejí podzemní vedení a zařízení.

Polohové vytýčení stavby je vztaženo k projektovanému objektu „Sociální zázemí“ v areálu. Vytyčovací příčka je určena jako rovnoběžka s vnějším severozápadním lícem tohoto objektu, vedená ve vzdálenosti 2,70 m od této plochy a tvoří zároveň podélnou osu navrhované váhy. Podélné situování váhy je vztaženo k severnímu rohu sociálního zázemí. Mostní váha PB2TR je nájezdová. Výšková poloha váhy je určena ve výškovém systému Bpv tak, že výška $\pm 0,000$, která představuje horní pojezdnou plochu vážního mostu, je v úrovni 462,375 Bpv.

Před zahájením zemních prací je nutno ověřit eventuální doposud nezjištěnou existenci podzemních vedení a zařízení, nebo jiných podzemních objektů a zařízení a zajistit jejich identifikaci, vytýčení a ochranu před poškozením.

2. Technický popis objektu a jeho provedení

Mostní váha je určena ke zjišťování hmotnosti silničních vozidel na panelovém železobetonovém mostovém modulu, uloženém na tenzometrických snímačích s výstupem měřených hodnot na digitální indikátor. Vodiče pro přenos dat ze snímačů do indikátoru jsou uloženy do ochranných trubek připevněných na konstrukci váhy a uložených do chráničky do výkopu mezi mostní váhou a vážní místností v objektu „sociální zázemí“. Digitální indikátor, instalovaný ve vážní místnosti, bude mít výstup na PC, tiskárnu, případně na lokální datovou síť.

Mostní váhu tvoří:

- železobetonová panelová mostovka
- uložení snímačů
- horizontální dorazy v kapsách betonových nájezdů
- snímače, datové vedení a periferní výstupní zařízení
- betonové základy váhy
- vyrovnávací nájezdy

Základy váhy slouží k přenesení sil od váženého vozidla a od váhy samé do horninového prostředí v podloží. Základová spára je navržena ve svrchní vrstvě pláň, která bude předem mechanicky zpevněna hutněním.

Most a nájezdové hrany váhy jsou šikmými betonovými nájezdy napojeny na projektovanou zpevněnou plochu tak, aby podélný sklon v nájezdu nepřekročil 10 % a vozidla nebo vozidlové soupravy vjížděly na váhu a vyjížděly z ní vždy v přímce. Betonové nájezdy a navazující dopojení na zpevněnou plochu jsou přizpůsobeny projektované výškové konfiguraci terénu v místě stavby váhy. Zpevněná plocha v okolí váhy bude povrchově odvodněna tak, aby se pod váhu nemohla zdržovat povrchová srážková voda.

Provozní podmínky na váze budou vymezeny vodorovným dopravním značením jízdních pruhů a svislými dopravními značkami, omezujícími rychlost vozidel před váhou a na váze na max. 5 km/hod., zákazem vystupování řidiče váženého vozidla z kabiny, pokud bude vozidlo na váze, omezením celkové hmotnosti váženého vozidla a provozním řádem váhy, který bude viditelně umístěn ve vážní místnosti. Provoz na váze bude řízen obsluhou, přítomnou ve vážní místnosti. K řízení provozu může sloužit další vizuální signalizace (patníky, výstražné osvětlení, případně semafor).

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRONICKÝCH MOSTNÍCH VAH PB2TR

1. Mostní váha je vážicím přístrojem stabilního provedení.
2. Váha je určena pro použití v průmyslu, zemědělství a dopravě ke zjišťování hmotnosti vozidel. Přesnost výsledků vážení odpovídá III. třídě přesnosti podle ČSN EN 45501AC.
3. Celková hmotnost váženého vozidla nesmí přesahovat hranici váživosti váhy.
4. Vnější obvod stop kol váženého vozidla nesmí přesahovat rozměr mostu.
5. Váha PB2TR je nájezdového provedení. Sklon nájezdů odpovídá poměru $L/H = 40$, kde L je největší rozvor vozidla a H je světlost podvozku v největším rozvoru.
4. Železobetonový most váhy je uložen na čtyřech tenzometrických snímačích, kterými se svislé síly od hmotnosti váženého vozidla a mostu přenášejí do základů váhy.
5. Podélné a příčné provozní pohyby mostu jsou vymezeny horizontálními dorazy s nastavitelnými odstupy.
6. Na váze PB2TR jsou použity snímače typu PRECIA MOLEN SCL nebo ASL, nebo ZEMIC HM9B. Napájecí napětí tenzometrů 5 - 20 V DC/AC. Snímače jsou schváleny pro úřední ověřování v Evropě.
7. Hmotnostní veličiny naměřené snímači jsou svedeny na svorkovnici ve sdružovací krabici, instalované po straně mostu směrem k vážní místnosti, přibližně uprostřed délky mostu.
8. Svorkovnice je kabelem propojena s digitálním nebo analogovým indikátorem, umístěným na pracovním stole ve vážní místnosti.
9. Digitální nebo analogový indikátor je napájen z vestavěného síťového adaptéru, zpracovává výstupní digitální nebo analogový signál a umožňuje odečítat hmotnost vážených vozidel. Hodnota ověřovacího dílku indikátoru $e = 10 \text{ kg}$ u vah do 30 000 kg. Indikátor je standardně vybaven sériovým rozhraním RS 232. Jednotka komunikuje s PC. Provozní teplotní rozsah je $[-20^{\circ}\text{C}, +40^{\circ}\text{C}]$.
10. Výrobní štítek s údaji o vážicím přístroji je umístěn v blízkosti indikace, tj. displeje váhy.

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ČÁST ELEKTRONICKÝCH MOSTNÍCH VÁH PB2TR

1. Zemní práce

V místě stavby váhy budou identifikována a vytyčena veškerá podzemní vedení a zařízení a bude jim zajištěna náležitá ochrana. Plocha, určená ke stavbě váhy bude předem upravena jako pláň budoucí zpevněné plochy podle projektu [3].

2. Základy váhy

Základová spára je situována do svrchní vrstvy připravené pláne pod podkladní vrstvu zpevněné plochy a v relativním výškovém systému stavby váhy má kótu - 1.090, tj. 461,285 Bpv a je tedy přibližně 0.5 m pod průměrnou úrovní povrchu rovinné zpevněné plochy resp. okolního terénu. Pokud by v průběhu zřizování pláne byla v místě stavby váhy zastižena zemina nebezpečně namrzavá, bude nutno hloubku založení upravit přiměřeně zjištěným okolnostem.

Na urovnanou základovou spáru se provede podsyp z drčeného kameniva a podkladní beton patek z betonové směsi C 8/10. Spodní část základových patek, betonovaná do snímatelného bednění, se provede z betonu štěrkopískového C 20/25 a vyztuží se při spodním i horním líci svařovanou sítí. Do spodní části patek ze založí armovací koše. Horní část patek se provede do snímatelného bednění z betonu štěrkopískového C 30/37 XC4, XD3, XF4. Vrch základových patek je v úrovni -0.540.

Rozměrové tolerance základových patek jsou: Poloha patek ± 20 mm, velikost patek $+20 -0$ mm, niveleta vrchu patek ± 3 mm, rovinnost vrchu patek ± 2 mm. Poloha patek se kontroluje podle výkresu Základy.

Na vyzrálé patky se osadí úložné desky snímačů (pol. 0311). Desky se na patky osadí podle výkresu 7301 - Montáž úložných desek. Desky se uloží do vyrovnávacího maltového lože a připevní závitovými tyčemi osazenými do vývrtů v patkách na chemické kotvy. Rozměrové tolerance úložných desek jsou: poloha desek ± 5 mm, niveleta $\pm 0,5$ mm, rovinnost desek ± 0 mm.

3. Montáž váhy

Stavební připravenost pro montáž váhy tvoří:

- dokončené a vyzrálé úložné patky provedené v předepsaných tolerancích,
- úložné desky osazené na patky základových pásů v předepsaných tolerancích,
- chránička datového kabelu, uložená do mělkého výkopu mezi váhou a vážním domkem a vyvedená podlahou do vážní místnosti,
- provedené uzemnění s vývody uzemňovacích vodičů u každé patky včetně připojení úložných desek, s vývody pro připojení kovových součástí nájezdů a s připojením na uzemňovací soustavu objektu, ve kterém bude vážní místnost,
- dokončená vyspádovaná a povrchově odvodněná zpevněná plocha pod váhou.

Po převzetí základů váhy provede dodavatel váhy montáž váhy na patky.

4. Nájezdy, komunikace

Nájezdy jsou založeny na podkladních vrstvách zpevněné plochy.

Na urovnanou základovou spáru se provede vrstva podkladního betonu C 8/10 v tl. min. 5 cm. Nájezdy se vybetonují do bednění betonem C 20/25 pro prostředí XC4, XF1 a nahoře betonem C30/37 pro prostředí XC4, XD3, XF4. Spodní základová plocha i horní pojížděný líc nájezdů jsou vyztuženy svařovanou sítí s krytím 5 cm. Vrch nájezdu je rovná plocha, zakončená na straně k mostu váhy nájezdovou hranou. Nájezdové hrany jsou svařence, které se osadí do bednění nájezdu vrchní plochou v úrovni ± 0.000 .

Mezera mezi hranou nájezdu a hranou panelového mostu váhy bude 20 mm.

5. Odvodnění

Plocha pod mostem váhy bude v okolí patek upravena do úrovně okolní zpevněné plochy asfaltobetonem. Terén v bezprostředním okolí váhy musí být upraven tak, aby srážková voda byla povrchově odvedena mimo váhu a nemohla se pod váhou zdržovat.

6. Kabelové vedení a uzemnění

Na propojení sběrné svorkovnice váhy a svorkovnice vyhodnocovací jednotky bude instalován stíněný datový kabel 6x0,5 mm² uložený v zemi v kabelové chráničce KSX-PE 32x3. Kabelová chránička bude uložena do výkopu a vyvedena pod základem vážního domku a jeho podlahou do vážní místnosti. Konstrukce váhy musí být uzemněna. Uzemňovací soustavu váhy tvoří uzemňovací tyče zarážené do země v prostoru základových patek, dále okružní uzemňovací vedení, spojovací svorky, zkušební svorky a ploché propojovací kabely u snímačů. Na uzemnění bude připojena i svařovaná konstrukce nájezdů. Uzemňovací soustava váhy bude vodivě spojena s uzemňovací soustavou budovy, ve které je vážní místnost. Propojovací zemnicí vodič bude uložen v souběhu s chráničkou datového kabelu. Zemní přechodový odpor může být nejvýše 5 Ω .

7. Ochranné nátěry

Horní plocha klínových nájezdů se může v pojížděné stopě opatřit protiobrusným a ochranným nátěrem: Na vyzrálý beton se provede kotvicí nátěr PCI CONIPOX 77 Z, který se ihned zasype křemenným pískem. Po vytvrzení a okartáčování přebytečného písku se provede dvojnásobný nátěr PCI CONIPUR 258.

Ocelové doplňky základových konstrukcí jsou opatřeny základním antikorozním nátěrem syntetickým, 2x podkladovou barvou syntetickou a 2x vrchním nátěrem syntetickým emailem.


Díly váhy, panely mostovky, mostnice a ostatní komponenty jsou opatřeny konečným ochranným nátěrem již ve výrobě, před ukončením montáže budou případná drobná oděrky a poškození nátěrů opraveny.

8. Uvedení do provozu

Po dokončení nájezdů dodavatel montáže zkompletuje a seřídí horizontální dorazy, provede provozní vyzkoušení váhy a zajistí její ocejchování.

E. VÝKRESOVÁ ČÁST

Číslo výkresu	Obsah výkresu	Měřítko
PB2TR-7001	Situace	1:200
PB2TR-7002	Dispozice	1:50
PB2TR-7301	Montáž úložných desek	1:50
PB2TR-0311	Úložná deska snímače	1:4
PB2TR-7601	Základy	1:50
PB2TR-7602	Základová patka	1:25
PB2TR-0801	Nájezd	1:50
PB2TR-0820	Hrany nájezdů	
PB2TR-0825	Kapsa dorazu	
PB2TR-0826	Kryt kapsy dorazu	

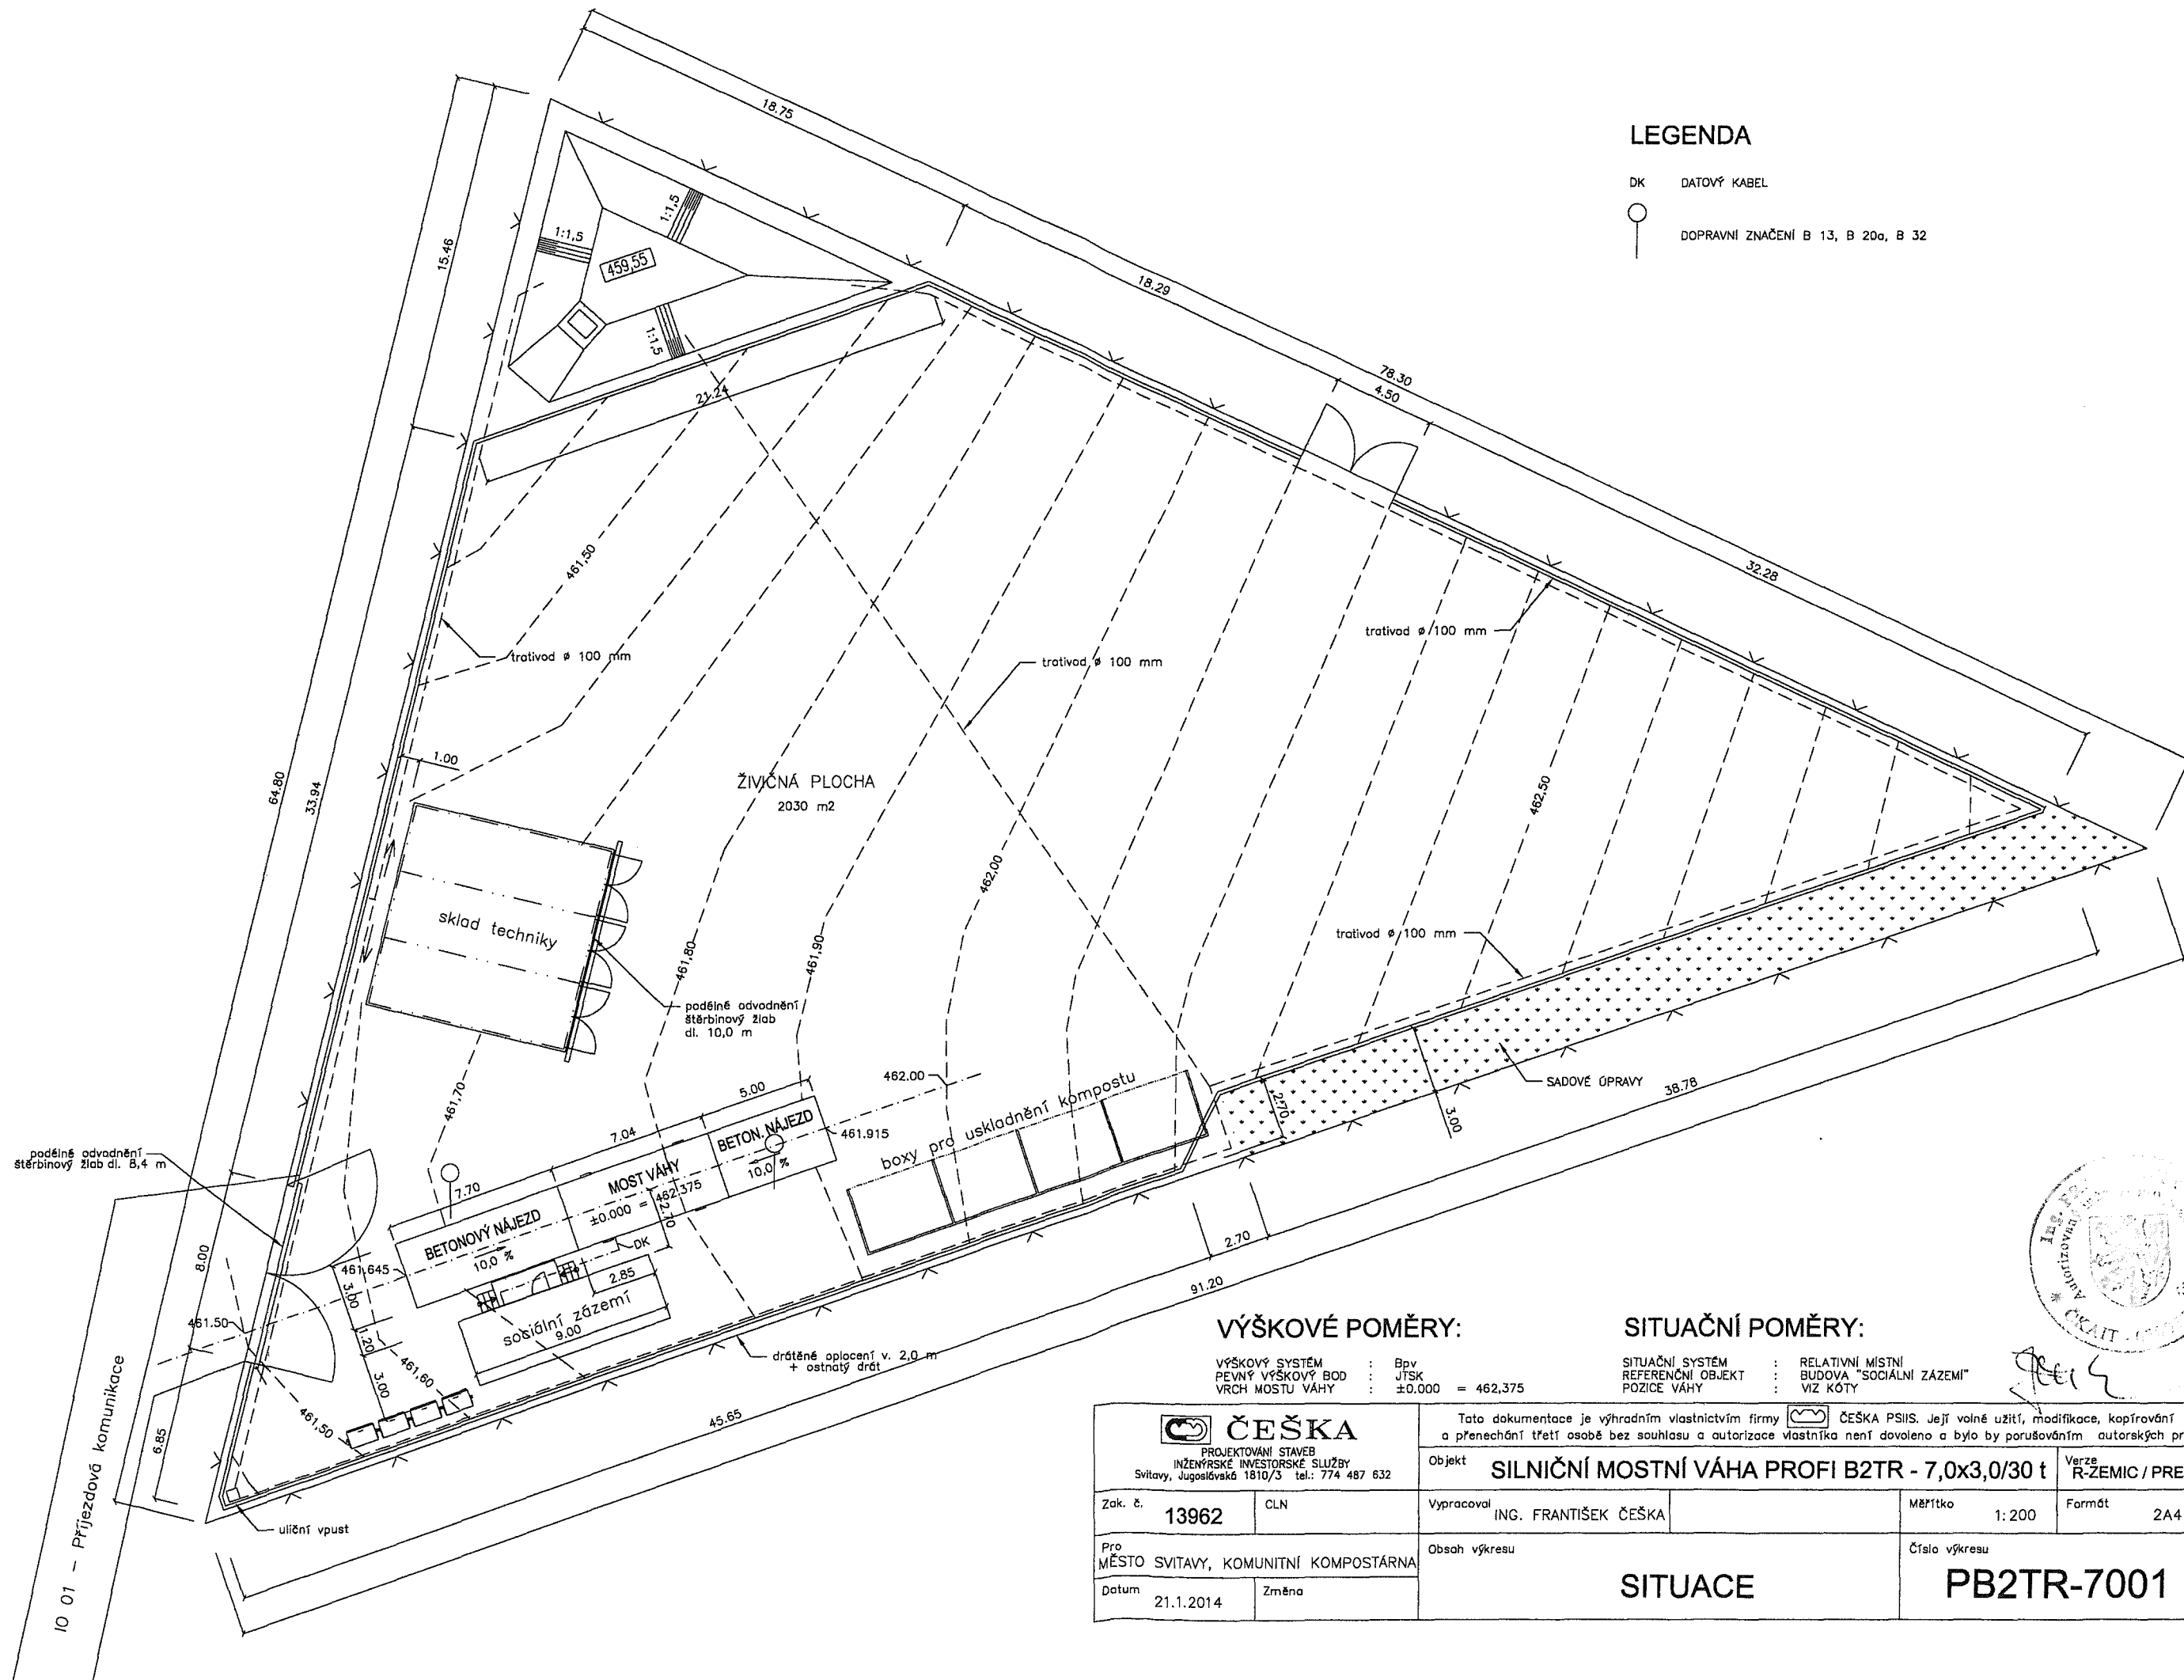

VÝŠKOVÉ POMĚRY:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv
PEVNÝ VÝŠKOVÝ BOD : JTSK
VRCH MOSTU VÁHY : ±0.000 = 462,375

SITUAČNÍ POMĚRY:

SITUAČNÍ SYSTÉM : RELATIVNÍ MÍSTNÍ
REFERENČNÍ OBJEKT : BUDOVA "SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ"
POZICE VÁHY : VIZ KÓTY

 ČEŠKA PROJEKTOVÁNÍ STAVEB INŽENÝRSKÉ INVESTORSKÉ SLUŽBY Svitavy, Jugoslávská 1810/3 tel.: 774 487 632		Tato dokumentace je výhradním vlastnictvím firmy  ČEŠKA PSIS. Její volné užití, modifikace, kopírování a přenechání třetí osobě bez souhlasu a autorizace vlastníka není dovoleno a bylo by porušováním autorských práv.		
Objekt		SILNIČNÍ MOSTNÍ VÁHA PROFÍ B2TR - 7,0x3,0/30 t		Verze R-ZEMIC / PRECI
Zak. č.	13962	CLN	Vypracoval ING. FRANTIŠEK ČEŠKA	Měřítko 1: 200
Pro	MĚSTO SVITAVY, KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA	Obsah výkresu	SITUACE	
Datum	21.1.2014	Změna	PB2TR-7001	

PŮDORYS

3000 NÁJEZD 10 % (8a)

7040 MEZI NÁJEZDOVÝMI HRANAMI
7000 MOST

3000 MOST

10 % (8b)

19740

7700 20 7000 20 5000

3 4 6 5

NÁJEZDOVÁ HRANA
SPÁDOVÝ KLIN

B-B

A-A

COM.1 COM.2

COM.1

ACO 11S
ACL 16+
MZK 32/63
ŠDB 0/125
PODLOŽÍ


COM.2

BETON C 30/37 XC4 XD3 XF4
BETON C 20/25 XC4 XF1
BETON C 8/10 X0
MZK 32/63
ŠDB 0/125
PODLOŽÍ


VÝŠKOVÝ SYSTÉM	:	Bpv
PEVNÝ VÝŠKOVÝ BOD	:	JTSK
VRCH MOSTU VÁHY	:	±0.000 = 462,375
ZÁKLADOVÁ SPÁRA	:	VIZ VÝKRES ZÁKLADŮ

 ČEŠKA PROJEKTOVÁNÍ STAVEB INŽENÝRSKÉ INVESTORSKÉ SLUŽBY Svítavy, Jugoslávská 1810/3 tel.: 774 487 832		Tato dokumentace je výhradním vlastnictvím firmy  ČEŠKA PSIIS. Její volné užití, modifikace, kopírování a přenechání třetí osobě bez souhlasu a autorizace vlastníka není dovoleno a bylo by porušováním autorských práv.			
Zak. č. 13962		CLN	Objekt SILNIČNÍ MOSTNÍ VÁHA PROFI B2TR - 7,0x3,0/30 t		Verze R-ZEMIC / PRECIA
Pro MĚSTO SVITAVY, KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA		Vypracoval ING. FRANTIŠEK ČEŠKA		Měřítko 1:50	Formát 2A4
Datum 21.1.2014		Obsah výkresu DISPOZICE		Číslo výkresu PB2TR-7002	
Změna					

8a,b 6 5 4 3 1	NÁJEZDY	VYZTUŽENÝ BETON	NÁJEZDOVÁ HRANA VAHY JAS	7801, 7810, 7820		1+1
	ZÁKLADOVÉ PATKY	VYZTUŽENÝ BETON	DLE DOKUMENTACE VÁHY JAS	7601, 7602		2
	SNÍMAČE A KABELÁŽ		CHRÁNIČKY STAVBA, KABELÁŽ VÁHY JAS	7501		SOUB.
	DORAZY	OCEL	VÁHY JAS	.		2
	ULOŽENÍ SNÍMAČŮ	OCEL	VÁHY JAS	ZEMIC / PRECIA		4
	MOSTOVKA	ŽELEZOBETON	VÁHY JAS	.		1
POLOŽKA	NÁZEV	MATERIÁL, ROZMĚR (mm)	POZNÁMKA	NORMA, ODKAZ	JAKOST	KUSŮ

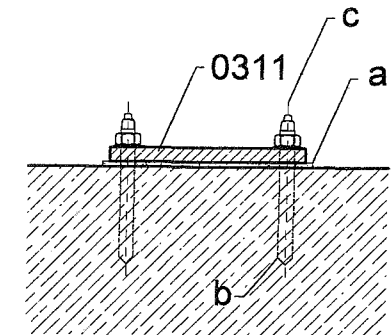

Architectural floor plan of a building entrance. The plan shows a central entrance area with two columns and a door. Dimensions are given in millimeters. The width of the entrance is 7040 mm, and the depth is 4020 mm. The plan includes a section line A-A. The entrance is labeled 'NÁJEZDOVÁ HRANA' (Entrance Edge) with a height of 0. The floor level is marked as ±0.000. The columns are marked with a height of -0.514. The door is marked with a height of 0810. The plan also shows a section line A-A.







1) JE MOŽNO POUŽÍT STEJNĚ OZNAČENÉ PRODUKTY Z KATALOGU FIRMY FISCHER

0810	HRANA NÁJEZDU	OCEL	VÁHY JAS	PB2TR-0810		2
0311	ÚLOŽNÁ DESKA SNÍMAČE	OCEL	VÁHY JAS	PB2TR-0311		4
POLOŽKA	NÁZEV	MATERIÁL, ROZMĚR (mm)	POZNÁMKA	NORMA, ODKAZ	JAKOST	KUSŮ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM	:	RELATIVNÍ MÍSTNÍ		
PEVNÝ VÝŠKOVÝ BOD	:	NÁJEZDOVÁ HRANA	±0.000	= 462.375 Bpv
VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ MOSTU	:	±0.000		= 462.375 Bpv
VRCH ÚLOŽNÝCH DESEK	:	-0.514		= 461.861 Bpv

OSAZENÍ KOTEVNÍCH TYČÍ SE PROVEDE PODLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE.
DOTAHOVACÍ MOMENT MATIC KOTEVNÍCH ŠROUBŮ PO ZATVRDNUTÍ LOŽE I CHEMICKÉ KOTVY JE 70 Nm.


 ČEŠKA PROJEKTOVÁNÍ STAVEB INŽENÝRSKÉ INVESTORSKÉ SLUŽBY Svitavy, Jugoslávské 1810/3 tel.: 774 487 632		Tato dokumentace je výhradním vlastnictvím firmy  ČEŠKA PSIS. Její volné užití, modifikace, kopírování a přenechání třetí osobě bez souhlasu a autorizace vlastníka není dovoleno a bylo by porušováním autorských práv.			
Zak. č. 13962		CLN	Objekt SILNIČNÍ MOSTNÍ VÁHA PROFI B2TR - 7,0x3,0/30 t		Verze R-ZEMIC / PRECI
Pro MĚSTO SVITAVY, KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA		Vypracoval ING. FRANTIŠEK ČEŠKA		Měřítko 1:50	Formát 2A4
Datum 21.1.2014		Obsah výkresu MONTÁŽ ÚLOŽNÝCH DESEK		Číslo výkresu PB2TR-7301	
Změna					

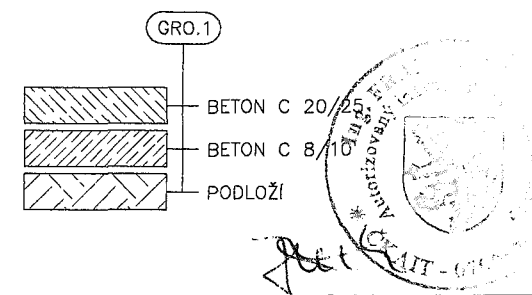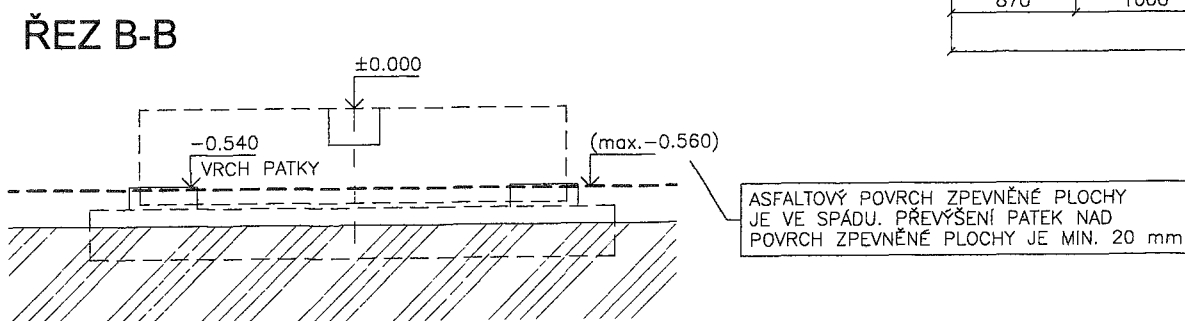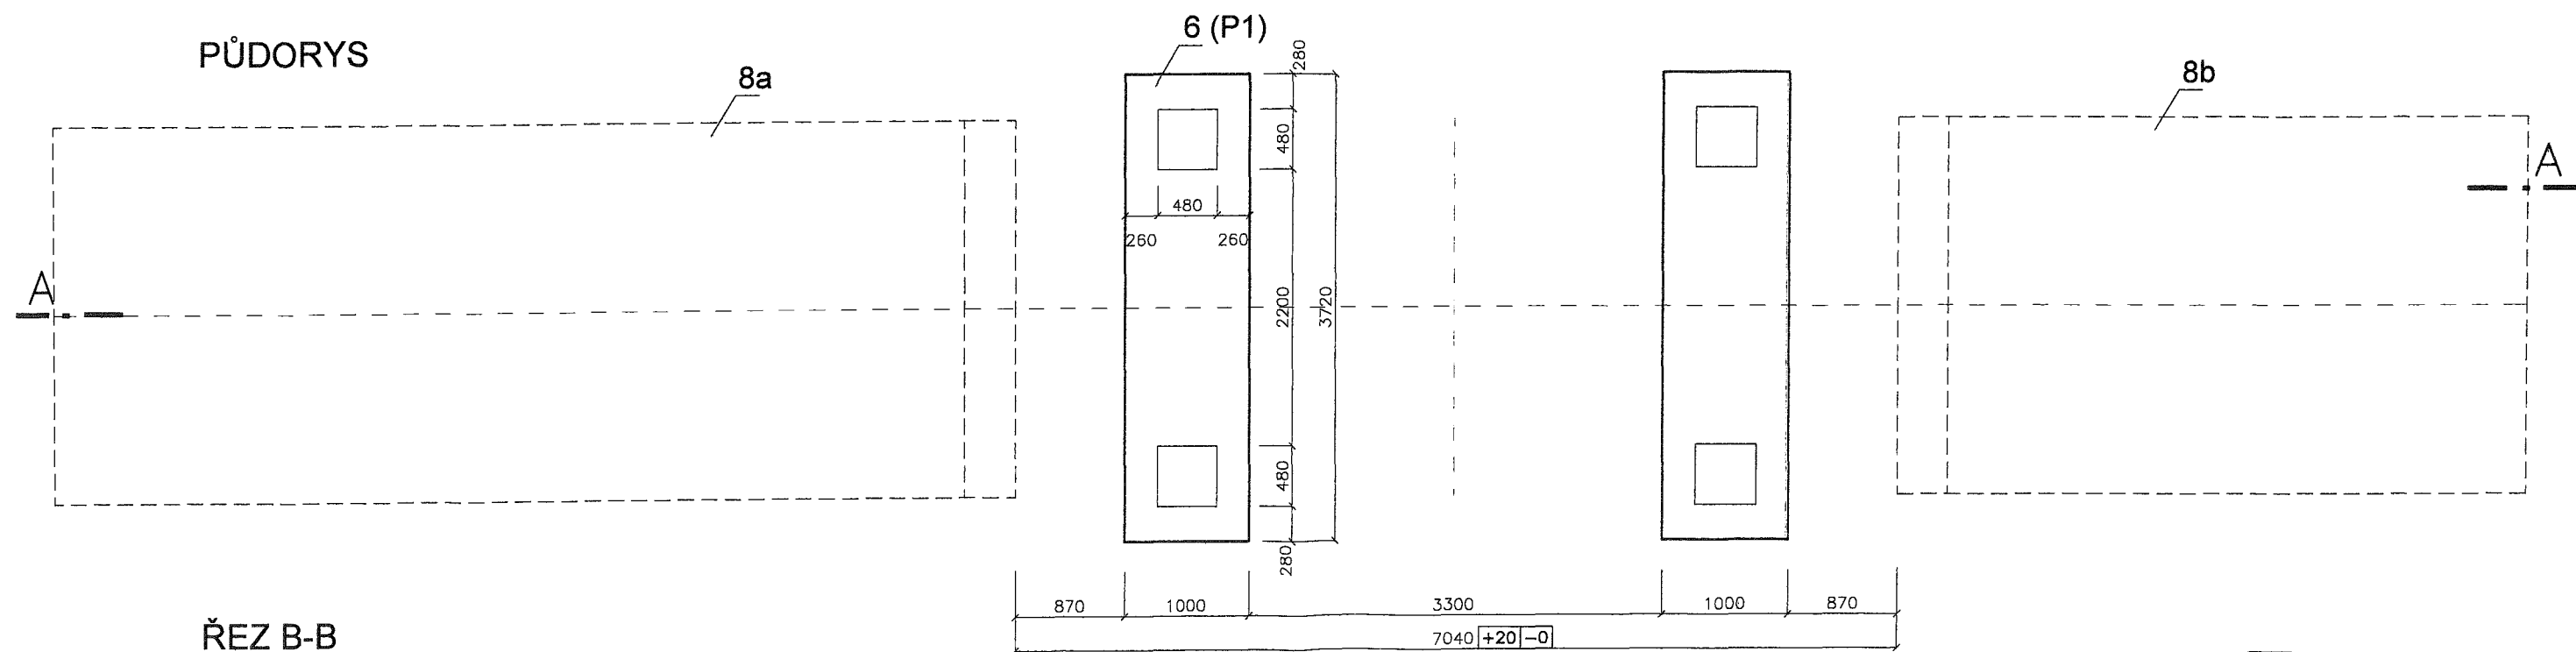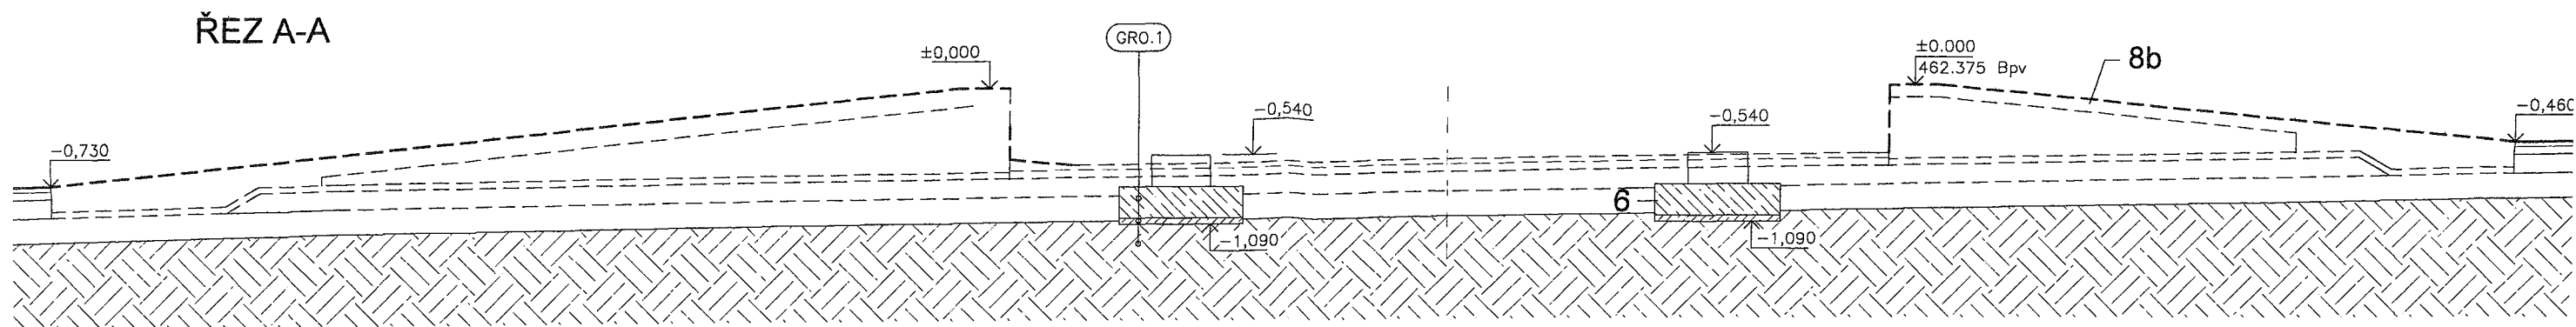


8a,b	NÁJEZDY	VYZTUŽENÝ BETON	NÁJEZDOVÁ HRANA VAHY JAS	0801		1+1
6	ZÁKLADOVÉ PATKY	VYZTUŽENÝ BETON P1	DLE DOKUMENTACE VÁHY JAS	7602		2
POLOŽKA	NÁZEV	MATERIÁL, ROZMĚR (mm)	POZNÁMKA	NORMA, ODKAZ	JAKOST	KUSŮ

ČESKA PROJEKTOVÁNÍ STAVEB INŽENÝRSKÉ INVESTORSKÉ SLUŽBY Svitavy, Jugoslávská 1810/3 tel.: 774 487 632		Tato dokumentace je výhradním vlastnictvím firmy ČESKA PSII.S. Její volné užití, modifikace, kopírování a přenechání třetí osobě bez souhlasu a autorizace vlastníka není dovoleno a bylo by porušením autorských práv.			
Objekt		SILNIČNÍ MOSTNÍ VÁHA PROFI B2TR - 7,0x3,0/30 t		Verze R-ZEMIC / PRECII/	
Zak. č.	13962	CLN	Vypracoval ING. FRANTIŠEK ČESKA	Měřítko	1:50
Pro	MĚSTO SVITAVY, KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA		Obsah výkresu		Číslo výkresu
Datum	21.1.2014	Změna	ZÁKLADY		PB2TR-7601


ZÁKLADOVÁ PATKA P1

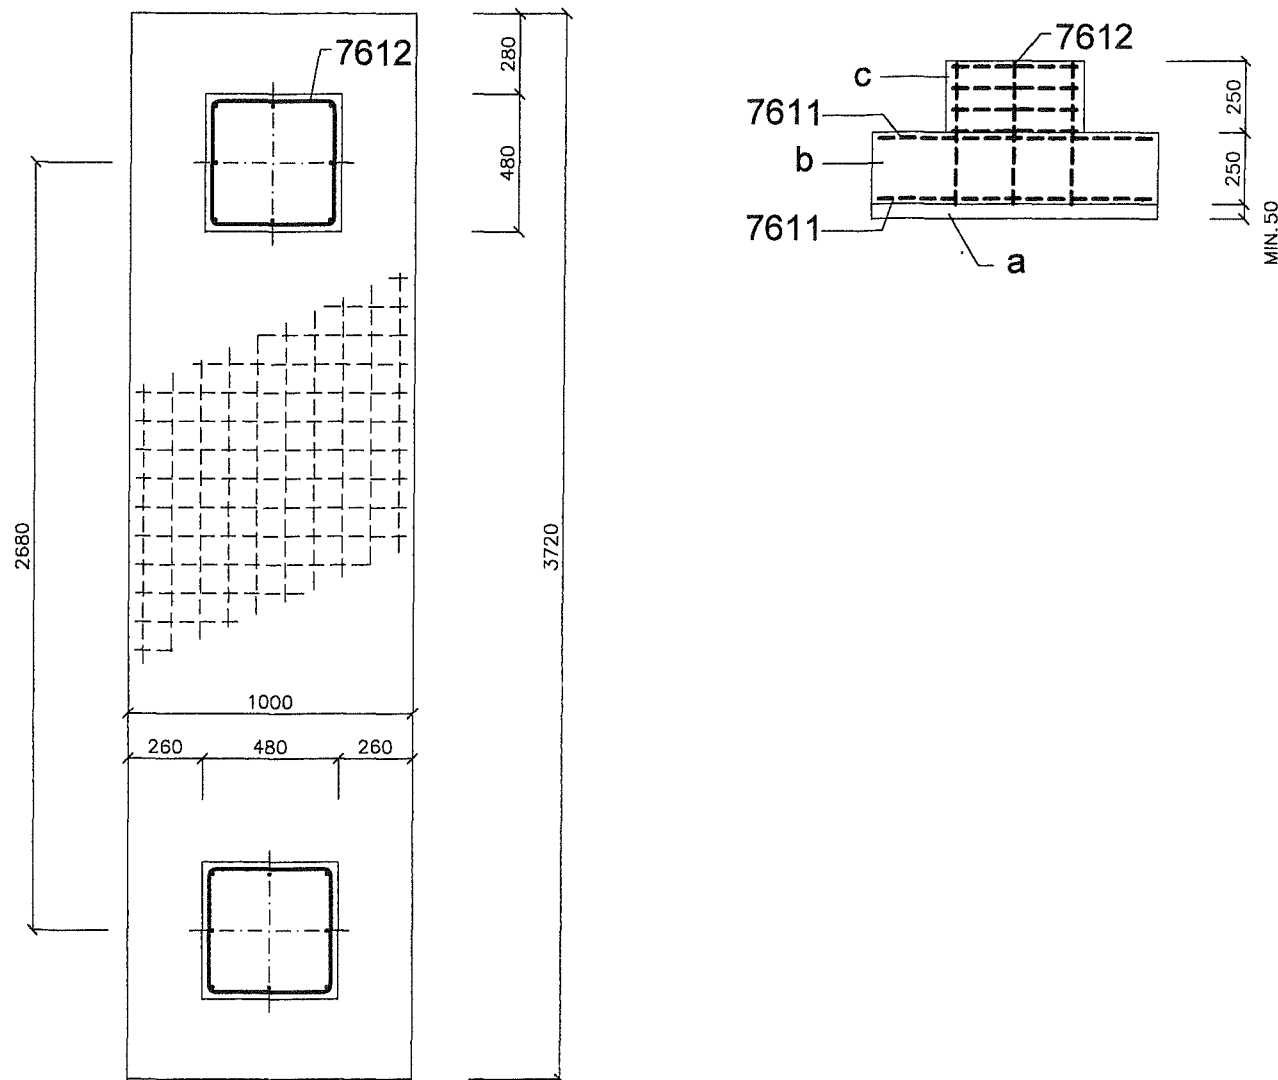

7611 SPODNÍ VÝZTUŽ PATKY
NASTAVIT KDEKOLIV PŘESAHEM 2 ŘAD OK
R01

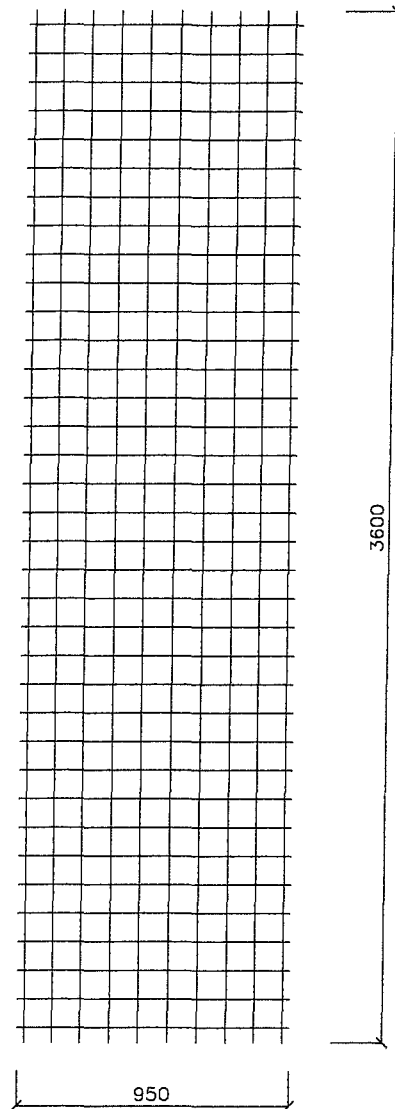

7612 HORNÍ VÝZTUŽ PATKY

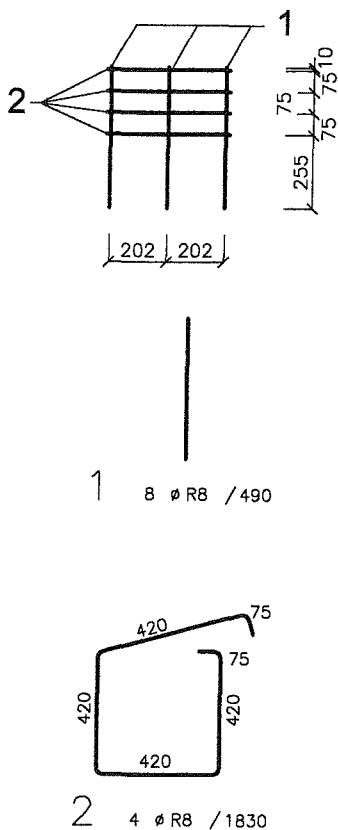

SPECIFIKACE VÝZTUŽE

PROSTŘIH A ZTRATNÉ JE ZAPOČTENO VE VÝŠI 10 %

DÍL	PRUT				DÉLKA CELKEM [m2]				OCEL – TYČE CELKEM [kg]	
	č.	ø [mm]	DL. [mm]	[ks]	10 505				10 505	10 216
					R8					
7612	1	R8	490	16	7,84					
	2	R8	1830	8	14,64					
				[m]	22,48					
				[kg/m]	0,395					
					[kg]	8,88			8,88	
CELKEM [kg]									9,77	

SPECIFIKACE SÍTÍ




PROSTŘIH, PŘEKLÁDÁNÍ A ZTRATNÉ JE ZAPOČTENO VE VÝŠI 15 %

DÍL	SÍŤ				PLOCHA CELKEM [m2]			OCEL – SÍŤ CELKEM [kg]	
	poz.	profil [mm] d ₁ /a ₁ – d ₂ /a ₂	rozměry [mm] délka/šířka	[ks]	BSt 500M (BSt 500KR)			BSt 500M	
					6,0/100–6,0/100 60 6024 G				
7611	R01	6,0/100–6,0/100	3600/950	2	6,84				
					[m2]	6,84			
					[kg/m2]	4,44			
					[kg]	30,37		30,37	
CELKEM [kg]								34,92	

c b a 7612 7611	HORNÍ ČÁST PATKY	VÝZTUŽENÝ BETON ŠTĚRKOPÍSKOVÝ			C 30/37	
	SPODNÍ ČÁST PATKY	VÝZTUŽENÝ BETON ŠTĚRKOPÍSKOVÝ			C 20/25	
	PODKLADNÍ BETON	BETON PROSTÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ			C 8/10	
	HORNÍ VÝZTUŽ PATKY	ŽEBÍRKOVÝ DRÁT BSt 500M (KARI)			BSt 500M	
	SPODNÍ VÝZTUŽ PATKY	SVAŘOVANÁ SÍŤ 6/6–100/100 (2x3 m)	KARI KH 30	60 6024 G	BSt 500M	2
POLOŽKA	NÁZEV	MATERIÁL, ROZMĚR (mm)	POZNÁMKA	NORMA, ODKAZ	JAKOST	KUSŮ


 ČEŠKA PROJEKTOVÁNÍ STAVEB INŽENÝRSKÉ INVESTORSKÉ SLUŽBY Svitavy, Jugoslávská 1810/3 tel.: 774 487 632		Tato dokumentace je výhradním vlastnictvím firmy  ČEŠKA PSIS. Její volné užití, modifikace, kopírování a přenechání třetí osobě bez souhlasu a autorizace vlastníka není dovoleno a bylo by porušováním autorských práv.			
Objekt		SILNIČNÍ MOSTNÍ VÁHA PROFI B2TR - 7,0x3,0/30 t		Verze ZEMIC / PRECIA	
Zak. č.	13958	CLN	Vypracoval ING. FRANTIŠEK ČEŠKA	Měřítko 1:25	Formát 2A4
Pro VÁHY-JAS, s.r.o. Svitavy		Obsah výkresu ZÁKLADOVÁ PATKA P1		Číslo výkresu PB2TR-7602	
Datum 10.11.2013	Změna				

2x

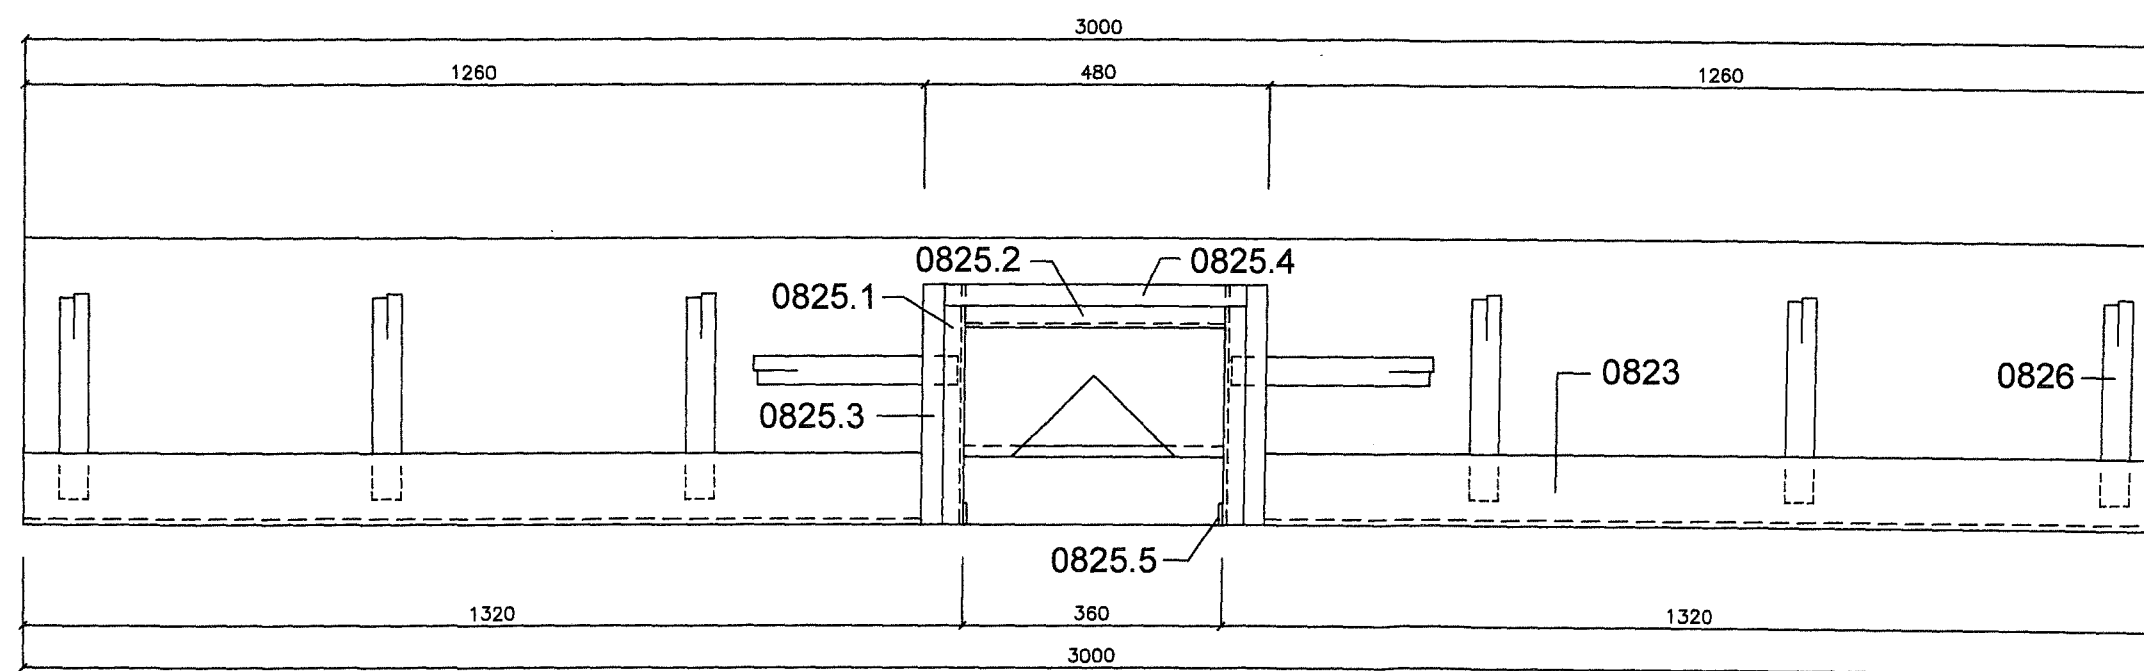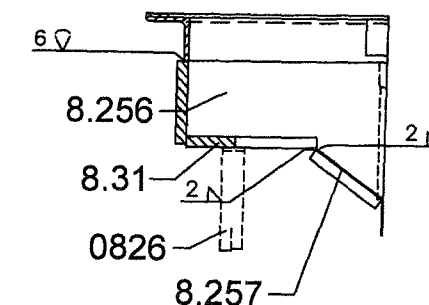



8.31	ÚLOŽNÁ DESKA DORAZU	SVAŘENEC		V.Č. 804	S235JRG2	1
8.26	KOTEVNÍ PRACNA	TYČ OCEL. PLOCHÁ 40x5 DL 290		DIN 1017	S235JRG2	8
0825.7	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ, DNO	PLECH OCEL. ČERNÝ		V.Č. 805		1
0825.6	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ, BOK	PLECH OCEL. ČERNÝ		V.Č. 805		2
0825.5	ZARÁŽKA	TYČ OCEL. PLOCHÁ 30x8 DL. 50		DIN 1017	S235JRG2	2
0825.4	LIŠTA RÁMEČKU	TYČ OCEL. PLOCHÁ 30x5 DL 420		DIN 1017	S235JRG2	1
0825.3	LIŠTA RÁMEČKU	TYČ OCEL. PLOCHÁ 30x5 DL 335		DIN 1017	S235JRG2	2
0825.2	RÁMEČEK POKLOPU	TYČ OCEL. L 60x6 DL. 360		DIN 1028	S235JRG2	1
0825.1	RÁMEČEK POKLOPU	TYČ OCEL. L 60x6 DL. 335		DIN 1028	S235JRG2	2
0823	LEMOVÁNÍ ČELA NÁJEZDU	TYČ OCELOVÁ L 100x100x8 DL 1314		V.Č. 803		2
POLOŽKA	NÁZEV	MATERIÁL, ROZMĚR (mm)	POZNÁMKA	NORMA, ODKAZ	JAKOST	MNOŽSTVÍ

 ČEŠKA PROJEKTOVÁNÍ STAVEB INŽENÝRSKÉ INVESTORSKÉ SLUŽBY Svitavy, Jugoslávská 1810/3 tel.: 774 487 632		Tato dokumentace je výhradním vlastnictvím firmy  ČEŠKA PSIS. Její volné užití, modifikace, kopírování a přenechání třetí osobě bez souhlasu a autorizace vlastníka není dovoleno a bylo by porušováním autorských práv.			
Zak. č. 13962		Objekt		Verze	
CLN		SILNIČNÍ MOSTNÍ VÁHA PROFI B2TR - 7,0x3,0/30 t		R-ZEMIC / PRECI	
Pro		MĚSTO SVITAVY, KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA		Měřítko	
Datum 21.1.2014		Obsah výkresu		Formát	
Změna		HRANA NÁJEZDU		1:10	
				Číslo výkresu	
				2A4	
				PB2TR-0820	



2x

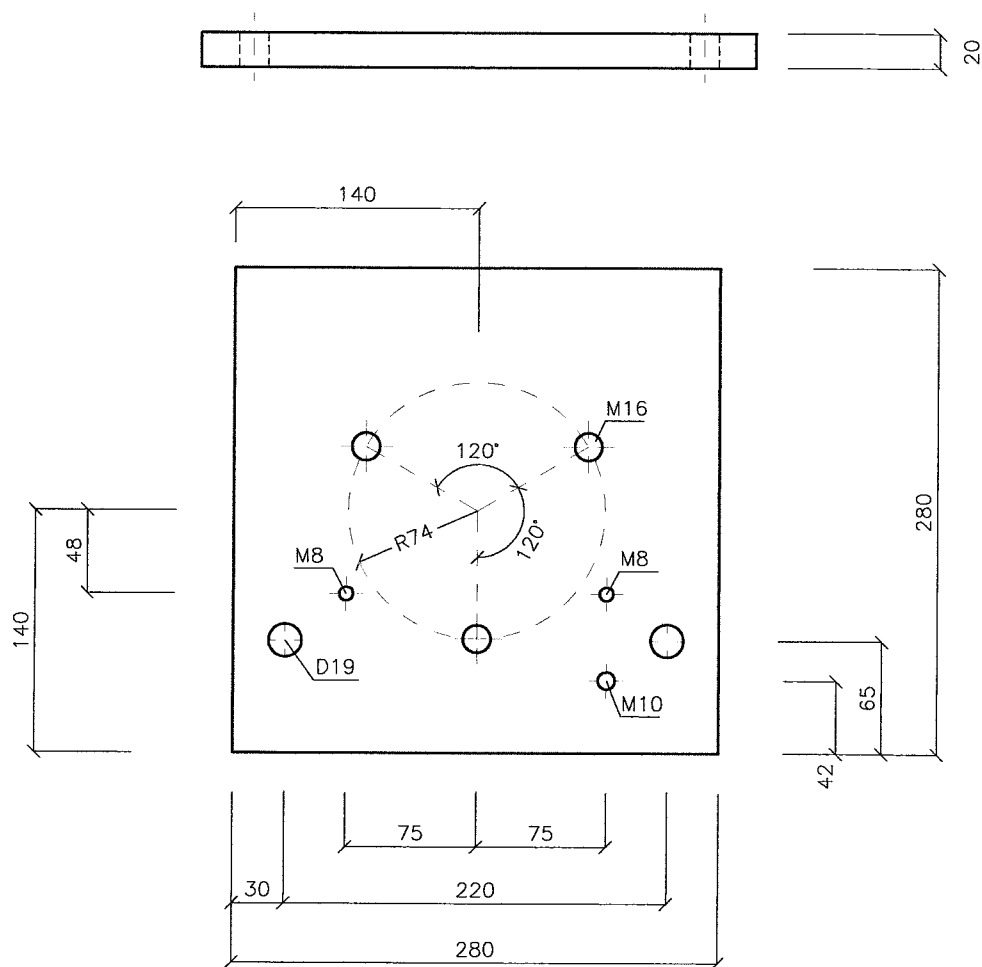


0311	ÚLOŽNÁ DESKA SNÍMAČE	ŠIROKÁ OCEL 280x20-280	DIN 59200	S235JRG2	1
POLOŽKA	NÁZEV	MATERIÁL, ROZMĚR (mm)	NORMA, ODKAZ	JAKOST	MNOŽSTVÍ


4 x

 ČEŠKA PROJEKTOVÁNÍ STAVEB INŽENÝRSKÉ INVESTORSKÉ SLUŽBY Svitavy, Jugoslávská 1810/3 tel.: 774 487 632		Tato dokumentace je výhradním vlastnictvím firmy  ČEŠKA PSIS. Její volné užití, modifikace, kopírování a přenechání třetí osobě bez souhlasu a autorizace vlastníka není dovoleno a bylo by porušováním autorských práv.			
Objekt SILNIČNÍ MOSTNÍ VÁHA PROFI B2TR - 7,0x3,0/30 t		Verze R-ŽEMIC / PRECIA			
Zak. č. 13962	CLN	Vypracoval ING. FRANTIŠEK ČEŠKA	Měřítko 1:4	Formát 1A4	
Pro MĚSTO SVITAVY, KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA		Obsah výkresu ÚLOŽNÁ DESKA SNÍMAČE		Číslo výkresu PB2TR-0311	
Datum 21.1.2014	Změna				


8.256 BOK

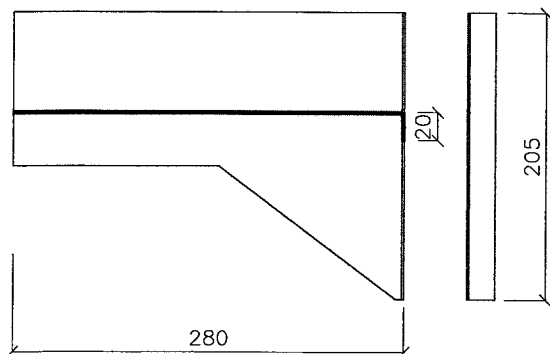



8.257 DNO

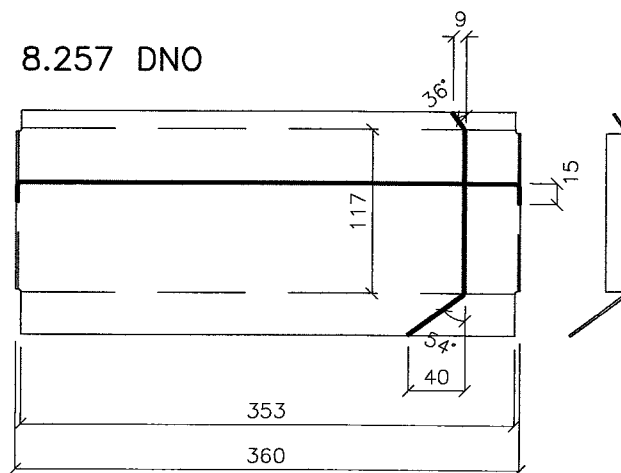

8.256 BOK – ROZVINUTÝ TVAR

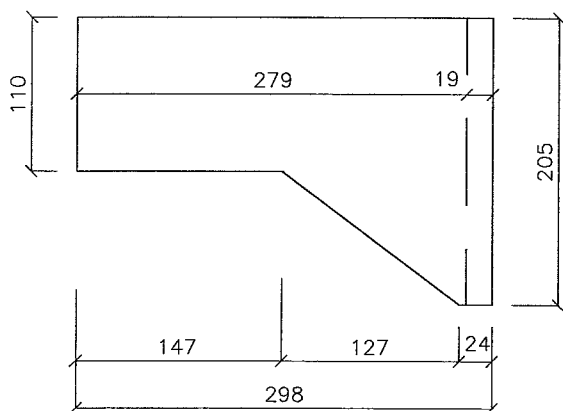




8.257 DNO – ROZVINUTÝ TVAR

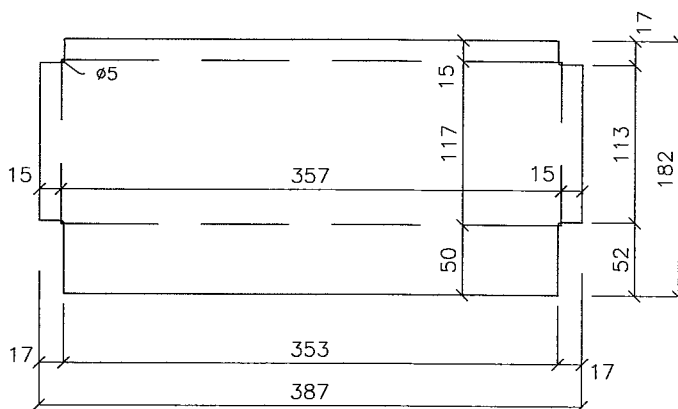

8.256	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ – BOKY	PLECH OCELOVÝ ČERNÝ HL. 1,5	ČSN 42 5310	S235JRG2	1T, 1N
8.257	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ – DNO	PLECH OCELOVÝ ČERNÝ HL. 1,5	ČSN 42 5310	S235JRG2	1
POLOŽKA	NÁZEV	MATERIÁL, ROZMĚR (mm)	NORMA, ODKAZ	JAKOST	MNOŽSTVÍ

2 x

 ČEŠKA PROJEKTOVÁNÍ STAVEB INŽENÝRSKÉ INVESTORSKÉ SLUŽBY Svítavy, Jugoslávská 1810/3 tel.: 774 487 632		Tato dokumentace je výhradním vlastnictvím firmy  ČEŠKA PSII.S. Její volné užití, modifikace, kopírování a přenechání třetí osobě bez souhlasu a autorizace vlastníka není dovoleno a bylo by porušováním autorských práv.			
Objekt		SILNIČNÍ MOSTNÍ VÁHA PROFI B2TR - 7,0x3,0/30 t			Verze R-ZEMIC / PRECIA
Zak. č.	CLN	Vypracoval ING. FRANTIŠEK ČEŠKA	Měřítka 1:4	Formát 1A4	
Pro MĚSTO SVITAVY, KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA		Obsah výkresu		Číslo výkresu	
Datum 21.1.2014	Změna	KAPSA DORAZU		PB2TR-0825	

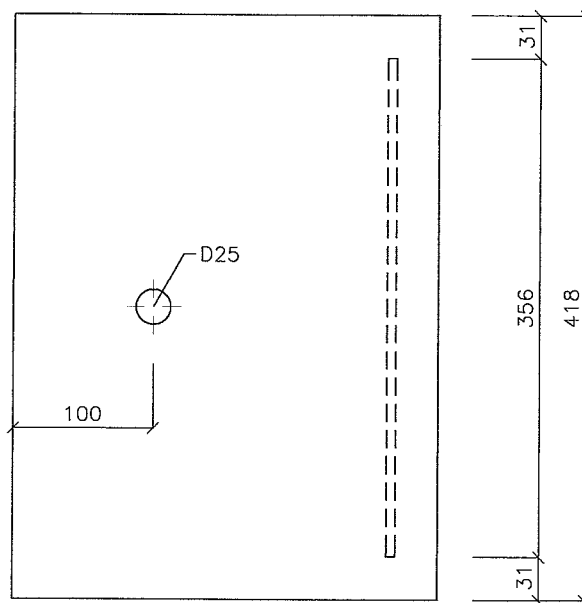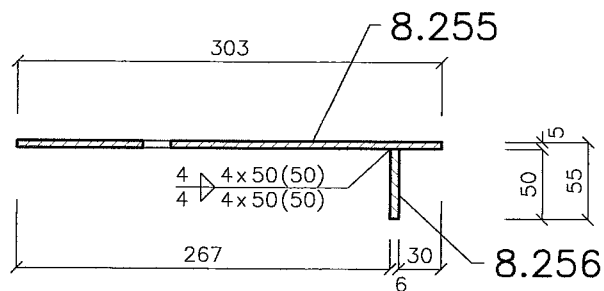

8.256	VÝZTUHA	TYČ OCEL. PLOCHÁ 50x6-345	ČSN 42 5522	S235JRG2	1
8.255	KRYT	OCELOVÝ PLECH ČERNÝ OV 5	ČSN 42 5392	S235JRG2	1
POLOŽKA	NÁZEV	MATERIÁL, ROZMĚR (mm)	NORMA, ODKAZ	JAKOST	MNOŽSTVÍ

2x

		Tato dokumentace je výhradním vlastnictvím firmy ČEŠKA PSIIS. Její volné užití, modifikace, kopírování a přenechání třetí osobě bez souhlasu a autorizace vlastníka není dovoleno a bylo by porušováním autorských práv.			
ČEŠKA PROJEKTOVÁNÍ STAVEB INŽENÝRSKÉ INVESTORSKÉ SLUŽBY Svitavy, Jugoslávská 1810/3 tel.: 774 487 632		Objekt SILNIČNÍ MOSTNÍ VÁHA PROFI B2TR - 7,0x3,0/30 t			Verze R-ZEMIC / PRECIA
Zak. č. 13962	CLN	Vypracoval ING. FRANTIŠEK ČEŠKA	Měřítko 1:4	Formát 1A4	
Pro MĚSTO SVITAVY, KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA		Obsah výkresu KRYT KAPSY DORAZU			Číslo výkresu PB2TR-0826
Datum 21.1.2014	Změna				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13	Silniční mostní váha VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO99	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014/002	Komunitní kompostárna Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	75 518	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	39 680	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 356	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	116 554	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	116 554	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	116 554	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		116 554 Kč
DPH		21,0 %		24 476 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				141 031 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet : 13
Objekt :	SO99 Změnové listy	Silniční mostní váha VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	488	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	49 193	0	0	0	0
5 Komunikace	4 446				
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 703	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	8 858	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 830	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	39 680	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	1 356	
CELKEM OBJEKT	75 518	39 680	0	1 356	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	116 554	0
Oborová přírážka	0	0,0	115 198	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	115 198	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	115 198	0
Zařízení staveniště	0	0,0	116 554	0
Provoz investora	0	0,0	116 554	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	116 554	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	116 554	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet: 13
Objekt :	SO99 Změnové listy	Silniční mostní váha VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,58	208,00	329,47
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,58	67,60	107,08
3	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	6,63	7,80	51,71
		původní PD: -24,12m3				
		změna PD: 30,75m3				
	Celkem za	1 Zemní práce				488,26
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	5,50	33,50	184,25
5	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	20,00	34,60	692,00
6	R	Trubka ochranná PE 65 mm-dodávka	m	5,50	60,00	330,00
7	R	Vedení uzemňovací FeZn, D 10 mm-dodávka	m	20,00	35,00	700,00
8	274361215R00	Výztuž základ. pásů do 12mm, ocel 10 425(BSt 500S)	t	0,46	24 480,00	11 194,70
9	278381542R00	Základy pod stroje do 5 m3, C 20/25, složitosti 2	m3	4,26	4 480,00	19 084,80
10	274321611R00	Železobeton základových pásů C 30/37	m3	2,12	2 795,00	5 914,22
11	274354111R00	Bednění základových pásů zřízení	m2	23,06	422,50	9 743,70
12	274354211R00	Bednění základových pásů odstranění	m2	23,06	58,50	1 349,13
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				49 192,80
Díl: 5		Komunikace				
13	564952111R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm MZK	m2	21,00	119,00	2 499,00
14	565141111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.6 cm ACP 16+	m2	21,00	278,50	5 848,50
15	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	21,00	15,80	331,80
16	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	21,00	13,70	287,70
17	577112113R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 4 cm	m2	21,00	211,70	4 445,70
	Celkem za	5 Komunikace				4 445,70
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
18	631312311R00	Mazanina betonová tl .5 - 8 cm C -/7,5	m3	1,32	2 049,80	2 702,66
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 702,66
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
19	936173114R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 500 kg	kus	2,00	4 428,90	8 857,80
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				8 857,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	38,40	256,00	9 830,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 830,40
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
21	R	Dodávka svařovaných dílů pro rámy nájezdů	kg	496,00	80,00	39 680,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				39 680,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13	Silniční mostní váha MP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO99	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014/002	Komunitní kompostárna Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-33 265	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-125	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-33 390	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-33 390	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-33 390	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		-33 390 Kč
DPH		21,0 %		-7 012 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-40 402 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet : 13
Objekt :	SO99 Změnové listy	Silniční mostní váha MP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 446	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	-17 111	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-7 669	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	-5 135	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-1 904	0	0	0	0
783 Nátěry	0	-125	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-33 265	-125	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-33 390	0
Oborová přírážka	0	0,0	-33 390	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-33 390	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-33 390	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-33 390	0
Provoz investora	0	0,0	-33 390	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-33 390	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-33 390	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet: 13
Objekt :	SO99 Změnové listy	Silniční mostní váha MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	-8,93	119,00	-1 062,67
		původní PD: -9,72m3				
		změna PD: 0,79m3				
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-8,93	9,90	-88,41
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-7,35	27,80	-204,33
		původní PD: -9,72m3				
		změna PD: (0,79+1,58)=2,37m3				
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	-7,35	12,30	-90,41
	Celkem za	1 Zemní práce				-1 445,81
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
5	210010044RT1	Trubka ohebná uložená pevně, 29 mm včetně dodávky trubky- chránička	m	-5,50	38,60	-212,30
6	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	-0,67	590,00	-397,19
7	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	-4,20	196,00	-823,20
8	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	-4,20	60,00	-252,00
9	278361522R00	Výztuž základů pod stroje z oceli 10 335 slož. 2	t	-0,63	24 670,00	-15 426,15
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				-17 110,84
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
10	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)	m3	-2,10	2 599,00	-5 457,90
11	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	-2,10	20,80	-43,68
12	631319185R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl.12 - 24cm	m3	-2,10	16,90	-35,49
13	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	-0,09	24 480,00	-2 132,21
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-7 669,28
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
14	553922413	Výroba ocelových atypických konstrukcí	kg	-106,79	25,00	-2 669,70
15	953942121R00	Osazení ochranných úhelníků	kus	-12,00	27,60	-331,20
16	95-1	Zaústění ochranné trubky do soc.objektu	kpl	-1,00	270,00	-270,00
17	13331734	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 60x 60x 8 mm	T	-0,11	17 454,00	-1 864,09
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				-5 134,99
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m dle technologického postupu zhotovitele	t	-26,38	72,20	-1 904,31
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-1 904,31



S V I T A V Y

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Název akce : Komunitní kompostárna - Svitavy

Akceptační číslo projektu : 11086084

Zkotovitel stavby : Ivan Úlehla, Kpt. Jaroše 560/99, Svitavy, (IČ 86677209)

Zpracovatel změnového listu : Ing. Dalibor Dvořáček. Ing. Jiří Škrabal.

Výchozí právní vztah : Smlouva o dílo č. 330/2013 ze dne 3.7.2013

část popisná -----

Předmět změny : Odvoz nadbytečné zeminy z plochy staveniště.

Přeměřením skutečného objemu skrývky byl zjištěn větší objem zeminy než obsahoval projektový výpočet a vysoutěžený soupis prací.

Stanovisko projektanta : Objem zeminy, který bylo nutné odvézt ze staveniště byl stanoven výpočtem. Skutečný stav byl mírně vyšší, konkrétně o 309 m³. Zhotovitel stavby nemohl při oceňování soupisu prací tuto skutečnost předpokládat.

Dokumentace změny : Viz. přiložený položkový rozpočet.

Stanovisko TDI : Veškeré dodatečné práce splňují podmínky smlouvy o dílo a jsou provedeny ve stejné kvalitě a vysoutěžených položkových cenách.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

část finanční -----

	základ	DPH	cena celkem
Cena víceprací	45 218.- Kč	9 496.- Kč	54 714.- Kč
Cena neprovedených prací	0.- Kč	0.- Kč	0.- Kč
Souhrn	45 218.- Kč	9 496.- Kč	54 714.- Kč

Přílohy : Položkový rozpočet víceprací, položkový rozpočet méněprací

datum, podpisy -----

Datum zpracování : 21.4.2014

BETA - PROJEKT spol. s r. o.
Pavlovova 43 • 568 02 SVITAVY
DIČ: CZ64257614 • IČO: 64257614

- 3 -

Zhotovitel :


ULEHLA IVAN
Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy
IČO: 866 77 209, DIČ: CZ 780329348
Tel.: 776 334 460

Technický dozor investora :



 **SPORTEŠ**
Svitavy s.r.o.
Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
IČ: 62062620, DIČ: CZ: 62062620
č. 07

Statutární zástupce investora :

Pavel Čížek
MÍSTOSTAROSTA



 T.G. Masaryka 35
568 11 Svitavy
MĚSTO
SVITAVY

•13•



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	105	Odvoz zeminy - Park rev.1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO99	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014/002	Komunitní kompostárna Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	45 218	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	45 218	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	45 218	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	45 218	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		45 218 Kč
DPH		21,0 %		9 496 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				54 714 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet : 105
Objekt :	SO99 Změnové listy	Odvoz zeminy - Park rev.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	45 218	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	45 218	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	45 218	0
Oborová přírážka	0	0,0	45 218	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	45 218	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	45 218	0
Zařízení staveniště	0	0,0	45 218	0
Provoz investora	0	0,0	45 218	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	45 218	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	45 218	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet: 105
Objekt :	SO99 Změnové listy	Odvoz zeminy - Park rev.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	309,71	122,30	37 877,53
		IO03 01 Kanalizace splašková:25,17		25,17		
		IO03 02 Kanalizace dešťová:79,09		79,09		
		IO03 03 Záchytná jímka:107,44		107,44		
		IO04 01 Vodovodní přípojka:43,23		43,23		
		IO05 01 Kabelová přípojka:308*0,35*0,1		10,78		
		SO 01 Sklad techniky:26,56		26,56		
		SO 02 Sociální zázemí:2,1		2,10		
		SO 03 Boxy pro kompostování:15,34		15,34		
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	309,71	23,70	7 340,13
	Celkem za	1 Zemní práce				45 217,66



S V I T A V Y

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Název akce : Komunitní kompostárna - Svitavy

Akceptační číslo projektu : 11086084

Zkotevovatel stavby : Ivan Úlehla, Kpt. Jaroše 560/99, Svitavy, (IČ 86677209)

Zpracovatel změnového listu : Ing. Dalibor Dvořáček. Ing. Jiří Škrabal.

Výchozí právní vztah : Smlouva o dílo č. 330/2013 ze dne 3.7.2013

část popisná -----

Předmět změny : Úprava trasy přípojky nízkého napětí.

Předmětem dodatečných prací je úprava vedení trasy přípojky nízkého napětí a osazení přípojného místa přístrojovým vybavením.

Stanovisko projektanta : Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele detailně neřešila křížení elektropřípojky s trasou středotlakého plynového potrubí. Způsob křížení bylo nutné dopracovat až při realizaci po odkrytí plynového vedení. Na trase elektropřípojky, v areálu firmy P-D Refractories CZ, byly při realizaci zjištěny skryté betonové konstrukce, které bylo nutné odstranit a odvézt. Rovněž připojení do rozvodné stanice a způsob měření nebyl v době zpracování dokumentace známý.

Zhotovitel stavby nemohl při oceňování soupisu prací tuto skutečnost předpokládat.

Dokumentace změny : Výkresová dokumentace trasy elektropřípojky, osazovací plán připojení v rozvodné stanici, rozpočty víceprací a neprovedených prací.

Stanovisko TDI : Veškeré dodatečné práce splňují podmínky smlouvy o dílo a jsou provedeny ve stejné kvalitě a vysoutěžených položkových cenách.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

	základ	DPH	cena celkem
Cena víceprací	27 577.- Kč	5 792.- Kč	33 369.- Kč
Cena neprovedených prací	1 690.- Kč	355.- Kč	2 045.- Kč
Souhrn	25 887.- Kč	5 437.- Kč	31 324.- Kč

Položkový rozpočet víceprací, položkový rozpočet méněprací

datum, podpisy

10.5.2014

ZLATÁ RÁČE

ULEHLA VAN

Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy

IČO: 86677209, DIČ: CZ 780329348

TEL: 776 334 460

Chas. Kelly

Chas. Kelly

~~BETA - PROJEKT spol. s r. o.~~
Pavlovova 43 + 568 02 SVITAVY
DIČ: CZ64257614 + IČO: 64257614

SPORTES
Svitavy s.r.o.
Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
IČ: 62062620, DIČ: CZ: 62062620
č. 07

Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
IČ: 62062620, DIČ: CZ: 62062620
č. 07

REY ~~CR~~

DETA - ~~PROJEKT~~ SP

POVLOVOVA 43 - 568
DIČ: C74 405711

DIC: C20423/614 * ICC


- 3 -

Pavel Čížek
MÍSTOSTAROSTA

 T. G. Masaryka 35
568 11 Svitavy

T G. Masaryka 35
568 11 Svitavy

~~MĚSTO~~
SVITAVY



Pro vodu,
vzduch a přírodu

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 BETA PROJEKT s.r.o. Pavlovova 43 568 02 SVITAVY tel: +420461540810-2 betaprojekt@cmail.cz
Ing. PAVLÍK Zdeněk	Ing. HASENÖHRL Petr	
KRAJ: PARDUBICKÝ	MÍSTO: PRŮMYSLOVÁ, SVITAVY	
INVESTOR: Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35 568 02 SVITAVY		ČÍSLO ZAKÁZKY 34/2012/0S
AKCE KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY		ARCH. ČÍSLO
		STUP. DOKUM. ÚZEMNÍ SOUHLAS
		DATUM ŘÍJEN 2012
		FORMÁT
OBJEKT PŘÍPOJKA NN	PARÉ 3	
OBSAH TECHNICKÁ ZPRÁVA		

Identifikační údaje stavby :

Akce : **KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY**
Část : **KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN**
Investor : **MĚSTO SVITAVY, T.G.MASARYKA 5/35 SVITAVY**
Místo stavby : **SVITAVY, K.Ú.MORAVSKÝ LAČNOV**
Projektant : **BETAPROJEKT s.r.o. PAVLOVOVA 43 SVITAVY**
Stupeň PD : **PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS**

Seznam stavbou dotčených parcel :

k.ú. Moravský Lačnov

parcela č. vlastník parcely

st.608/1 P-D Refraktories CZ a.s. Nádražní 218 Velké Opatovice 679 63

st.611 P-D Refraktories CZ a.s. Nádražní 218 Velké Opatovice 679 63

2120/5 P-D Refraktories CZ a.s. Nádražní 218 Velké Opatovice 679 63

2120/16 P-D Refraktories CZ a.s. Nádražní 218 Velké Opatovice 679 63

2120/27 Město Svitavy T.G.Masaryka 5/35 Svitavy 568 02

2120/34 P-D Refraktories CZ a.s. Nádražní 218 Velké Opatovice 679 63

Technický popis stavby:

Bude vybudována kabelová přípojka nn z areálu firmy P-D Refraktories CZ a.s. závod Dinas Svitavy k.ú.Moravský Lačnov kabelem 1-AYKY-J 3x95+70mm² do areálu plánované výstavby komunitní kompostárny. Připojení bude provedeno v rozvodně nn. Kabel bude uložen v rozvodně na stávajících kabelových roštích a vyveden do stávajícího trubního propojení mezi rozvodnou a objektem dieselaagregátu. V tomto objektu bude kabel uložen na stěnu a vyveden v základech. Dále bude kabel uložen v zemi v kabelové rýze hl.80cm. Ukončení přípojky bude provedeno v pojistkové skřini SP. Trasa kabelové přípojky je zakreslena ve výkresu číslo 1.

Zemní práce:

Zemní práce se budou provádět převážně strojně. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku určenou Městským úřadem, případně použita pro terénní úpravy okolí stavby.


Před záhozem kabelových rýh se provede geodetické zaměření a terén včetně komunikací a zpevněných ploch bude uveden do původního stavu.

Svitavy, říjen 2012

Vypracoval: Ing. Hasenöhrl Petr

BETA - PROJEKT spol. s r. o.
Pavlova 43 - 568 02 SVITAVY
DIČ: CZ629514 - IČO: 64257614

STÁVAJÍCÍ ROZVADEČ

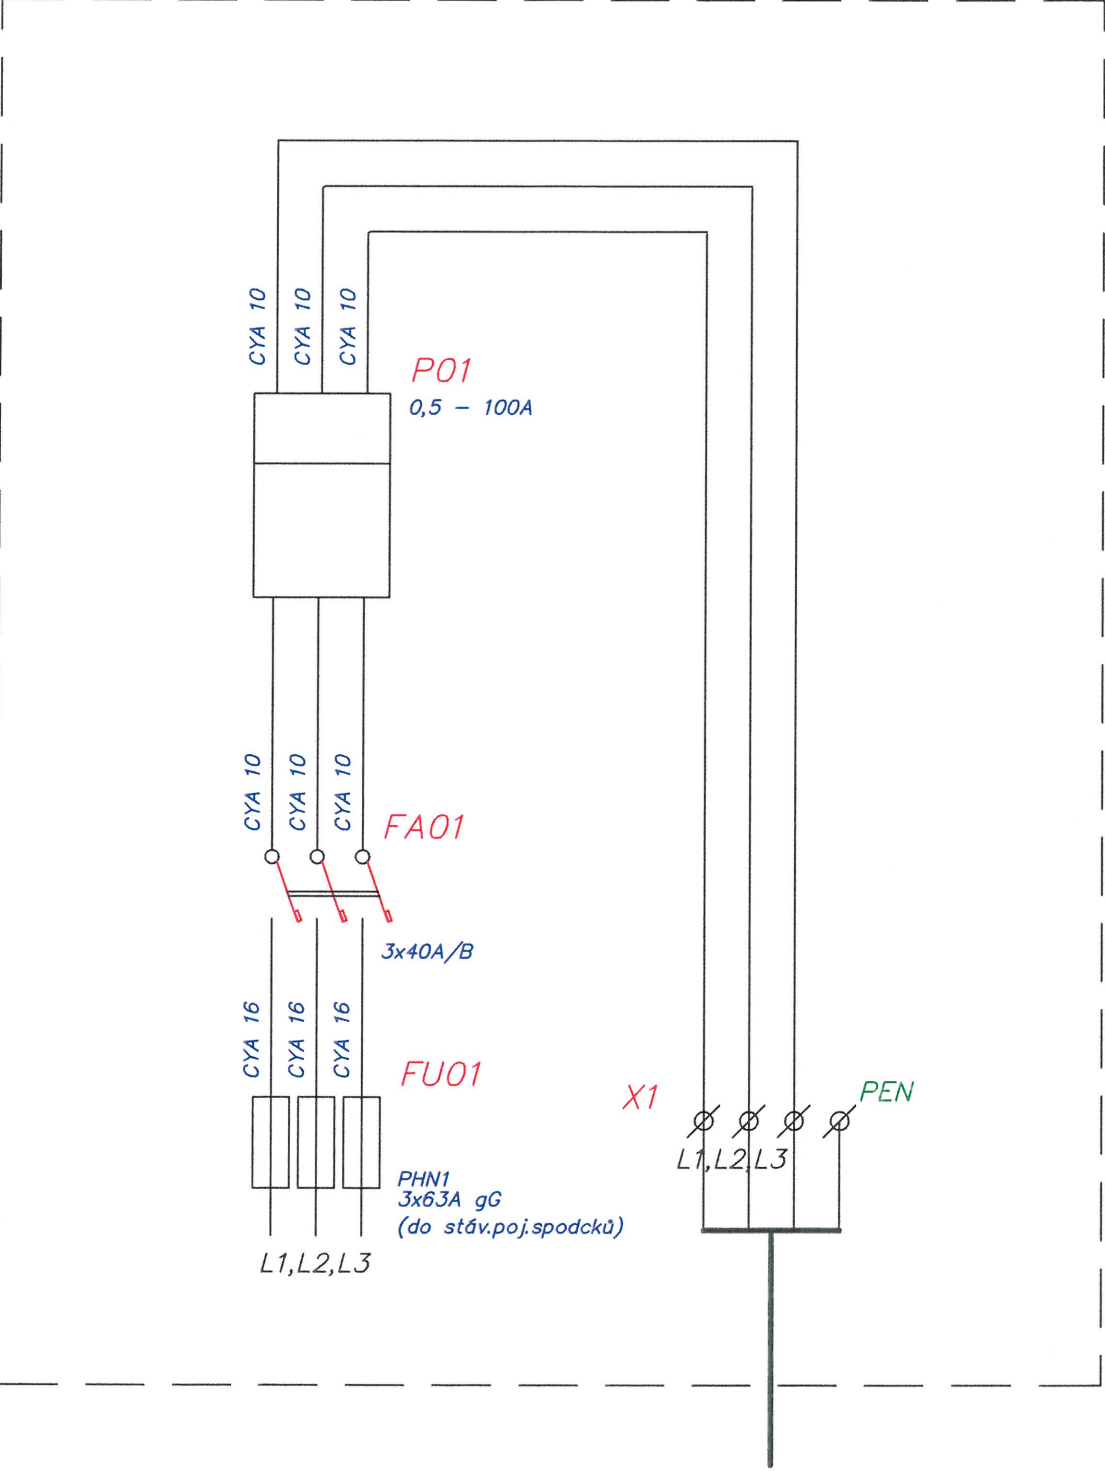

VÝVOD PRO KOMPOSTÁRNU
KABEL 1–AYKY 4B 3x90+70

ÚPRAVA STÁV.ROZVADEČE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :
3+PEN,STR.50Hz,400/230V TN–C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

			CENA
FA01	TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ 3x40A/B	1 KS	410,00 Kč
FU01	POJISTKOVÉ VLOŽKY PHNA 1 63A gG (VE STÁVAJÍCÍCH SPODCÍCH)	3 KS	3x48,00 Kč
P01	TŘÍPÓLOVÝ JEDNOTARIFNÍ ELEKTROMĚR PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ	1 KS	2860,– Kč
X1	SVORKY PRO PŘIPOJENÍ VODIČŮ PR.90mm2 KABELOVÝMI OKY	4 KS	4x110,00 Kč
CYA	PROPOJOVACÍ VODIČE PRŮŘEZ 10mm2	15 M	15x38,00 Kč
	PRŮŘEZ 16mm2	5 M	5x56,00 Kč
	UPEVŇOVACÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL MONTÁŽE	DLE POTŘEBY	1150,00 Kč 2400,00 Kč
	PROPOČET CENY CELKEM (bez DPH)		8254,00 Kč
	PROPOČET CENY vč. DPH 21%		9987,00 Kč

POZNÁMKA:
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ ODEBÍRANÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE BUDE INSTALOVÁNO
DO STÁVAJÍCÍHO SKŘÍŇOVÉHO ROZVADEČE V ROZVODNĚ NN (PŘESNÉ MÍSTO
BUDE UPŘESNĚNO ODPOVĚDNÝM ZÁSTUPCEM PD REFRAKTORIES A.S.)

ZODP. PROJEKTANT Ing. PAVLÍK Zdeněk		VYPRACOVAL Ing. HASENÖHRL Petr		 BETA PROJEKT s.r.o Pavlovova 43 568 02 SVITAVY tel: +420461540810-2 betaprojekt@gmail.cz	
KRAJ: PARDUBICKÝ		MÍSTO: PRŮMYSLOVÁ, SVITAVY			
INVESTOR: Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 SVITAVY					
AKCE				ČÍSLO ZAKÁZKY 34/2012/DPS	
KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY				ARCH. ČÍSLO	
				STUP. DOKUM. PROVÁDĚNÍ STAVBY	
				DATUM BŘEZEN 2014	
				FORMÁT	
ČÁST B. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY					
OBJEKT IO 05 – PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN				MĚŘÍTKO —	
OBSAH MĚŘENÍ ODEBÍRANÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE				ČÍSLO VÝKRESU B05.4	
				PARÉ 1	

2121/3



- ## NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

-

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN 400/230V STŘ.50Hz TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL			BETA PROJEKT s.r.o Pavlovova 43 568 02 SVITAVY tel: +420461540810-2 betaprojekt@email.cz				
Ing. PAVLÍK Zdeněk		Ing. HASENÖHRL Petr							
KRAJ: PARDUBICKÝ				MÍSTO: PRŮMYSLOVÁ, SVITAVY					
INVESTOR: Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 SVITAVY				ČÍSLO ZAKÁZKY		34/2012/ÚS			
AKCE KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY				ARCH. ČÍSLO					
				STUP. DOKUM.		ÚZEMNÍ SOUHLAS			
				DATUM		ŘÍJEN 2012			
				FORMÁT					
OBJEKT PŘÍPOJKA NN				MĚŘITKO		ČÍSLO VÝKRESU		PARÉ	
OBSAH SITUACE				1:1000		1		3	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4b Přípojka NN - VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO99	Změnové listy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2014/002	Komunitní kompostárna Svitavy	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 058	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	12 723	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	1 512	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		18 293	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		18 293	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		18 293	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	18 293 Kč
DPH		21,0 %	3 842 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			22 135 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet : 4b
Objekt :	SO99 Změnové listy	Přípojka NN - VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 898	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 160	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	1 512	12 723	0
CELKEM OBJEKT	4 058	0	1 512	12 723	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 058	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 058	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 058	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 058	0
Zařízení staveniště	0	0,0	16 781	0
Provoz investora	0	0,0	16 781	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	18 293	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 293	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet: 4b
Objekt :	SO99 Změnové listy	Přípojka NN - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107132R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	1,10	589,20	648,12
2	R	Přesun kletí v trase přípojky NN	kpl.	1,00	2 250,00	2 250,00
	Celkem za	1 Zemní práce				2 898,12
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
3	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	1,00	129,00	129,00
4	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	1,00	224,00	224,00
5	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	4,40	183,30	806,52
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 159,52
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
6	460030092RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých s očištěním a uložením na hromady	m	1,00	37,50	37,50
7	460030092RT2	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých obrubníky do suti	m	1,00	32,70	32,70
8	460080002R00	Betonový základ do bednění 0,4*0,8*0,5	m3	0,16	2 407,40	385,18
9	460080113U00	Bourání základ železobetonový beton u zdi diselagregat 0,4*0,8*0,5	m3	0,16	4 789,00	766,24
10	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop sonda na VTL PLYNOVODU	kus	1,00	255,70	255,70
11	460200733RT2	Výkop kabelové rýhy 65/170 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	8,00	598,50	4 788,00
12	460510201R00	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný	m	6,00	108,80	652,80
13	460570733R00	Zához rýhy 65/170 cm, hornina tř. 3, se zhuštění	m	8,00	132,70	1 061,60
14	460600001RT1	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 500 m	m3	16,00	134,10	2 145,60
15	460600061U00	Odvoz suti do 1 km	t	1,08	323,00	349,81
		Betonová vozovka:0,55		0,55		
		Obrubníky:0,149		0,15		
		Základ:0,384		0,38		
16	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1 km	t	8,58	12,30	105,58
		8*1,073		8,58		
17	460650024R00	Vozovka jednovrstvá z betonu 20 cm	m2	1,10	327,00	359,70
18	460680044RT2	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 60 cm	kus	1,00	1 512,20	1 512,20
19	R	Poplatek za uložení suti	t	1,08	250,00	270,75
20	59213110	Žlab plnostěnný železobet.AZD 13-100 100x20x17 cm	kus	6,00	252,00	1 512,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				14 235,37

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4a Přípojka NN - MP	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO99	Změnové listy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2014/002	Komunitní kompostárna Svitavy	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0		
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0		
R	M práce celkem	-1 690	Přesun stavebních kapacit	0		
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0		
ZRN celkem		-1 690	Zařízení staveniště	0		
			Provoz investora	0		
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0		
ZRN+HZS		-1 690	Ostatní náklady neuvedené	0		
ZRN+ost.náklady+HZS		-1 690	Ostatní náklady celkem	0		
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :			Jméno :		Jméno :	
Datum :			Datum :		Datum :	
Podpis :			Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH			21,0	%	-1 690 Kč	
DPH			21,0	%	-355 Kč	
Základ pro DPH			0,0	%	0 Kč	
DPH			0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-2 045 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet : 4a
Objekt :	SO99 Změnové listy	Přípojka NN - MP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	-1 690	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-1 690	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-1 690	0
Provoz investora	0	0,0	-1 690	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-1 690	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-1 690	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet: 4a
Objekt :	SO99 Změnové listy	Přípojka NN - MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
1	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	-8,00	49,30	-394,40
2	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	-8,00	18,50	-148,00
3	460300201R00	Protlačení otvoru strojně do D150 mm	m	-1,00	1 148,00	-1 148,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				-1 690,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	14	Přípojka NN - měření odebírané ene	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO99	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014/002	Komunitní kompostárna Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	9 284	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	9 284	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	9 284	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	9 284	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		9 284 Kč
DPH		21,0 %		1 950 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				11 234 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet : 14
Objekt :	SO99 Změnové listy	Přípojka NN - měření odebírané energie

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	9 284	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	9 284	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	9 284	0
Provoz investora	0	0,0	9 284	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	9 284	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	9 284	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet: 14
Objekt :	SO99 Změnové listy	Přípojka NN - měření odebírané energie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	R	Propojovací vodiče 16 mm ²	m	5,00	61,50	307,50
2	R	Propojovací vodiče 10 mm ²	m	15,00	41,00	615,00
3	R	Montáže	kpl.	1,00	2 640,00	2 640,00
4	R	Upevňovací a spojovací materiál	kpl.	1,00	1 300,00	1 300,00
5	R	Pojistkové vložky PHNA 1 63A	kus	3,00	48,00	144,00
6	R	Třípolový jistič 3x40A/B	kus	1,00	653,00	653,00
7	R	Svorky pro připojení vodičů pr.90mm ²	kus	4,00	121,00	484,00
8	R	Třípolový jednotarifní elektroměr-přímé měření	kus	1,00	3 140,00	3 140,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				9 283,50



S V I T A V Y

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Název akce : Komunitní kompostárna - Svitavy

Akceptační číslo projektu : 11086084

Zkotovitel stavby : Ivan Úlehla, Kpt. Jaroše 560/99, Svitavy, (IČ 86677209)

Zpracovatel změnového listu : Ing. Dalibor Dvořáček. Ing. Jiří Škrabal.

Výchozí právní vztah : Smlouva o dílo č. 330/2013 ze dne 3.7.2013

část popisná -----

Předmět změny : Změna umístění hydrantu užitkové vody.

Vzhledem k mírně upravenému prostorovému uspořádání inženýrských sítí způsobenému geologickými podmínkami a odtokovými podmínkami kanalizace v areálu stavby dochází k posunu hydrantu užitkové vody o několik metrů, na druhou stranu obslužné komunikace.

Stanovisko projektanta : Během provádění zemních prací byla zjištěna odlišná poloha stávajících inženýrských sítí. V průběhu stavby bylo navíc rozhodnuto o dalším rozvoji průmyslové zóny směrem za kompostárnu a původně navržené místo pro umístění hydrantu by bylo v kolizi s pokračující obslužnou komunikací.

Zhotovitel stavby nemohl při oceňování soupisu prací tuto skutečnost předpokládat.

Dokumentace změny : Situační výkres, fotodokumentace skutečného provedení.

Stanovisko TDI : Veškeré dodatečné práce splňují podmínky smlouvy o dílo a jsou provedeny ve stejné kvalitě a vysoutěžených položkových cenách.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

	základ	DPH	cena celkem
Cena víceprací	35 554.- Kč	7 466.- Kč	43 021.- Kč
Cena neprovedených prací	16 839.- Kč	3 536.- Kč	20 376.- Kč
Souhrn	18 715.- Kč	3 930.- Kč	22 645.- Kč

Položkový rozpočet víceprací, položkový rozpočet méněprací

[illegible]

10.5.2014

ULEHLA IVAN
Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy
IČO: 866 77 209, DIČ: CZ 780329348
Tel.: 776 334 460


 **SPORTES**
Svitavy s.r.o.

Ringrova 2098.5 568 02 Svltavy
IC: 62062620, DIČ: CZ 62062620
6.07

BETA - PROJEKT spol. s r. o.
Pavlovova 43 * 568 02 SVITAVY
DIČ: CZ64257614 * IČO: 64257614

- 3 -

Pavel Čížek
MÍSTOSTAROSTA



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ




Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KOMUNITNÍ KOMPOTÁRNA SVITAVY

PŘENÍSTĚNÍ HYDRANTU

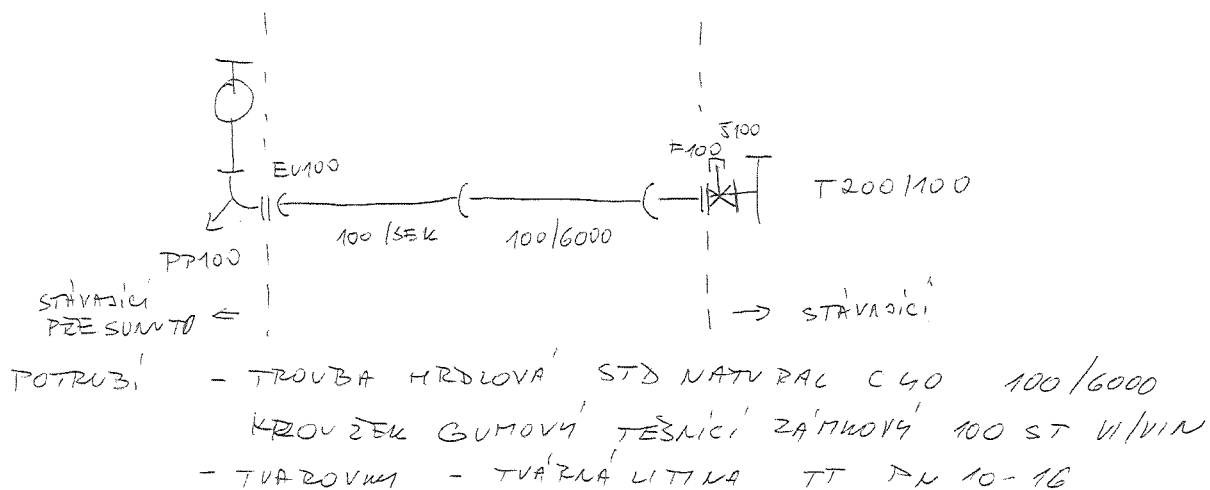


Soubor s návrhem
 k přeměně



**Vodárenská
 Svitavy s.r.o.**

Vodárenská Svitavy s.r.o.
 Hradec nad Svitavou 494
 569 01 Hradec nad Svitavou
 IČ: 27549704
 DIČ: CZ 27549704
 číslo účtu: 1220852349/0800

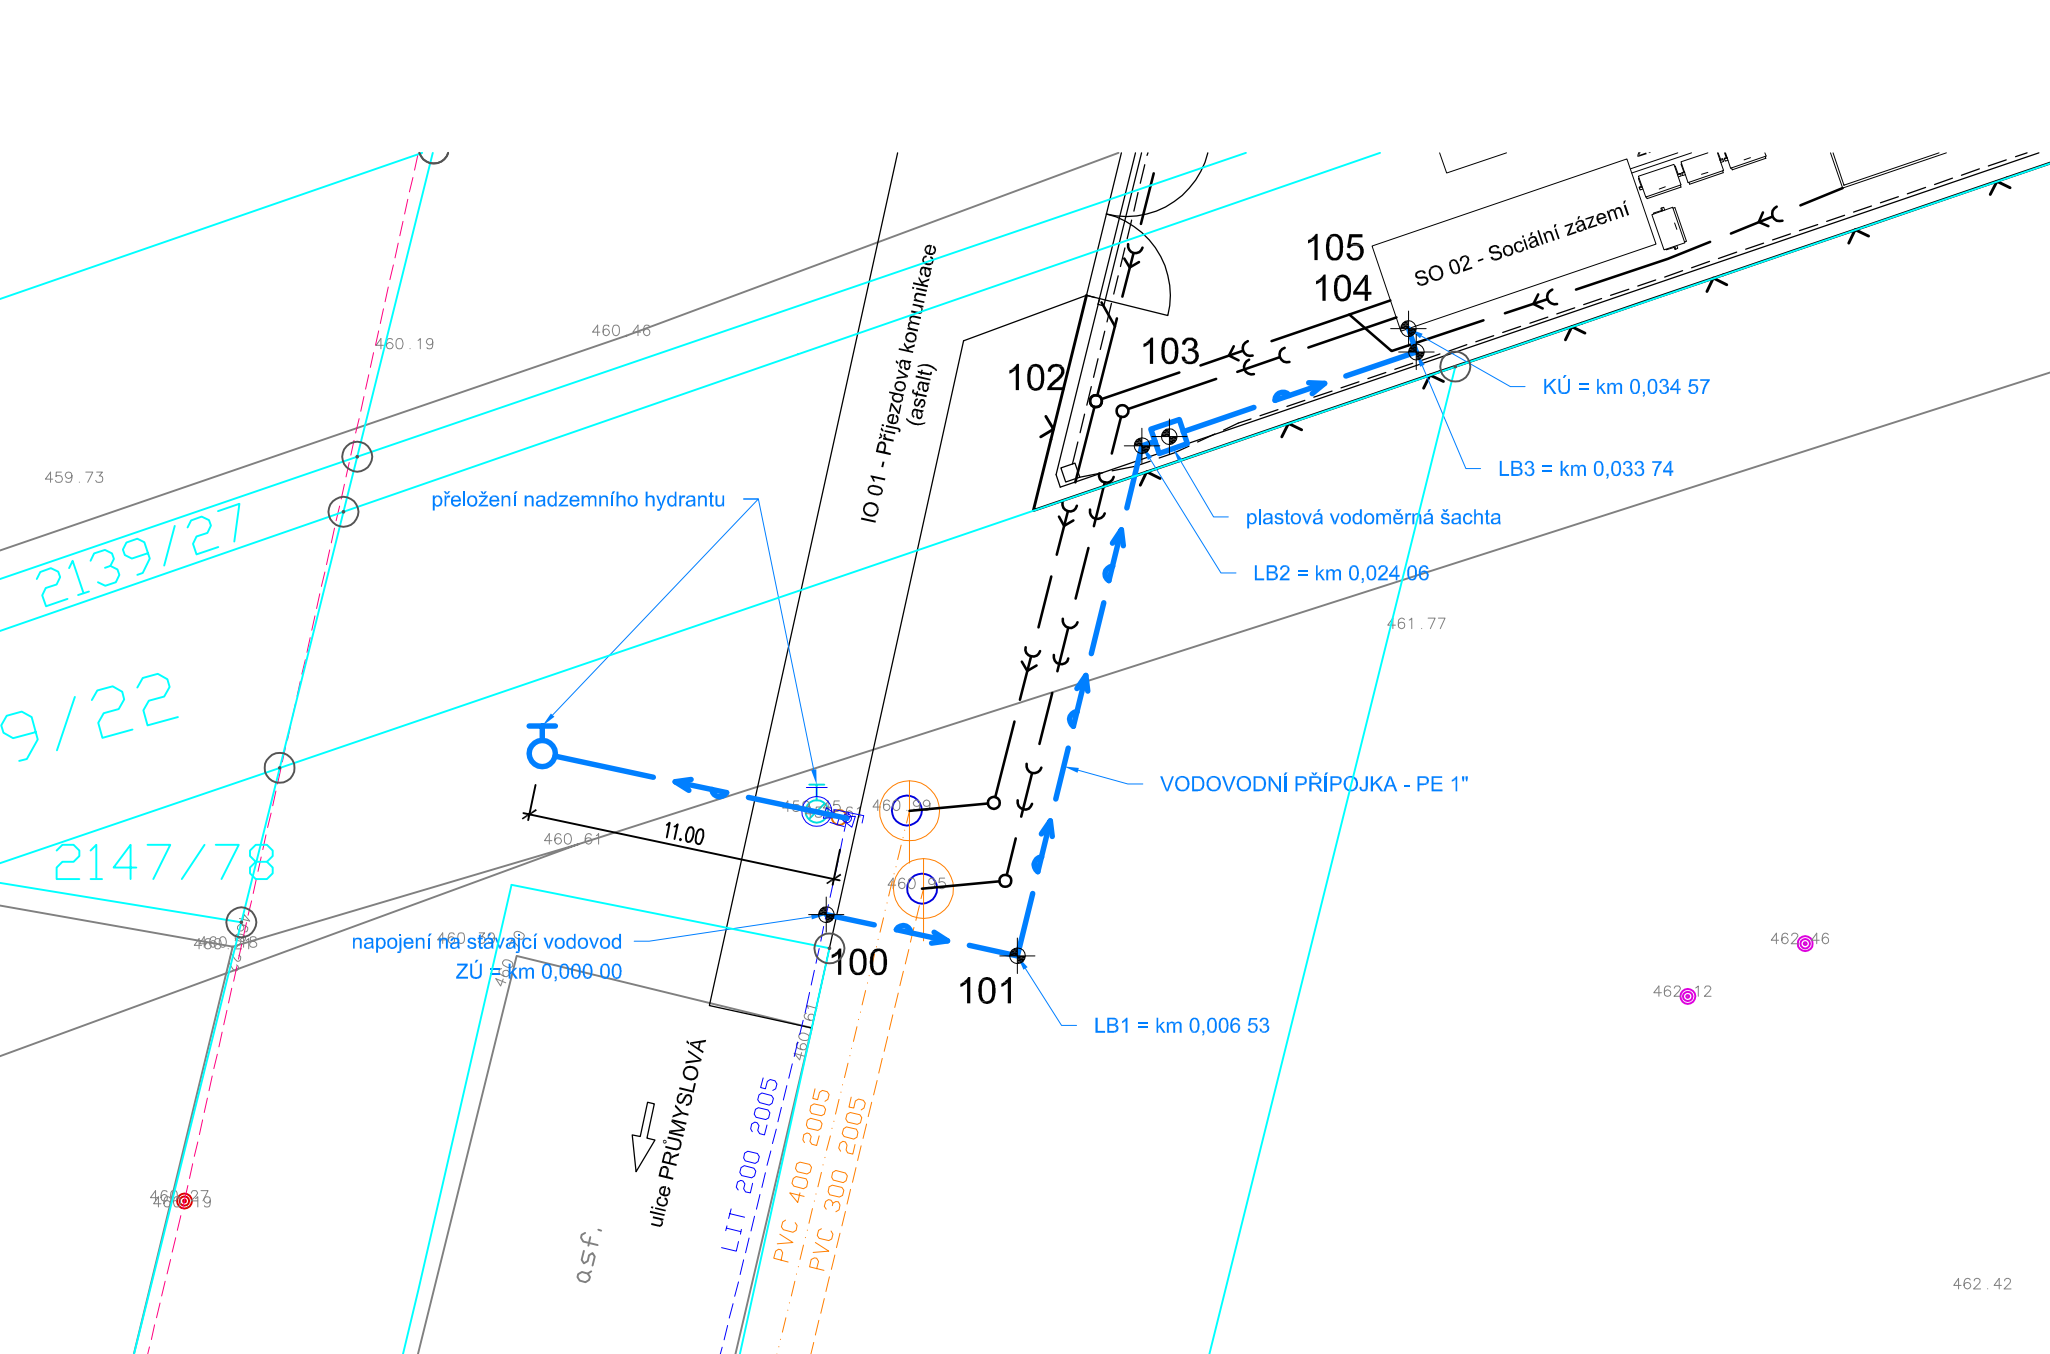



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5b	Vodovod - změna umístění hydrantu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO99	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014/002	Komunitní kompostárna Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	35 137	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	417	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		35 554	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		35 554	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		35 554	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	35 554 Kč	
DPH		21,0	%	7 466 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				43 021 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet : 5b
Objekt :	SO99 Změnové listy	Vodovod - změna umístění hydrantu - VO

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 521	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	343	0	0	0	0
8 Trubní vedení	24 906	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 367	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	312	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	105	0
CELKEM OBJEKT	35 137	0	0	417	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	35 137	0
Oborová přírážka	0	0,0	35 137	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	35 137	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	35 137	0
Zařízení staveniště	0	0,0	35 554	0
Provoz investora	0	0,0	35 554	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	35 554	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	35 554	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet: 5b
Objekt :	SO99 Změnové listy	Vodovod - změna umístění hydrantu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 14*0,8*1,8/2 -2,24	m3	7,84 10,08 -2,24	119,00	932,96
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	7,84	9,90	77,62
3	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 14*0,8*1,8/2 -2,24	m3	7,84 10,08 -2,24	119,00	932,96
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	7,84	9,90	77,62
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 14*0,8*1,8 -4,48	m3	15,68 20,16 -4,48	27,00	423,36
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Lože:1,12 Obsyp:4,3701 Potrubí:0,1099 Zásyp ŠD:8,8 -7,04	m3	7,36 1,12 4,37 0,11 8,80 -7,04	27,80	204,61
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	7,36	12,30	90,53
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Výkopy:20,16 Lože:-1,12 Obsyp:-4,3701 Potrubí:-0,1099 -2,56	m3	12,00 20,16 -1,12 -4,37 -0,11 -2,56	33,80	405,60
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 14*0,8*0,4 odpočet potrubí:-3,14*0,1*0,1/4*14 -1,6	m3	2,77 4,48 -0,11 -1,60	119,00	329,64
10	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 trasa v zeleném pásu:3*0,8	m2	2,40 2,40	8,20	19,68
11	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním trasa v zeleném pásu:3*0,8	m2	2,40 2,40	7,80	18,72
12	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 trasa v zeleném pásu:3*0,8	m2	2,40 2,40	7,10	17,04
13	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině trasa v zeleném pásu:3*0,8	m2	2,40 2,40	6,80	16,32
14	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 3*0,8*0,03	kg	0,07 0,07	90,00	6,48
15	58337310	Šterkopísek frakce 0-4 tř.B 4,3701*1,74 -2,784	T	4,82 7,60 -2,78	172,00	829,04
16	58337368	Šterkopísek frakce 0-63 tř.A Zásyp rýhy ŠD:11*1*0,8*1,74	T	15,31 15,31	205,00	3 138,96
Celkem za		1 Zemní práce				7 521,13
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 14*0,8*0,1 -0,32	m3	0,80 1,12 -0,32	428,60	342,88
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				342,88
Díl: 8		Trubní vedení				

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet: 5b
Objekt :	SO99 Změnové listy	Vodovod - změna umístění hydrantu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	851601102RT1	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	m	12,00	78,50	942,00
19	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	3,00	267,80	803,40
20	891267211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,00	523,60	523,60
21	5525852704	Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem Duktus F DN100	kus	1,01	1 133,16	1 144,49
22	55259731	Tvarovka přírubová s hrdlem EU DN100 Lu130mm EWS	kus	1,01	1 571,94	1 587,66
23	5526009771	kroužek těs.TYTON-SIT-PLUS pro vod.potr.EPDM100	kus	3,00	2 886,86	8 660,58
24	552700001	Trouba vod. litin. NATURAL STD, L=6,0m DN 100	kus	2,02	5 566,40	11 244,13
Celkem za		8 Trubní vedení				24 905,86
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
25	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	19,73	120,00	2 367,00
		24,4001		24,40		
		-4,67508899999958		-4,68		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 367,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
26	210800527RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 6	m	16,00	19,50	312,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				312,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
27	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	14,00	7,50	105,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				105,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5a	Vodovod - změna umístění hydrantu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO99	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014/002	Komunitní kompostárna Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-16 839	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-16 839	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-16 839	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-16 839	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		-16 839 Kč
DPH		21,0 %		-3 536 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-20 376 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet : 5a
Objekt :	SO99 Změnové listy	Vodovod - změna umístění hydrantu - M

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	-630	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-16 209	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-16 839	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-16 839	0
Oborová přírážka	0	0,0	-16 839	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-16 839	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-16 839	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-16 839	0
Provoz investora	0	0,0	-16 839	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-16 839	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-16 839	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet: 5a
Objekt :	SO99 Změnové listy	Vodovod - změna umístění hydrantu - MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	-6,00	105,00	-630,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				-630,00
Díl: 8		Trubní vedení				
2	852351121R00	Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 200	kus	-1,00	344,50	-344,50
3	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	-2,00	98,20	-196,40
4	857352121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200	kus	-1,00	221,00	-221,00
5	857354121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 200	kus	-1,00	304,90	-304,90
6	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	-1,00	169,00	-169,00
7	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	-1,00	237,30	-237,30
8	31948313.A	Příruba zaslepovací PN 16 jakost 11375 DN 200 mm	kus	-1,01	1 308,60	-1 321,69
9	55251210	Trouba přírubová litinová FF DN 80 dl. 300	kus	-1,01	688,00	-694,88
10	55251300	Trouba přírubová litinová FF DN 150 dl. 100 mm EWS	kus	-2,02	4 658,20	-9 409,56
11	55255344	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN200/80 mm	kus	-1,01	3 277,40	-3 310,17
	Celkem za	8 Trubní vedení				-16 209,40



S V I T A V Y

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Název akce : Komunitní kompostárna - Svitavy

Akceptační číslo projektu : 11086084

Zkotevovatel stavby : Ivan Úlehla, Kpt. Jaroše 560/99, Svitavy, (IČ 86677209)

Zpracovatel změnového listu : Ing. Dalibor Dvořáček. Ing. Jiří Škrabal.

Výchozí právní vztah : Smlouva o dílo č. 330/2013 ze dne 3.7.2013

část popisná -----

Předmět změny : Úprava kanalizačních šachet dešťové a splaškové kanalizace.

Nově vybudovaný areál kompostárny předpokládá odkanalizování napojením na koncové šachty kanalizační sítě zainvestovaných ploch průmyslové zóny. V průběhu realizace akce a kontrole odtokových poměrů byla správcem sítě nařízena úprava sklonů, která má za následek výměnu prefabrikátů u dvou šachet, resp. prohloubení jejich dna.

Stanovisko projektanta : Napojení splaškové a dešťové kanalizace z areálu kompostárny bylo projektováno po dohodě s provozovatelem městské kanalizace. Napojení mělo být provedeno do odvrtných otvorů ve stávajících šachtách jednotlivých stok. V průběhu realizace stavby bylo provozovatelem městské kanalizace řešení napojení změněno. Z důvodů dalšího budoucího rozšíření průmyslové zóny bylo požadováno provedení šachet nových a změna jejich pozice s ohledem na pokračování kanalizačního řádu a průběh ostatních nově budovaných inženýrských sítí.

Zhotovitel stavby byl nucen stávající šachty vykopat a osadit šachty nové. Tuto skutečnost nemohl při oceňování soupisu prací předpokládat.

Dokumentace změny : Situační výkres kanalizační přípojky a budoucího pokračování stok. Foto-dokumentace vyměněných šachet.

Stanovisko TDI : Veškeré dodatečné práce splňují podmínky smlouvy o dílo a jsou provedeny ve stejné kvalitě a vysoutěžených položkových cenách.




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

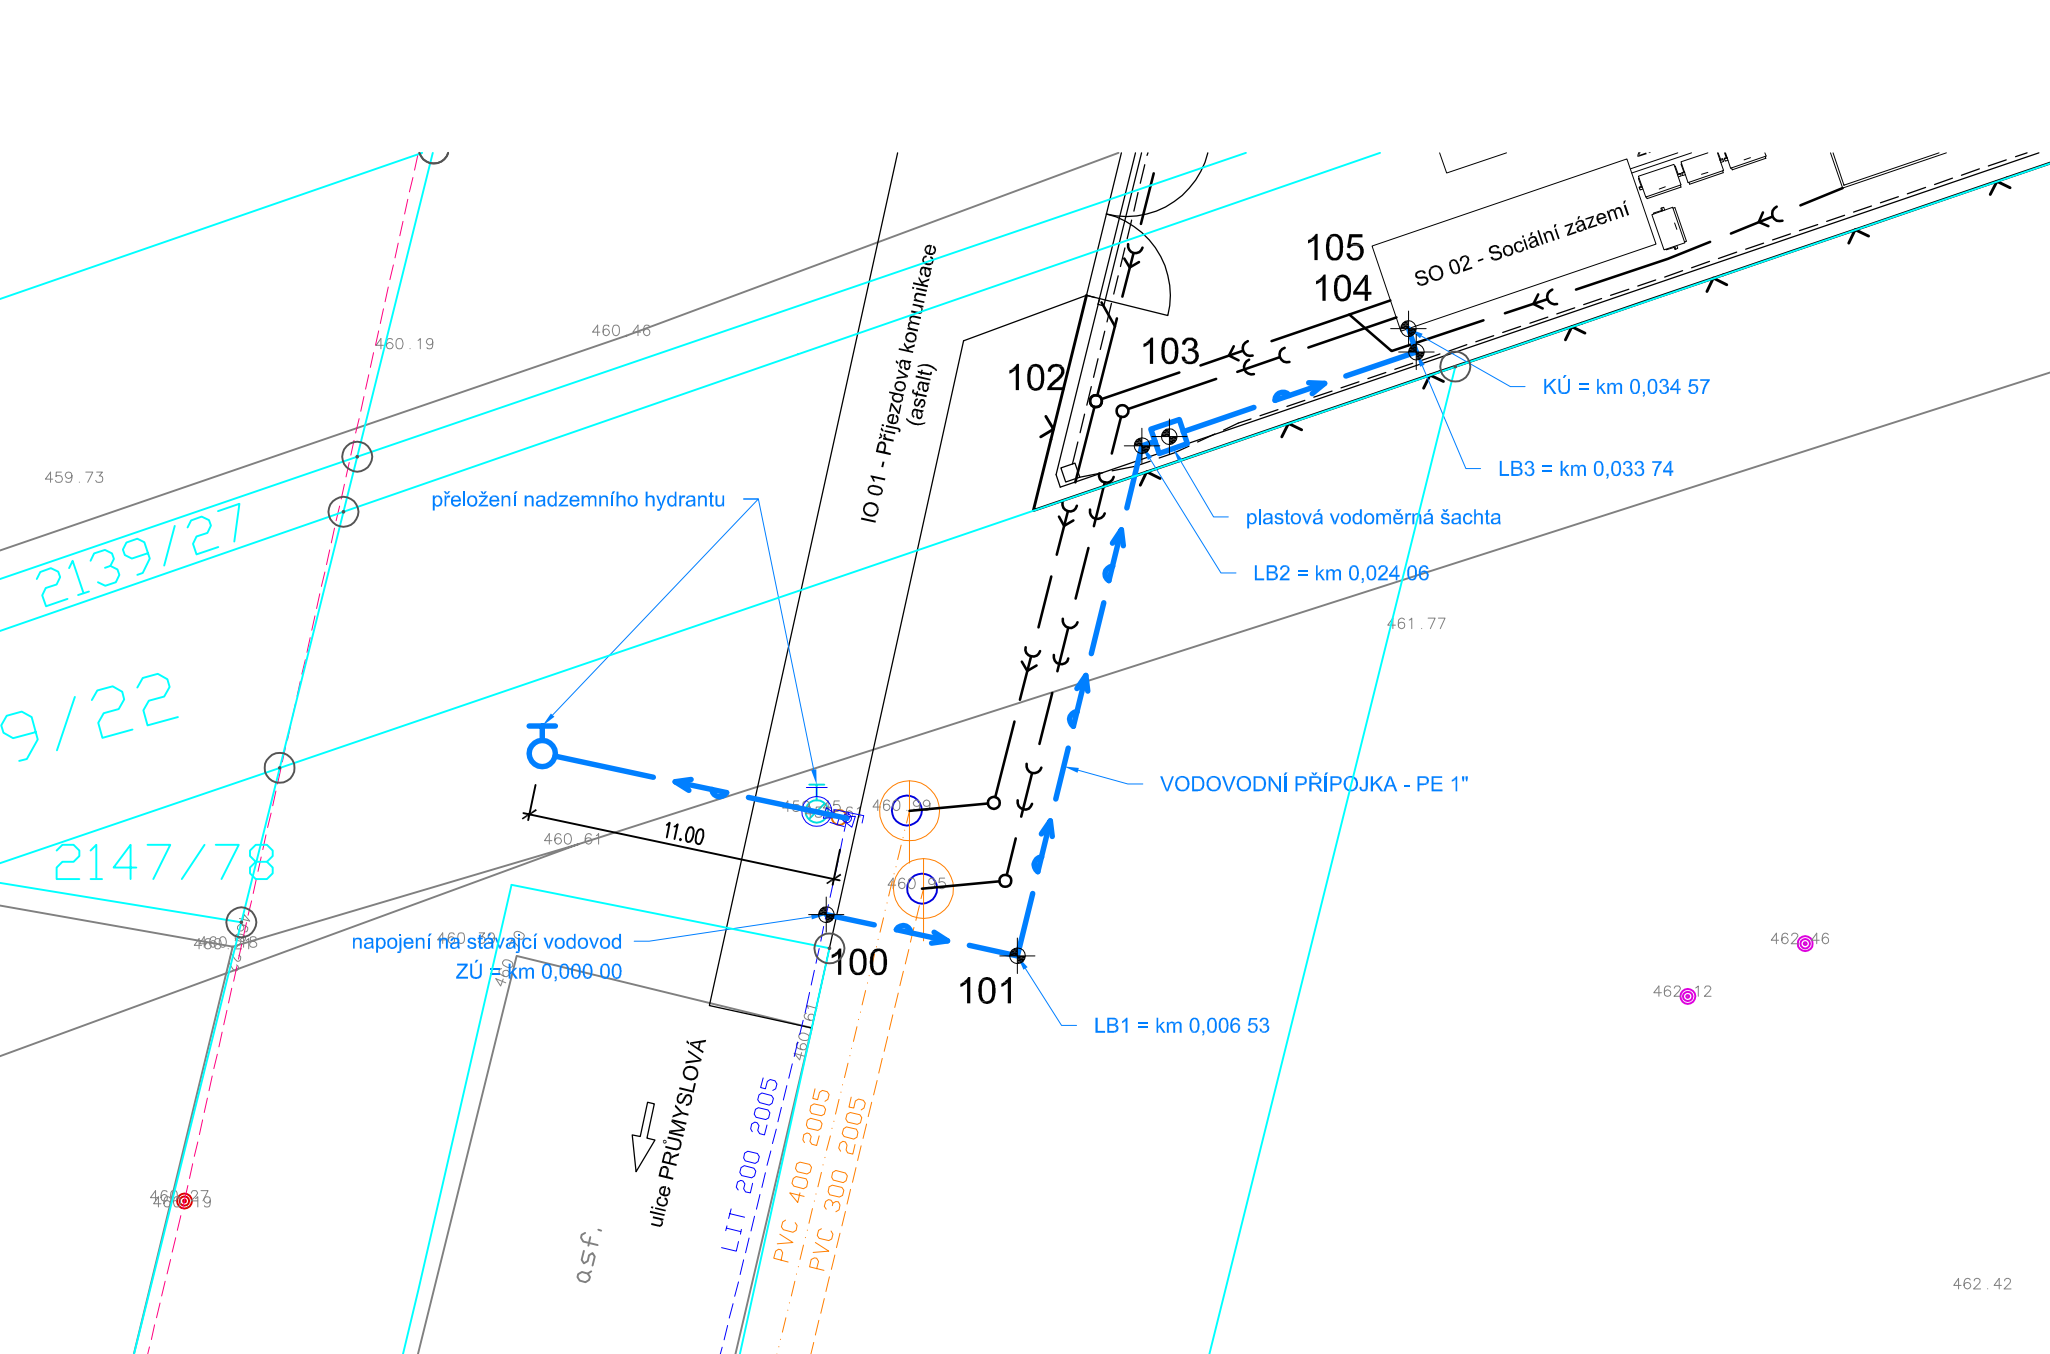

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6b	Kanalizace - výměna šachet VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO99	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014/002	Komunitní kompostárna Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	47 993	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	47 993	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	47 993	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	47 993	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		47 993 Kč
DPH		21,0 %		10 079 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				58 072 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet : 6b
Objekt :	SO99 Změnové listy	Kanalizace - výměna šachet VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 916	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	76	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	129	0	0	0	0
8 Trubní vedení	39 346	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 526	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	47 993	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	47 993	0
Oborová přírážka	0	0,0	47 993	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	47 993	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	47 993	0
Zařízení staveniště	0	0,0	47 993	0
Provoz investora	0	0,0	47 993	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	47 993	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	47 993	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet: 6b
Objekt :	SO99 Změnové listy	Kanalizace - výměna šachet VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,92	157,00	1 714,80
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	10,92	119,00	1 299,75
		Začátek provozního součtu				
		Splašková:2,5*2,5*1,3		8,13		
		-3,14*1,2*1,2/4*1,3		-1,47		
		Rýha dopojení:1*1,5*1,3		1,95		
		Dešťová:2,5*2,5*2		12,50		
		-3,14*1,2*1,2/4*2		-2,26		
		Rýha dopojení:1*1,5*2		3,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		21,84		
		50%:21,8447*0,5		10,92		
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	10,92	9,90	108,13
4	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	10,92	119,00	1 299,75
5	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	10,92	9,90	108,13
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	21,84	27,00	589,80
		10,9223*2		21,84		
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	2,25	27,80	62,55
		lože:0,3		0,30		
		obsyb:1,6556		1,66		
		potrubí:0,106+0,1884		0,29		
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2,25	12,30	27,68
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,59	33,80	662,30
		výkopy:21,8446		21,84		
		lože:-0,3		-0,30		
		obsyb:-1,6556		-1,66		
		potrubí:-0,106-0,1884		-0,29		
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,66	119,00	197,02
		1*1,5*0,6		0,90		
		odpočet potrubí:-3,14*0,3*0,3/4*1,5		-0,11		
		1*1,5*0,7		1,05		
		-3,14*0,4*0,4/4*1,5		-0,19		
11	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	10,75	8,20	88,15
		3,7*2,5+1*1,5		10,75		
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	10,75	7,80	83,85
13	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	10,75	7,10	76,33
14	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	10,75	6,80	73,10
15	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	0,32	90,00	29,03
		10,75*0,03		0,32		
16	58337310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	2,88	172,00	495,48
		1,6556*1,74		2,88		
	Celkem za	1 Zemní práce				6 915,84
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
17	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	3,00	25,30	75,90
		2*1,5		3,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				75,90
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
18	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,30	428,60	128,58
		2*1*1,5*0,1		0,30		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				128,58
Díl: 8		Trubní vedení				

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet: 6b
Objekt :	SO99 Změnové listy	Kanalizace - výměna šachet VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	871373121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 včetně dodávky trub PVC hrdlových 315x7,7x5000	m	1,00	470,80	470,80
20	871393121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 včetně dodávky trub PVC hrdlových 400x9,8x5000	m	1,00	806,70	806,70
21	877373122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus	1,00	99,50	99,50
22	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	1,00	7 282,80	7 282,80
23	894411131R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400	kus	1,00	7 924,80	7 924,80
24	894421111RT1	Demontáž betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	1,00	278,90	278,90
25	894422111RT1	Demontáž betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	2,00	304,20	608,40
26	894423111RT1	Demontáž betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	2,00	1 000,80	2 001,60
27	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	2,00	282,80	565,60
28	899311112R00	Demontáž poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	2,00	205,00	410,00
29	R	Opravný pas nerez DN 315	kus	1,01	3 752,00	3 789,52
30	55243346.A	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	2,00	2 289,80	4 579,60
31	59224025	Dno šachty SU-M 1000x920 BB DN 300	kus	1,00	5 264,20	5 264,20
32	59224030	Dno šachty SU-M 1000x 920 BB DN 400	kus	1,00	5 264,00	5 264,00
Celkem za		8 Trubní vedení				39 346,42
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
33	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	12,72	120,00	1 526,15
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 526,15

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6a	Kanalizace - výměna šachet MP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO99	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014/002	Komunitní kompostárna Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-3 217	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-3 217	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-3 217	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-3 217	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	-3 217 Kč	
DPH		21,0	%	-676 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-3 893 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet : 6a
Objekt :	SO99 Změnové listy	Kanalizace - výměna šachet MP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	-260	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-1 220	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	-643	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-1 060	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-35	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-3 217	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-3 217	0
Oborová přírážka	0	0,0	-3 217	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-3 217	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-3 217	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-3 217	0
Provoz investora	0	0,0	-3 217	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-3 217	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-3 217	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/002 Komunitní kompostárna Svitavy	Rozpočet: 6a
Objekt :	SO99 Změnové listy	Kanalizace - výměna šachet MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	452313151R00	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25 -2*0,05	m3	-0,10 -0,10	2 599,00	-259,90
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-259,90
Díl: 8		Trubní vedení				
2	R	Úprava dna a stěn rychletvrdnoucím betonem úprava -2*1	kus	-2,00 -2,00	610,00	-1 220,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				-1 220,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
3	931991112R00	Těsnění dilatační spáry gumovým pásem, ve stěně -2*0,63	m	-1,26 -1,26	510,00	-642,60
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				-642,60
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	971042231R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 15 cm -2*1	kus	-2,00 -2,00	530,00	-1 060,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-1 060,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-0,29	120,00	-34,73
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-34,73
