

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1060 – Obnova řadu surové vody Římov – Plav II. etapa

Číslo smlouvy objednatele : 1060/21/s0-d2

Číslo smlouvy zhotovitele : 608188

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/155b, Slatina, 627 00 Brno

Spisová značka : B 695 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupený : Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a generální ředitel

Jiří Procházka, MBA, člen představenstva a obchodní ředitel

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Ing. Petr Zach, ředitel Divize - Západ

ve věcech technických : Ing. Milan Pitner, vedoucí realizačního týmu

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu : 1014501513/5500

IČO : 46342796

DIČ : CZ46342796

Číslo telefonu : 296 761 111

Číslo faxu : -

Email : divizecechy@ohla-zs.cz

ID datové schránky : xbicgdt

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice

Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva, na základě

zmocnění představenstvem

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Smluvní strany se ve vztahu k článku III dohodly na změně předmětu díla, tedy o vícepráce či méněpráce, a to v rozsahu změnových listů ZL č.6a, ZL č.6b, ZL č.7, ZL č.8, ZL č.9, ZL č.10, ZL č.11, ZL č.12, ZL č.13, ZL č.14, ZL č.15, ZL č.16, ZL č.17, ZL č.18, ZL č.19, ZL č.20, ZL č.21, ZL č.22 a ZL č.23. Specifikace jednotlivých změn je blíže uvedena v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	194 149 882,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	1 007 170,77 Kč
Cena celkem SOD+Dodatek č.1 bez DPH	195 157 052,77 Kč

Cena ZL č.6a bez DPH	3 023 887,35 Kč
Cena ZL č.6b bez DPH	-2 259 699,23 Kč
Cena ZL č.7 bez DPH	35 032,00 Kč
Cena ZL č.8 bez DPH	130 593,23 Kč
Cena ZL č.9 bez DPH	485 147,45 Kč
Cena ZL č.10 bez DPH	260 778,00 Kč
Cena ZL č.11 bez DPH	206 734,91 Kč
Cena ZL č.12 bez DPH	-8 336 015,15 Kč
Cena ZL č.13 bez DPH	-819 359,43 Kč
Cena ZL č.14 bez DPH	-255 205,73 Kč
Cena ZL č.15 bez DPH	117 864,67 Kč
Cena ZL č.16 bez DPH	5 533,76 Kč
Cena ZL č.17 bez DPH	36 844,25 Kč
Cena ZL č.18 bez DPH	284 148,73 Kč
Cena ZL č.19 bez DPH	156 067,42 Kč
Cena ZL č.20 bez DPH	86 544,00 Kč
Cena ZL č.21 bez DPH	142 000,16 Kč
Cena ZL č.22 bez DPH	94 060,77 Kč
Cena ZL č.23 bez DPH	141 900,00 Kč

Cena ZL celkem bez DPH	- 6 463 142,84 Kč
Cena nová (SOD+Dodatky+ZL) celkem bez DPH	188 693 909, 93 Kč
Cena DPH 21%	39 625 721,09 Kč
Cena včetně DPH	228 319 631,02 Kč

Dodatek č.2 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL č.6a, ZL č.6b, ZL č.7, ZL č.8, ZL č.9, ZL č.10, ZL č.11, ZL č.12, ZL č.13, ZL č.14, ZL č.15, ZL č.16, ZL č.17, ZL č.18, ZL č.19, ZL č.20, ZL č.21, ZL č.22 a ZL č.23

V Brně, dne

V Českých Budějovicích, dne 28-05-2024

Zhotovitel :

Objednatel :



Digitálně podepsal
Ing. Roman Kocůrek
Datum: 2024.05.22
16:54:01 +02'00'

OHLA ŽS, a.s.

Jihočeský vodárenský svaz

Ing. Roman Kocůrek

Antonín Princ

1.místopředseda představenstva

ředitel JVS a předseda představenstva,

a generální ředitel

na základě zmocnění představenstvem



Digitálně podepsal
Jiří Procházka, MBA
Datum: 2024.05.22
13:32:57 +02'00'

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

OHLA ŽS, a.s.

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

Jiří Procházka, MBA

dne 14.5.24

člen představenstva a obchodní ředitel

č. usnesení 330/6

ověřeno

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 6a
Název změnového listu :	Protlak potrubí DN 1200 – změna třídy horniny
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Řimov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina,627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01.2 Řad surové vody

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	Navýšení ceny za provádění protlaku (ražení štoly se zatlačováním ostění z ocelového vodovodního potrubí) dle skutečného zatřídění těžitelnosti hornin. Třídy těžitelnosti hornin byly určeny na základě geologického dohledu a vyjádření geotechnika specialisty (třída těžitelnosti č.5 a č.6).
Cena změny :	3 023 887,35 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	vyjádření geotechnika

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	01.02.2024		125
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 50 Praha 5
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	01.02.2024		
TDS	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště č. Budějovice Knežbuzská 34 370 01 České Budějovice
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	01.02.2024		(2)
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ: 400 11 544 DIČ: CZ400115
JVS	Jaroslav Gazda	01.02.2024		

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

OHLA ŽS, a.s.
Tomáš Beneš – stavbyvedoucí
Divize Západ, Oblast Jihozápad
U Jeslí 494/1
CZ - 370 01 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje / telefon

dne:

Ing. Karlín /602 208 599

06.11.2023

Věc: „Obnova řádu surové vody Římov – Plav III. etapa“
Vyjádření geotechnika II.

Na základě vašeho požadavku na sledování geologického profilu v trase protlaku vodovodu byly ve spolupráci s Vámi prováděny geologický dohled. Práce pokračovaly od 4.10.2023 do 20.10.2023 tj. od m 25,5 do m 39,0. Bylo zdokumentováno 13,5 m provedeného protlaku. V následující tabulce je uvedeno datum, staničení, posun čela za den, hornina, třída těžitelnosti a fotodokumentace čelby.

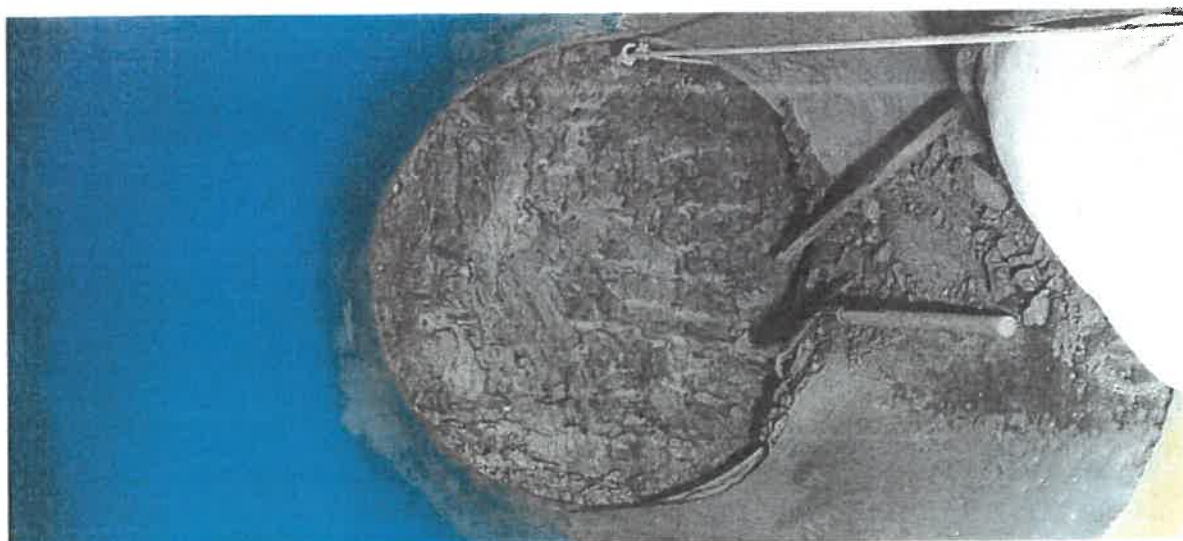
Datum	staničení	Posun čela za sledované období	Čelba - zastižená hornina dle ČSN 736133	Třída těžitelnosti dle neplatné ČSN 733050 (procento plochy čelby)			Číslo fotodokumentace (viz příloha)
				Tř.1-4	Tř.5	Tř.6	
4.10.2023	26,3	0,80	Zvětralá až navětralá rula R3-R4	20	55	25	XI
5.10.2023	28,0	1,70	Zvětralá až navětralá rula R3-R4	20	60	20	XII
12.10.2023	33,5	4,5	Zvětralá až navětralá rula R3-R4	15	65	20	XIII
14.10.2023	35,0	2,50	Slabě zvětralá na bázi navětralá rula R4-R3	15	65	20	XIV
16.10.2023	36,3	1,30	Zvětralá rula R5	45	35	20	XV
18.10.2023	37,0	1,0	Zvětralá rula R5	35	45	20	XVI
19.10.2023	38,0	1,0	Zvětralá rula R5	45	65	20	XVII

V příloze jsou uvedeny jednotlivé fotografie čelby tak jak odpovídají kilometrům protlaku.

Obrázek XIII. – čelba m 33,5



Obrázek XIV. – čelba m 35,0



Obrázek XVI. – čelba m 38,0



14.9.2023	9,0	1,8	Zvětralá rula R4-(R5)	20	65	15	
15.9.2023	12,0	3,0	Zvětralá rula R4-(R5)	20	65	15	VI

V příloze jsou uvedeny jednotlivé fotografie čeleb tak jak odpovídají kilometrāži protlaku.

České Budějovice, dne 19.5.2023

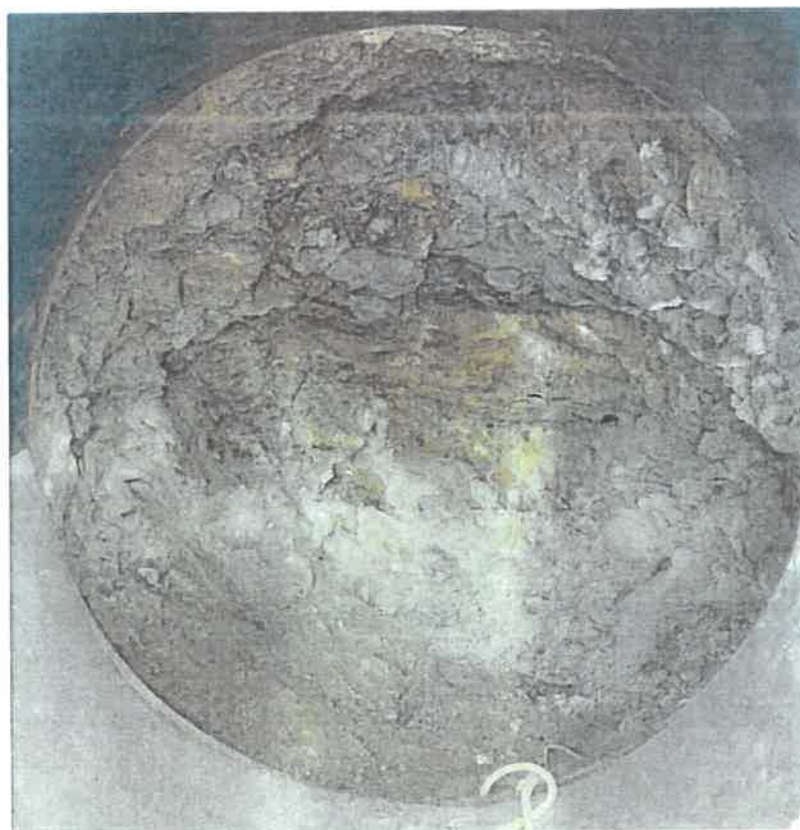
Zpracoval: Ing. Petr Karlín
Geotechnik specialista



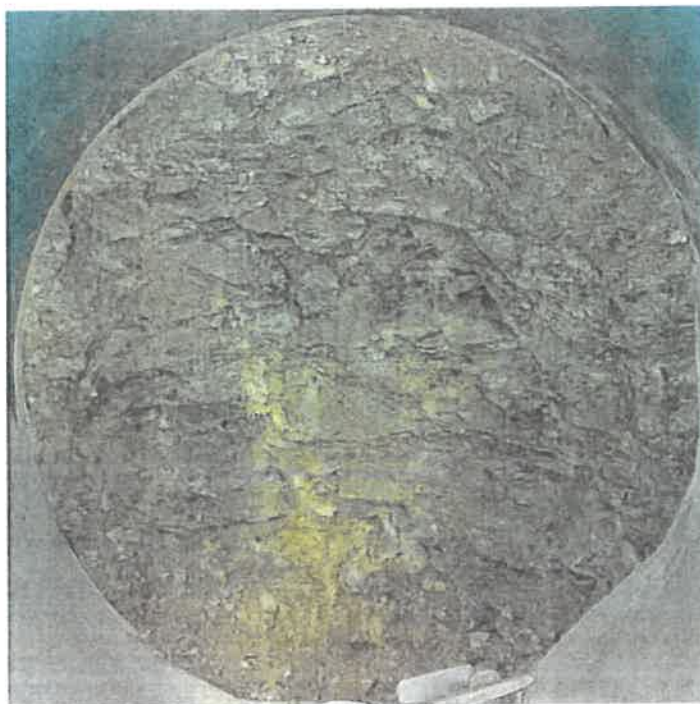
GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431
(11)

Příloha : - fotodokumentace čeleb protlaku dle metrāže

Obrázek I. – čelba m 2,5



Obrázek IV. – čelba m 5,1



Obrázek V. – čelba m 7,2



GeoTec-GS, a.s.

Chmelová 2920/6

106 00 Praha 10

OHLA ŽS, a.s.

Tomáš Beneš – stavbyvedoucí

Divize Západ, Oblast Jihozápad

U Jeslí 494/1

CZ - 370 01 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje / telefon

Ing. Karlín /602 208 599

dne:

20.10.2023

Věc: „Obnova řádu surové vody Římov – Plav II. etapa“

Vyjádření geotechnika II.

Na základě vašeho požadavku na sledování geologického profilu v trase protlaku vodovodu byly ve spolupráci s Vámi prováděn geologický dohled. Práce pokračovaly od 19.9.2023 do 30.9.2023 tj. od m 12,0 do m 25,5. Bylo zdokumentováno 13,5 m provedeného protlaku. V následující tabulce je uvedeno datum, staničení, posun čela za den, hornina, třída těžitelnosti a fotodokumentace čelby.

Datum	staničení	Posun čela za den	Čelba - zastižená hornina dle ČSN 736133	Třída těžitelnosti dle neplatné ČSN 733050 (procento plochy čelby)			Číslo fotodokumentace (viz příloha)
				Tř.1-4	Tř.5	Tř.6	
20.9.2023	13,0	1,0	Zvětralá až navětralá rula R3-R4	15	40	45	
21.9.2023	15,1	2,10	Slabě zvětralá na bázi navětralá rula R4-R3	10	30	60	VII
27.9.2023	19,0	3,9	Silně zvětralá R6-R5	40	40	20	VIII
28.9.2023	20,5	1,5	Slabě zvětralá na bázi navětralá rula R4-R3	10	30	60	IX
30.9.2023	25,5	5,0	Silně zvětralá R6-R5	40	40	20	X

V příloze jsou uvedeny jednotlivé fotografie čelby tak jak odpovídají kilometrům protlaku.

České Budějovice, dne 20.10.2023

Zpracoval: Ing. Petr Karlín
Geotechnik specialista

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431
(11)

tel.: +420/271 750 709 - 11
fax: +420/271 750 113
e-mail: praha@geotec-gs.cz

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:
KB a.s., exp. Zahradní Město
č. účtu: 51-3658250237/0100

Obrázek IX. – čelba m 20,5



Obrázek X. – čelba m 25,5



České Budějovice, dne 24.11.2023

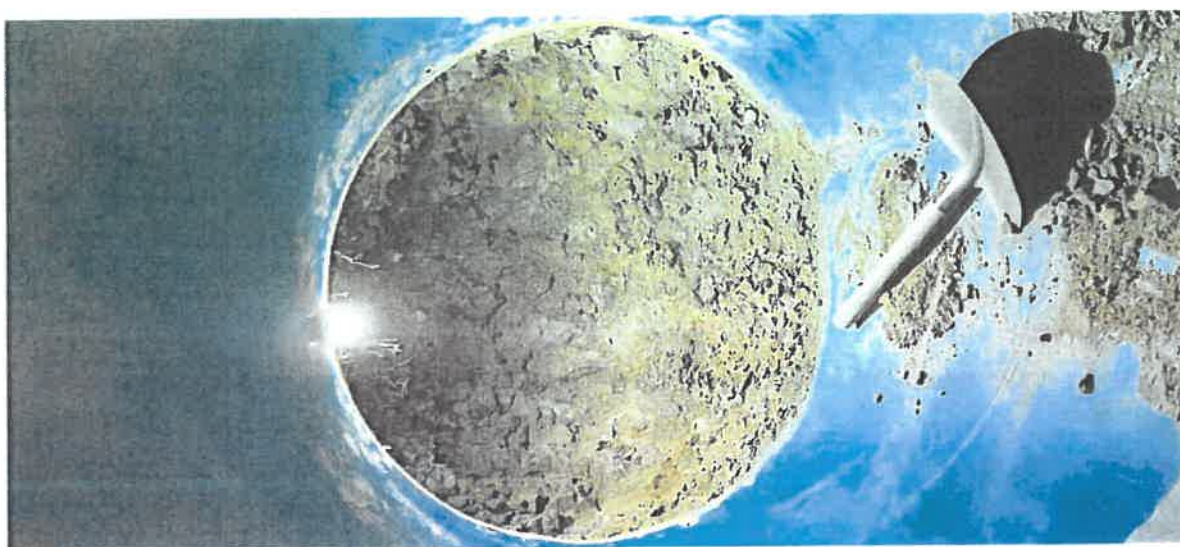
Zpracoval: Ing. Petr Karlín
Geotechnik specialista



GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431
(II)

Příloha : - fotodokumentace čeleb protlaku dle metráže

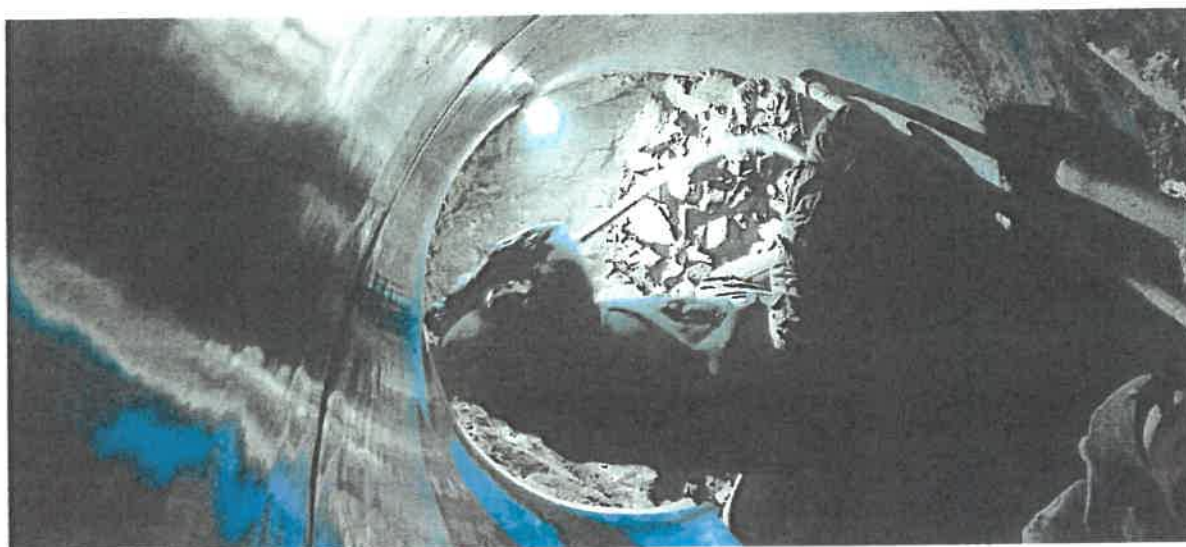
Obrázek IXX. – čelba m 39,8



Obrázek XX. – čelba m 41,0



Obrázek XXIII. – čelba m 49,0



Obrázek XXIV. – čelba m 49,7



PŘÍLOHA č. 3

Stavba : Obnova řadu surové vody Římov - Plav II. etapa

Množství a rozdělení třídy hornin v trase protlaku dle vyjádření geotechnika

Datum	Staničení	Posun čela	Třída těžitelnosti					
			Tř. 1-4		Tř. 5		Tř. 6	
			%	m'	%	m'	%	m'
23.08.2023	0,6	0,6	100	0,6	0	0	0	0
24.08.2023	1,2	0,6	95	0,57	5	0,03	0	0
25.08.2023	1,8	0,6	90	0,54	10	0,06	0	0
26.08.2023	2,5	0,7	10	0,07	30	0,21	60	0,42
05.09.2023	3	0,5	5	0,025	25	0,125	70	0,35
06.09.2023	4	1	5	0,05	45	0,45	50	0,5
07.09.2023	5,1	1,1	10	0,11	55	0,605	35	0,385
12.09.2023	6,1	1	15	0,15	55	0,55	30	0,3
13.09.2023	7,2	1,1	15	0,165	60	0,66	25	0,275
14.09.2023	9	1,8	20	0,36	65	1,17	15	0,27
15.09.2023	12	3	20	0,6	65	1,95	15	0,45
20.09.2023	13	1	15	0,15	40	0,4	45	0,45
21.09.2023	15,1	2,1	10	0,21	30	0,63	60	1,26
27.09.2023	19	3,9	40	1,56	40	1,56	20	0,78
28.09.2023	20,5	1,5	10	0,15	30	0,45	60	0,9
30.09.2023	25,5	5	40	2	40	2	20	1
04.10.2023	26,3	0,8	20	0,16	55	0,44	25	0,2
05.10.2023	28	1,7	20	0,34	60	1,02	20	0,34
12.10.2023	33,5	5,5	15	0,825	65	3,575	20	1,1
14.10.2023	35	1,5	15	0,225	65	0,975	20	0,3
16.10.2023	36,3	1,3	45	0,585	35	0,455	20	0,26
18.10.2023	37	0,7	35	0,245	45	0,315	20	0,14
19.10.2023	38	1	45	0,45	35	0,35	20	0,2
24.10.2023	39,8	1,8	40	0,72	55	0,99	5	0,09
27.10.2023	41	1,2	30	0,36	60	0,72	10	0,12
29.10.2023	43,8	2,8	20	0,56	55	1,54	25	0,7
05.11.2023	49	5,2	20	1,04	60	3,12	20	1,04
06.11.2023	49,7	0,7	20	0,14	65	0,455	15	0,105
08.11.2023	52	2,3	15	0,345	70	1,61	15	0,345
		52		13,305		26,415		12,28

52

25,59%

50,80%

23,62%

jen s obkladní obezdívkou minimální tloušťky (postříky). Těžitelnost je velmi nesnadná, postup vrtání velmi pomalý s nadměrným tvořením prachu. Stupeň ražnosti hornin se posuzuje podle celkových vlastností horniny a zvláště podle její těžitelnosti a možnosti vzniku a zvětšování tlaků, nikoliv podle petrografického označení horniny.



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1060 - Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa

ZMĚNOVÝ LIST č.6a - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: SO 01.2 – řad surové vody

Datum převzetí: 08. 01. 2024
02. 04. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Protlak potrubí DN 1200 – změna třídy horniny.

Zdůvodnění změny:

Navýšení cena za provádění protlaku (ražení štol se zatlačováním ostění z ocelového vodovodního potrubí) dle skutečného zatřídění těžitelnosti hornin. Třídy těžitelnosti hornin byly určeny na základě geologického dohledu a vyjádření geotechnika specialisty (třída těžitelnosti č.5 a č.6).

Požadavek zhotovitele: původní + 3.023.887,35 Kč (bez DPH)
 po připomínkování + 3.023.887,35 Kč (bez DPH)

Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceny z ceníku URS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 3.023.887,35 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot


VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Křižská 354/34 (2)
20 01 Č. Budějovice
podpis

AD: Ing. David Brábník


VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
podpis

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0461 (608188).. Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II.etapa - dodatek č.2
Objekt: 06a SO 01.2 - Řad surové vody
Rozpočet: 06a ZMĚNOVÝ LIST Č.6a Protlak - změna třídy těžitelnosti hornin

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 023 887,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 023 887,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 023 887,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **3 023 887,35 CZK**

v 03.

dne


OHLA ŽS, a.s.
 Tuřanka 1554/115b
 370 01 Č. Budějovice
 IČ: 463 42 796
 DIČ: CZ46342796

125

Za zhotovitele


**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Příkopářská 354/34
 370 01 Č. Budějovice (2)

Za objednatele



ZMĚNOVÝ LIST Č.6a Protlak - změna třídy těžitelnosti hornin

Stavba:

Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa

Objekt:

SO 01.2 - Řad surové vody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 023 887,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 023 887,35	
D	1		Zemní práce				3 023 887,35	
K		143104117.1	Razení štol se zatlačováním oslění z ocelových trub délky štoly do 100 m v hornině I. stupně ražnosti, při průměru průřezu TV přes 1220 do 1420 mm, třída těžitelnosti 5	m	29,057	69 900,00	2 031 049,35	CS ÚRS 2021 02
VV					29,057			
K		143104117.2	Razení štol se zatlačováním oslění z ocelových trub délky štoly do 100 m v hornině I. stupně ražnosti, při průměru průřezu TV přes 1220 do 1420 mm, třída těžitelnosti 6	m	13,508	73 500,00	992 838,00	CS ÚRS 2021 02
VV					13,508			

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 6b
Název změnového listu :	Protlak – změna třídy těžitelnosti hornin
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/2/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01.2

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Odečet ceny za provádění protlaku (ražení štoly se zatlačováním ostění z ocelového vodovodního potrubí) (dle zatřídění těžitelnosti horniny dle projektové dokumentace (hornina I. stupně).
Cena změny :	- 2.259.699,23 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	vyjádření geotechnika

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b ČZ - 627 00 Brno IČ: 465 42 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	01.02.2024		
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 00 Praha 5
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	01.02.2024		
TDS	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Provoziště Č. Budějovice Změnový list 1060/2/s0 (2)
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	01.02.2024		
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ: 370 01 370 01
JVS	Jaroslav Gazda	01.02.2024		



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1060 - Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa

ZMĚNOVÝ LIST č.6b - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: SO 01.2 – Řad surové vody

Datum převzetí: 08. 01. 2024
02. 04. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Protlak – změna třídy těžitelnosti hornin

Zdůvodnění změny:

Odečet ceny za provádění protlaku (ražení štoly se zatlačováním ostění z ocelového vodovodního potrubí, dle zatřídění těžitelnosti horniny dle projektové dokumentace (hornina I.stupně)).

Požadavek zhotovitele: původní - 2.259.699,23 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 2.259.699,23 Kč (bez DPH)

Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity jednotkové ceny položek z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 2.259.699,23 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list nebude fakturován, ale pouze odečten z celkové ceny díla a v SPP ze sloupce zbývá.

TDS: Ing. Petr Jerhot

podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Knežská 354/34 (2)
340 01 Č. Budějovice

AD: Ing. David Brábínek

podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0461 (608188).. **Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II.etapa - dodatek č.2**
Objekt: 06b **SO 01.2 - Řad surové vody**
Rozpočet: 6b **ZMĚNOVÝ LIST Č.6b Protlak - změna třídy těžitelnosti hornin**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-2 259 699,23
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 259 699,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 259 699,23 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-2 259 699,23 CZK**

v Č.B. dne _____



OHLA ŽS, a.s.
 Tuřanka 1554/115b
 IČ: 463 42 796
 DIČ: CZ46342796

Za zhotovitele

VIRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Křižácká 354/34 (2)
 370 01 Č. Budějovice

Za objednatele



ZMĚNOVÝ LIST Č.6b Protlak - změna třídy těžitelnosti hornin

Stavba:

Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa

Objekt:

SO 01.2 - Řad surové vody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 259 699,23	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 259 699,23	
D	1		Zemní práce				-2 259 699,23	
K		143104117	Ražení štol se zatlačováním ostění z ocelových trub délky štol do 100 m v hornině I. stupně ražnosti, při průměru průřezu TV přes 1220 do 1420 mm	m	-42,565	53 088,20	-2 259 699,23	CS ÚRS 2021 02
odpočet protlaku v třídě těžitelnosti 5 a 6 :-(26,415+12,28)*1,1					-42,565			

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 7
Název změnového listu :	Krokování servopohonů klapek
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 01.2 Strojní technologie

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o naprogramování uzavírání klapky DN 1000 mm v portále P2 a klapky DN 800 mm v MVE ÚV Plav. Dále se jedná o doplnění uzávěru s odvzdušněním a manometru na propojovacím potrubím mezi stávajícím vodovodem DN 1400 mm a novým vodovodem DN 1200 mm nad rámec PD.
Cena změny :	35 032,00 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	02.04.2024		
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží ul. č. 4 150 00 Praha 5
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	02.04.2024		
TDS	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště Č. Budějovice Průmyslová 354/34 370 01 České Budějovice
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	02.04.2024		
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	JVS Pracoviště Č. Budějovice Průmyslová 354/34 370 01 České Budějovice
JVS	Jaroslav Gazda	02.04.2024		

ZMĚNOVÝ LIST č.7 - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: PS 01.2 - Strojně-technologická část

Datum převzetí: 19. 03. 2024
02. 04. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Krokování servopohonů klappek.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o naprogramování uzavírání klapky DN1000 v portále P2 a klapky DN 800 v MVE na ÚV plav. Dále se jedná o doplnění uzávěru s odvzdušněním a manometru na propojovacím potrubí mezi stávajícím vodovodem DN 1400 mm a novým vodovodem DN 1200 mm nad rámec DPS – přípočet.

Požadavek zhotovitele:	původní	+ 35.032,00 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	+ 35.032,00 Kč (bez DPH)

Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceny z cenové kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 35.032,00 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot


.....
podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kvěžská 354/34 (2)
370 01 Č. Budějovice

AD: Ing. David Brábník


.....
podpis



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0461 (608188).. **Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II.etapa - dodatek č.2**
Objekt: 07 **PS 01.2 Strojní technologie**
Rozpočet: 0701 **ZMĚNOVÝ LIST č.7 Krokování servopohonů klapek**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			35 032,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 032,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 032,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **35 032,00 CZK**

v 03. _____ dne _____

OHLA ŽS, a.s.
 Tuřanka 1554/115b
 CZ - 627 00 Brno
 IČ: 463 42 796
 Za zhotovitele

125


**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Příkopářské Č. Budějovice
 Příkopářská 354/34
 220 01 Budějovice (2)

 Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST č.7 Krokování servopohonů klapek

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:

PS 01.2 Strojní technologie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 032,00	
D	M	M					35 032,00	
D	350		Strojní technologie				35 032,00	
1	K	1.1.01 M4	Dodávka a montáž uzavírací klapka DN1000, PN10, elektropohon	soubor	1,000	16 162,00	16 162,00	CS ÚRS 2023 02
P			Krokování servopohonů klapek na DN 1000 - portál P2					
2	K	1.1.02	Dodávka a montáž uzavírací klapka DN800, PN10	soubor	1,000	12 930,00	12 930,00	CS ÚRS 2023 02
P			Krokování servopohonů klapek na DN 800 ÚV Plav					
20a	K		Doplnění manometru, uzavěru DN50	soubor	1,000	5 940,00	5 940,00	CS ÚRS 2023 02
P			Úprava zaústění bakteriologie					

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 8
Název změnového listu :	Doplnění obrubníků v areálu Domova pro seniory
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01.2 Řad surové vody

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Zpětně prováděné chodníky v areálu Domova pro seniory, které byly odstraněny při výkopových pracích, byly doplněny nad rámec PD, chodníkovými obrubami .
Cena změny :	130 593,23 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS,a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	02.04.2024		125
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží ul. č. 4 150 00 Praha 5
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	02.04.2024		
TDS	Jméno	Datum	Podpis	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží ul. č. 4 150 00 Praha 5
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	02.04.2024		
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 292/19 370 01 České Budějovice
JVS	Jaroslav Gazda	02.04.2024		

ZMĚNOVÝ LIST č.8 - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: SO 01.2 – Řad surové vody

Datum převzetí: 06. 03. 2024
02. 04. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Krokování servopohonů klappek.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o zpětně prováděné chodníky v areálu Domova pro seniory, které byly odstraněny při výkopových pracích, byly doplněny, nad rámec DPS, chodníkovými obrubami – přípočet.

Požadavek zhotovitele:	původní	+ 144.522,83 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	+ 130.593,23 Kč (bez DPH)

Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceny z SOD a ceníku URS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 130.593,23 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot


VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Knežská 354/34 (2)
370 01 Č. Budějovice
.....
podpis

AD: Ing. David Brábínek


VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
.....
podpis
-14-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0461 (608188).. **Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II.etapa - dodatek č.2**
Objekt: 08 **SO 01.2 - Řad surové vody**
Rozpočet: 0801 **ZMĚNOVÝ LIST č.8 Doplnění obrubníků v areálu Domova pro seniory**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			130 593,23
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			130 593,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 593,23 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **130 593,23 CZK**

v Č.B. dne



OHLA ŽS, a.s.
 Tuřanka 1554/115b
 370 02 Písek
 IČ: 463 42 796
 DIČ: CZ46342796

Za zhotovitele



VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Prácheňská č. Budějovice
 Křižská 354/34 (2)
 350 01 Č. Budějovice

Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST č.8 Doplnění obrubníků v areálu Domova pro seniory

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:

SO 01.2 - Řad surové vody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							130 593,23	
D HSV Práce a dodávky HSV							130 593,23	
D 5 Komunikace							92 277,14	
21a	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	197,700	62,82	12 419,51	CS ÚRS 2023 02
22a	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	197,700	261,90	51 777,63	CS ÚRS 2023 02
23a	M	59217016	Obrubník parkový BEST LINEA II v. 250 x 80 x 1000 mm přírodní	kus	208,000	135,00	28 080,00	CS ÚRS 2023 02
D 998 Přesun hmot							18 292,91	
142	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	41,021	238,98	9 803,20	CS ÚRS 2021 02
143	K	998272224	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	41,021	206,96	8 489,71	CS ÚRS 2021 02
D 997 Přesun sutě							20 023,18	
136	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	40,529	39,87	1 615,89	CS ÚRS 2021 02
137	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	567,369	4,52	2 564,51	CS ÚRS 2021 02
138	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	40,529	201,14	8 152,00	CS ÚRS 2021 02
140	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,529	189,76	7 690,78	CS ÚRS 2021 02

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 9
Název změnového listu :	Příjezdová cesta k portálu P2
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01.2

ZMĚNA

Typ změny :	Řad surové vody
Popis změny :	Při výstavbě přivaděče DN 1200 byla odstraněna část příjezdové komunikace. Následně byla tato příjezdová komunikace znovu vybudována.
Cena změny :	485 147,45 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	02.04.2024		125
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 00 Praha 5 IČ: 252 20 123
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	02.04.2024		
TDS	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště: Č. Budějovice Inženýrská 354/34 370 01 Č. Budějovice
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	02.04.2024		
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	
JVS	Jaroslav Gazda	02.04.2024		

	TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	
1060 - Obnova řadu surové vody Řimov – Plav, II. etapa		

ZMĚNOVÝ LIST č.9 - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: SO 01.2 – Řad surové vody

Datum převzetí: 06. 03. 2024
02. 04. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Příjezdová cesta k portálu P2.

Zdůvodnění změny:

Při výstavbě přivaděče DN 1200 musela být odstraněna část příjezdové komunikace. Následně byla tato příjezdová komunikace znovu vybudována - přípočet.

Požadavek zhotovitele:	původní	+ 524.877,37 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	+ 485.147,45 Kč (bez DPH)

Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceny z SOD a ceníku URS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 485.147,45 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Průmyslová č. Budějovice
 Knežská 354/34 (2)
 370 01 Č. Budějovice

 podpis

AD: Ing. David Brábínek


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Nábřeží 4
 150 56 Praha 5

 podpis
 -14-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0461 (608188).. **Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa - dodatek č.2**
Objekt: 09 **SO 01.2 - Řad surové vody**
Rozpočet: 0901 **ZMĚNOVÝ LIST č.9 Příjezdová cesta k portálu P2**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			485 147,45
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			485 147,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	485 147,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **485 147,45 CZK**

v

C.B.

dne



OHLA ŽS, a.s.
 Tuřanka 1554/115b
 57 - 627 00 Březno
 IČ: 463 42 796
 DIČ: CZ46342796

125

Za zhotovitele



VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Průmyslové Č. Budějovice
 Křižácká 354/34
 370 01 Č. Budějovice (2)

Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST č.9 Příjezdová cesta k portálu P2

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:

SO 01.2 - Řad surové vody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							485 147,45	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				485 147,45	
D		1	Zemní práce				165 875,85	
24a	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	156,000	307,80	48 016,80	CS ÚRS 2023 02
2b	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. přes 100 do 200 mm	m2	156,000	32,72	5 104,32	CS ÚRS 2021 01
25a	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého strojně	m3	15,000	4 275,00	64 125,00	CS ÚRS 2023 02
48	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	226,800	18,81	4 266,11	CS ÚRS 2021 02
49	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	151,200	22,09	3 340,01	CS ÚRS 2021 02
58	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	113,400	41,06	4 656,20	CS ÚRS 2021 02
59	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	75,600	54,81	4 143,64	CS ÚRS 2021 02
61	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	189,000	16,93	3 199,77	CS ÚRS 2021 02
15b	K	171151103R	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	189,000	71,16	13 449,24	CS ÚRS 2021 02
47b	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	156,000	19,71	3 074,76	CS ÚRS 2021 02
26a	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
D		5	Komunikace				222 045,48	
21b	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	156,000	246,48	38 450,88	
27a	K	581131211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm	m2	156,000	1 053,00	164 268,00	CS ÚRS 2023 02
28a	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	48,000	180,00	8 640,00	CS ÚRS 2023 02
29a	K	919731114	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl přes 150 do 250 mm	m	6,000	214,20	1 285,20	CS ÚRS 2023 02
30a	K	919111112	Rezáni dilatačních spár š 4 mm hl přes 60 do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	42,000	128,70	5 405,40	CS ÚRS 2023 02
31a	K	977311114	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	10,000	399,60	3 996,00	CS ÚRS 2023 02
	D	998	Přesun hmot				35 748,30	
142	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, šyby, produktovody v otepleném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	149,587	238,98	35 748,30	CS ÚRS 2021 02
D		997	Přesun sutě				61 477,82	
19b	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	180,594	101,82	18 388,08	CS ÚRS 2021 02
20b	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 528,318	4,45	11 251,02	CS ÚRS 2021 02
32a	K	919731114-R	Drcení stavebního odpadu z betonu prostého - recyklace	t	180,594	176,30	31 838,72	CS ÚRS 2021 02

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 10
Název změnového listu :	Chráničky v šachtách 7B a 8B
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01.2.2; SO 01.2.4

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Doplnění průchodu potrubí DN 1200 stěnami vzdušnickových šachet o ocelové chráničky a koncové uzavírací manžety.
Cena změny :	260 778,00 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	02.04.2024		
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží ul. č. 4 150 00 Praha 5
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	02.04.2024		
TDS	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště č. Budějovice Konečná 354/34 370 01 Budějovice (2)
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	02.04.2024		
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	JVS Jaroslav Gazda 02.04.2024
JVS	Jaroslav Gazda	02.04.2024		



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1060 - Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa

ZMĚNOVÝ LIST č.10 - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: SO 01.2.2 Vzdušníková šachta 7B
SO 01.2.4 Vzdušníková šachta 8B

Datum převzetí: 28. 02. 2024
02. 04. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Průchod potrubí DN 1200 šachtami.

Zdůvodnění změny:

Doplnění průchodu potrubí DN 1200 stěnami vzdušníkových šachet o ocelové chráničky a koncové uzavírací manžety - přípočet.

Požadavek zhotovitele: původní + 383.059,50 Kč (bez DPH)
po připomínkování + 260.778,00 Kč (bez DPH)

Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceny z ceníku URS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 260.778,00 Kč (bez DPH)


Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot


.....
podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Křižská 354/34 (2)
370 01 Č. Budějovice

AD: Ing. David Brábínek


.....
podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-14-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0461 (608188).. **Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II.etapa - dodatek č.2**
Objekt: 10 **SO 01.2.2 Vzdušníková šachta 7B - II. Etapa; SO 01.2.4 Vzdušníková šachta 8B - II. Etapa**
Rozpočet: 1001 **ZMĚNOVÝ LIST č.10 Chráničky v šachtách 7B a 8B**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			260 778,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			260 778,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	260 778,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **260 778,00 CZK**

v *č.č.* dne



ŽS
OHLA
OHLA ŽS, a.s.
 Tuřanka 155/III 120
 422 027 00 Brno
 IČ: 463 42 796
 DIČ: CZ46342796

Za zhotovitele



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Křižoviště Č. Budějovice
 Křižoviště 354/34
 379 01 Č. Budějovice (2)

Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST č.10 Chráničky v šachtách 7B a 8B

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:

SO 01.2.2 Vzdušnicková šachta 7B - II. Etapa; SO 01.2.4 Vzdušnicková šachta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							260 778,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				260 778,00	
D	8		Trubní vedení				260 778,00	
33a	K	899914110.R2	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu včetně dodávky pro potrubí DN 1200	soubor	4,000	35 750,00	143 000,00	CS ÚRS 2023 02
	W		SO 01.2.2		2			
	W		SO 01.2.4		2			
	W		1 - potrubí					
34a	K	899913160.R2	Koncové uzavírací manžety chrániček DN 1200 vč kluzných objímek	soubor	4,000	29 444,50	117 778,00	
	W		SO 01.2.2		2			
	W		SO 01.2.4		2			

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZZV)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 11
Název změnového listu :	Startovací jáma protlaku
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01.2 Řad surové vody

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Byla provedena úprava dna startovací jámy z důvodu změny zařídění horniny v raženém úseku. Dále byla provedena dodatečná ochrana svaru potrubí z důvodu dělení potrubí dl.12 m na 6-ti metrovou délku.
Cena změny :	206 734,91 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 44 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	02.04.2024		125
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	02.04.2024		VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 00 Praha 5
TDS	Jméno	Datum	Podpis	
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	02.04.2024		VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Provoziště Č. Budějovice Královská 354/34 (2)
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	
JVS	Jaroslav Gazda	02.04.2024		JVS IČ: 252 22 117



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1060 - Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa

ZMĚNOVÝ LIST č.11 - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: SO 01.2 – Řad surové vody

Datum převzetí: 21. 03. 2024
02. 04. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Startovací jáma protlaku.

Zdůvodnění změny:

Byla provedena úprava dna startovací jámy protlaku z důvodu změny zařazení horniny v raženém úseku. Dále byla provedena dodatečná ochrana svaru potrubí z důvodu dělení potrubí dl. 12,0 m na 6-ti metrovou.

Požadavek zhotovitele: původní + 206.734,91 Kč (bez DPH)
po připomínkování + 206.734,91 Kč (bez DPH)

Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceny cenové nabídky SOD a z ceníku URS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 206.734,91 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Praha, Pště Č. Budějovice
Křižská 354/34 (2)
370 01 Č. Budějovice

AD: Ing. David Brábník



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-14-

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	0461 (608188)..	Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II.etapa - dodatek č.2
Objekt:	11	SO 01.2 Řad surové vody
Rozpočet:	1101	ZMĚNOVÝ LIST č.11 Startovací jáma protlaku

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			206 734,91
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			206 734,91

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	206 734,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **206 734,91 CZK**

v Č.B. dne



OHLA ŽS, a.s.

Tufanka 1554/115b

ČZ 627 00 Brno

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

125

Za zhotovitele



VÝSTAVBA A VÝSTAVBA a.s.

Prostředí Č. Budějovice

ČZská 354/34 (2)

370 01 Č. Budějovice

Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST č.11 Startovací jáma protlaku

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:

SO 01.2 Řad surové vody

01.1.1.b

01.1.1.a

01.1.1.a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							206 734,91	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				206 734,91	
D	2		Zakládání				13 283,11	
2b	K	278381531	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 16/20, složitosti I	m3	2,805	4 735,51	13 283,11	CS ÚRS 2021 02
D	5		Komunikace				48 056,80	
22b	K	584121108	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivé do 15 m2	m2	55,775	370,25	20 650,69	CS ÚRS 2021 02
VV			úsek 3.2 - jáma protlaku - panelová plocha: 11,50*4,85		55,775			
23b	M	59381003	panel silniční 3,00x1,50x0,15m	kus	4,090	6 700,76	27 406,11	CS ÚRS 2021 02
D	8		Trubní vedení				145 395,00	
35a	K	997002511	Odstranění izolace PE, zčištění vnitřní výstelky PUR, řezání OC, zčištění konců pro V svar	kus	4,000	29 279,00	117 116,00	
			změna délky potrubí do protlaku z 13 m na 6,5 m					
166	K	230210_R01	Dodatečně provedena vnitřní a vnější ochrana potrubí DN1200 v místě svaru	kus	4,000	7 069,75	28 279,00	CS ÚRS 2021 02

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 12
Název změnového listu :	Velkoprofilové vrty pro pažení
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01.2 Řad surové vody

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Velkoprofilové vrty nebyly provedeny, protože v navrhovaném úseku nebyla zjištěna hornina tř.V. Proto beranění štětovnic bylo prováděno přímo do horniny.
Cena změny :	- 8 336 015,15 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b ČZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	02.04.2024		125
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 00 Praha 5
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	02.04.2024		
TDS	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Praha, Měst. Č. Budějovice Křižovská 354/34 370 01 Č. Budějovice (2)
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	02.04.2024		
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	JVS Jaroslav Gazda
JVS	Jaroslav Gazda	02.04.2024		



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1060 - Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa

ZMĚNOVÝ LIST č.12 - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: SO 01.2 – Řad surové vody

Datum převzetí: 20. 03. 2024
02. 04. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Velkoprofilové vrty pro pažení.

Zdůvodnění změny:

Velkoprofilové vrty nebyly provedeny, protože v navrhovaném úseku nebyla zjištěna hornina tř. V. Proto bylo beranění štětovnic prováděno přímo do horniny – odečet.

Požadavek zhotovitele: původní - 8.336.015,15 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 8.336.015,15 Kč (bez DPH)

Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity jednotkové ceny položek z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 8.336.015,15 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list nebude fakturován, ale pouze odečten z celkové ceny díla a v SPP ze sloupce zbývá.

TDS: Ing. Petr Jerhot

podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Křižská 354/34
370 01 Č. Budějovice (2)

AD: Ing. David Brábník

podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-14-

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	0461 (608188)..	Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa - dodatek č.2
Objekt:	12	SO 01.2 - Řad surové vody
Rozpočet:	1201	ZMĚNOVÝ LIST č.12 Velkoprofilové vrty pro pažení

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-8 336 015,15
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-8 336 015,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 336 015,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	-8 336 015,15 CZK
----------------------------	--------------------------

v

ČB

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

VIRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Hrástská 354/34 (2)
350 01 Č. Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.12 Velkoprofilové vrty pro pažení

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:

SO 01.2 - Řad surové vody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-8 336 015,15	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-8 336 015,15	
D	1		Zemní práce				-8 336 015,15	
74	K	226112415	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 650 do 850 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. V	m	-3 253,333	2 562,30	-8 336 015,15	CS ÚRS 2020 02

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 13
Název změnového listu :	Zemní práce
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01.2 Řad surové vody

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Po zaměření výkopu trasy potrubí geodetem, byla odečtena kubatura výkopů, která nedosáhla kubatury výkopů dle projektové dokumentace.
Cena změny :	- 819 359,43 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	02.04.2024		125
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 00 Praha 5
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	02.04.2024		
TDS	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště Č. Budějovice Nábřežní 354/34 370 01 Č. Budějovice (2)
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	02.04.2024		
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	
JVS	Jaroslav Gazda	02.04.2024		



Položkový rozpočet stavby					
Stavba:	0461 (608188)..	Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II.etapa - dodatek č.2			
Objekt:	13	SO 01.2 - Řad surové vody			
Rozpočet:	1301	ZMĚNOVÝ LIST č.13 Zemní práce			
Objednatel:				IČO:	
				DIČ:	
Zhotovitel:				IČO:	
				DIČ:	
Vypracoval:					
Rozpis ceny					Celkem
HSV				-819 359,43	
PSV				0,00	
MON				0,00	
Vedlejší náklady				0,00	
Ostatní náklady				0,00	
Celkem				-819 359,43	
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH	12 %			0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %			-819 359,43 CZK	
Zaokrouhlení				0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH				-819 359,43 CZK	
v <u> C.B. </u> dne <u> </u> OHLA ŽS, a.s. Za zhotovitele IČO: 1554/115b CZ - 627 00 Brno VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Praha 10 - Č. Budějovice Kněžská 354/34 370 01 Č. Budějovice (2) <u> </u> Za objednatele					

ZMĚNOVÝ LIST č.13 Zemní práce

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:

SO 01.2 Řad surové vody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-819 359,43	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-819 359,43	
D	1	Zemní práce					-819 359,43	
15	K	123152107	Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 5 000 m3	m3	-729,408	57,01	-41 583,52	CS ÚRS 2021 02
16	K	123252107	Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	-925,719	75,09	-69 512,22	CS ÚRS 2021 02
17	K	123352107	Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	-397,958	129,24	-51 432,04	CS ÚRS 2021 02
18	K	123452107	Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	-135,443	317,38	-42 986,96	CS ÚRS 2021 02
20	K	131151207	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 5 000 m3	m3	-184,289	93,25	-17 184,97	CS ÚRS 2021 02
21	K	131251207	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	-275,438	167,69	-46 188,16	CS ÚRS 2021 02
22	K	131351207	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	-164,918	238,04	-39 256,99	CS ÚRS 2021 02
23	K	131451207	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	-45,871	543,97	-24 952,28	CS ÚRS 2021 02
48	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-5 384,770	18,81	-101 287,52	CS ÚRS 2021 02
49	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	-288,604	22,09	-6 375,26	CS ÚRS 2021 02
53	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-3 302,478	18,81	-62 119,60	CS ÚRS 2021 02
54	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5	m3	-1 760,440	22,09	-38 888,12	CS ÚRS 2021 02
55	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5	m3	-101,634	22,09	-2 245,10	CS ÚRS 2021 02
56	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5	m3	-1 016,300	22,09	-22 450,07	CS ÚRS 2021 02
58	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-4 483,828	41,06	-184 105,98	CS ÚRS 2021 02
59	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-27,928	54,81	-1 530,73	CS ÚRS 2021 02
60	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-203,275	160,00	-32 523,93	CS ÚRS 2021 02
61	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-2 051,741	16,93	-34 735,98	CS ÚRS 2021 02

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 14
Název změnového listu :	Záporové pažení
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01.2 Řad surové vody

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Neprovedené ocelové záporny pro záporové pažení.
Cena změny :	- 255 205,73 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b ČZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	02.04.2024		125
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	02.04.2024		
TDS	Jméno	Datum	Podpis	
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	02.04.2024		
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	
JVS	Jaroslav Gazda	02.04.2024		



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1060 - Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa

ZMĚNOVÝ LIST č.14 - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: SO 01.2 – Řad surové vody

Datum převzetí: 20. 03. 2024
02. 04. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Záporové pažení.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o neprovedené ocelové zápory pro záporové pažení - odečet.

Požadavek zhotovitele: původní - 255.205,73 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 255.205,73 Kč (bez DPH)

Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity jednotkové ceny položek z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 255.205,73 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list nebude fakturován, ale pouze odečten z celkové ceny díla a v SPP ze sloupce zbývá.

TDS: Ing. Petr Jerhot

podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště: Č. Budějovice
Knežská 354/34 (2)
370 01 Č. Budějovice

AD: Ing. David Brábník

podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-14-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0461 (608188).. **Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II.etapa - dodatek č.2**
Objekt: 14 **SO 01.2 Řad surové vody**
Rozpočet: 1401 **ZMĚNOVÝ LIST č.14 Záporové pažení**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-255 205,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-255 205,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-255 205,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-255 205,73 CZK**

v



dne



OHLA ŽS, a.s.
 Tuřanka 1554/115b
 602 00 Brno
 IČ: 463 42 796
 DIČ: CZ46342796

125

Za zhotovitele



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Pracoviště Č. Budějovice
 Křižská 354/34
 370 01 Č. Budějovice (2)

Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST č.14 Záporové pažení

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:

SO 01.2 Řad surové vody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-255 205,73	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-255 205,73	
D	1		Zemní práce				-255 205,73	
27	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporů pískem délky od 0 do 8 m	m	-77,447	1 423,32	-110 232,29	CS ÚRS 2021 02
28	M	13010732	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 300	t	-2,099	38 282,40	-80 354,76	CS ÚRS 2021 02
29	K	151711131	Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m	m	-77,447	834,36	-64 618,68	CS ÚRS 2021 02

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 15
Název změnového listu :	Přejezdy – ochrana stávajícího potrubí
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01.2 Řad surové vody

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Byla provedena dočasná ochrana stávajícího přivaděče DN 1400 v místech přejezdů těžké techniky.
Cena změny :	117 864,67 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS,a.s. Tuřanka 1554/115b ČZ - 627 00 Brno IČ: 462 62 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	26.04.2024		125
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní ul. č. 4 150 00 Praha 5
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	26.04.2024		
TDS	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní ul. č. 4 150 00 Praha 5
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	26.04.2024		
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 292/19 370 01 České Budějovice
JVS	Jaroslav Gazda	26.04.2024		



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1060 - Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa

ZMĚNOVÝ LIST č.15 - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: SO 01.2 – Řad surové vody

Datum převzetí: 12. 03. 2024
02. 04. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Přejezdy – ochrana stávajícího potrubí.

Zdůvodnění změny:

Byla provedena dočasná ochrana stávajícího přivaděče DN 1400 v místech přejezdů těžké techniky.

Požadavek zhotovitele: původní + 117.864,67 Kč (bez DPH)
po připomínkování + 117.864,67 Kč (bez DPH)

Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceny cenové nabídky SOD a z ceníku URS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 117.864,67 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.


TDS: Ing. Petr Jerhot



podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Knežská 354/34 (2)
370 01 Č. Budějovice

AD: Ing. David Brábník



podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-14-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0461 (608188).. **Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II.etapa - dodatek č.2**
Objekt: 15 **SO 01.2 Řad surové vody**
Rozpočet: 1501 **ZMĚNOVÝ LIST č.15 Přejezdy - ochrana stávajícího potrubí**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			117 864,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			117 864,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	117 864,67 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **117 864,67 CZK**

v  dne _____
 **OHLA ŽS, a.s.**
 Tuřanka 1554/115b
 602 00 Brno
 IČ: 463 42 796
 DIČ: CZ46342796

125

 **VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Průmyslová C. Budějovice
 Křižovnická 354/34
 370 01 C. Budějovice (2)

Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST č.15 Přejezdy - ochrana stávajícího potrubí

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:

SO 01.2 Řad surové vody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							117 864,67	
D HSV Práce a dodávky HSV							117 864,67	
D 1 Zemní práce							3 664,64	
2b	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.	m2	112,000	32,72	3 664,64	CS ÚRS 2021 02
přejezd přes stávající potrubí u kravina 2x								
D 5 Komunikace							97 836,83	
21b	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	112,000	246,48	27 605,76	CS ÚRS 2021 02
22b	K	584121108	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2	m2	63,000	370,25	23 325,75	CS ÚRS 2021 02
23b	M	59381003	panel silniční 3,00x1,50x0,15m	kus	7,000	6 700,76	46 905,32	CS ÚRS 2021 02
D 998 Přesun hmot							16 363,20	
26b	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	68,471	238,98	16 363,20	CS ÚRS 2021 02

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZZV)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 16
Název změnového listu :	Přípojka vody PE d63
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina,627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01.2 Řad surové vody

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Byla provedena přeložka přípojky vody PE d63 pro kravín. Původní přípojka výškově kolidovala s uložením vodovodu.
Cena změny :	5 533,76 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b ČZ - 627 00 Brno IČ: 462 42 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	26.04.2024		125
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží ul. č. 4 150 00 Praha 5
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	26.04.2024		
TDS	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží ul. č. 4, Budějovice Knešická 354/34 370 01 Č. Budějovice (2)
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	26.04.2024		
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	
JVS	Jaroslav Gazda	26.04.2024		



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1060 - Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa

ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: SO 01.2 – Řad surové vody

Datum převzetí: 12. 03. 2024
02. 04. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Přípojka vody PE d63.

Zdůvodnění změny:

Byla provedena přeložka přípojky vody PE d63 pro kravín. Původní přípojka kolidovala s uložením vodovodního potrubí DN 1200.

Požadavek zhotovitele:	původní	+ 10.605,20 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	+ 5.533,76 Kč (bez DPH)


Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceny cenové nabídky SOD a z ceníku URS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 5.533,76 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot


podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Fictitious Č. Budějovice
Krážská 354/34 (2)
370 01 Č. Budějovice

AD: Ing. David Brábník


podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-14-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0461 (608188).. **Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa - dodatek č.2**
Objekt: 16 **SO 01.2 Řad surové vody**
Rozpočet: 1601 **ZMĚNOVÝ LIST č.16 Přípojka vody PE d63**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 533,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 533,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 533,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **5 533,76 CZK**

v

č. 7.

dne



OHLA ŽS, a.s.
 Tuřanka 1554/115b
 125
 Za zhotovitele
 IČ: 463 42 796
 DIČ: CZ46342796

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Písecké ústí Č. Budějovice
 Křižáka 354/34
 370 01 Č. Budějovice (2)
 Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST č.16 Přípojka vody PE d63

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:

SO 01.2 Řad surové vody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 533,76	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 533,76	
D	8		Trubní vedení				5 533,76	
36a	K	871211211	Montáž plastového vodovodního potrubí, D 63 mm	m	6,000	106,20	637,20	CS ÚRS 2023 02
			přípojka vody ke krávinu					
37a	K	722179191	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,000	371,70	371,70	CS ÚRS 2023 02
38a	K	72217.R1	Připojení na stávající potrubí	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
39a	M	ELM.19942	trubka plastová PE d63x5,8 mm	m	6,000	156,56	939,36	CS ÚRS 2023 02
40a	K	877211112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	3,000	261,00	783,00	CS ÚRS 2023 02
41a	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 d 63mm	kus	3,000	517,50	1 552,50	CS ÚRS 2021 02

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 17
Název změnového listu :	Přemostění výkopu
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01.2 Řad surové vody

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Bylo vybudováno přemostění (potrubím PVC DN 250) výkopu pro uložení nového potrubí v místech, kde docházelo k zatékání vody z okolních ploch do provedeného výkopu.
Cena změny :	36 844,25 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pítner	26.04.2024		OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	26.04.2024		VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží ul. č. 4 150 00 Praha 5
TDS	Jméno	Datum	Podpis	
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	26.04.2024		VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště Č. Budějovice Inovace 354/34 370 01 České Budějovice (2)
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	
JVS	Jaroslav Gazda	26.04.2024		



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1060 - Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa

ZMĚNOVÝ LIST č.17 - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: SO 01.2 – Řad surové vody

Datum převzetí: 12. 03. 2024
23. 04. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Přemostění výkopu.

Zdůvodnění změny:

Bylo vybudováno přemostění výkopu (potrubím PVC DN 250) pro uložení nového vodovodního potrubí DN 1200 v místech, kde docházelo k zatékání vody z okolních ploch do provedeného výkopu.

Požadavek zhotovitele: původní + 42.502,16 Kč (bez DPH)
po připomínkování + 36.844,25 Kč (bez DPH)


Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceny cenové nabídky SOD a z ceníku URS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 36.844,25 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.


TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště: Č. Budějovice
Kněžská 364/34
370 01, Č. Budějovice (2)

podpis

AD: Ing. David Brábník



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-14-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0461 (608188).. **Obnova řadu surové vody Řimov - Plav, II.etapa - dodatek č.2**
Objekt: 17 **SO 01.2 Řad surové vody**
Rozpočet: 1701 **ZMĚNOVÝ LIST č.17 Přemostění výkopu**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			36 844,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 844,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 844,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **36 844,25 CZK**

v

✓
CB

dne


OHLA ŽS, a.s.
 Tuřanka 1554/1155
 CZ - 627 00 Brno
 IČ: 463 42 796
 DIČ: CZ46342796
 Za zhotovitele


**VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ÚSTAV A VÝSTAVBA a.s.**
 Přírodní č. Budějovice
 Královská 354/34
 370 01 Č. Budějovice (2)
 Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST č.17 Přemostění výkopu

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:

SO 01.2 Řad surové vody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 844,25	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				36 844,25	
D		1	Zemní práce				5 064,20	
20	K	131151207	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 5 000 m3	m3	18,750	93,25	1 748,44	CS ÚRS 2021 02
<i>úsek 3.4.b - přemostění výkopku z důvodu neustále proudící vody (vrty na louce - kravin) : (2,0+0,5)/2*0,5*30,</i>								
48	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	18,750	18,81	352,69	CS ÚRS 2021 02
58	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,750	41,06	769,88	CS ÚRS 2021 03
62	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,750	116,97	2 193,19	CS ÚRS 2021 02
D		8	Trubní vedení				31 204,35	
72b	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	1,000	2 989,35	2 989,35	CS ÚRS 2021 02
42a	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí z palstů PP korugovaného plnostěnného SN10 DN250	m	30,000	188,10	5 643,00	CS ÚRS 2021 02
43a	M	28611152	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN8	m	30,000	752,40	22 572,00	CS ÚRS 2021 02
D		998	Přesun hmot				575,70	
26b	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,409	238,98	575,70	CS ÚRS 2021 02

01.4a

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 18
Název změnového listu :	Dodatečné práce na šachtách
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01.2.2; SO 01.2.3; SO 01.2.4; 01.1.4b

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o upřesnění a doplnění prací na šachtách a na stěně MVE dle skutečnosti.
Cena změny :	284 148,73 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	125
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	26.04.2024	 OHLA ŽS,a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 46342796 DIČ: CZ46342796	
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	26.04.2024	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží ul. č. 4 150 00 Praha 5	
TDS	Jméno	Datum	Podpis	
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	26.04.2024	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Předměstí Č. Budějovice Nábřeží ul. č. 354/14 370 01 Č. Budějovice (2)	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	
JVS	Jaroslav Gazda	26.04.2024		



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1060 - Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa

ZMĚNOVÝ LIST č.18 - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: SO 01.2.2, SO 01.2.3, SO 01.2.4, SO 01.1.4b

Datum převzetí: 12. 03. 2024
23. 04. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Dodatečné práce na šachtách.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o upřesnění a doplnění prací na šachtách a na stěně MVE dle skutečnosti.

Požadavek zhotovitele: původní + 284.148,73 Kč (bez DPH)
po připomínkování + 284.148,73 Kč (bez DPH)

Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný.
K ocenění prací byly použity ceny cenové nabídky SOD a z ceníku URS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 284.148,73 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný,
správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.


TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kněžská 354/34 (2)
370 01 Č. Budějovice

.....
podpis

AD: Ing. David Brábínek



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

.....
podpis

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0461 (608188).. **Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa - dodatek č.2**
Objekt: 18 **SO 01.2.2 ; SO 01.2.3; SO 01.2.4; 01.1.4b**
Rozpočet: 1801 **ZMĚNOVÝ LIST č.18 Dodatečné práce na šachtách**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			284 148,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			284 148,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	284 148,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **284 148,73 CZK**

v *č.3.* dne



OHLA ŽS, a.s.
 Za zhotovitele
 IČ: 463 42 796
 DIČ: CZ46342796



Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST č.18 Dodatečné práce na šachtách

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:

SO 01.2.2 ; SO 01.2.3; SO 01.2.4; 01.1.4b

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								284 148,73
D		HSV	Práce a dodávky HSV				284 148,73	
D		SO 01.2.2	Vzdušníková šachta 7B - II.etapa				76 771,69	
27b	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	158,900	215,42	34 230,24	CS ÚRS 2023 02
18	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,483	60 830,90	29 381,32	CS ÚRS 2021 02
24	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), , s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových	t	-0,179	55 981,00	-10 010,13	CS ÚRS 2021 02
28	K	93199R001	Těsnění prostupů potrubí bobtnajícím páskem	m	12,807	1 779,00	22 783,65	CS ÚRS 2021 02
33	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	0,838	461,35	386,61	CS ÚRS 2021 02
D		SO 01.2.3	Nápojení řadu na MVE ÚV Plav				8 251,50	
15	K	953334121R	Trvale pružný tmel	m	5,787	1 067,40	6 177,04	CS ÚRS 2021 02
44a	K	783836R1	Krystalizační nátěr pro zajištění voděodolnosti	m2	2,915	711,60	2 074,46	
D		SO 01.2.4	Vzdušníková šachta 8B - II. Etapa				76 771,69	
27b	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	158,900	215,42	34 230,24	CS ÚRS 2023 02
18	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,483	60 830,90	29 381,32	CS ÚRS 2021 02
24	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), , s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových	t	-0,179	55 981,00	-10 010,13	CS ÚRS 2021 02
28	K	93199R001	Těsnění prostupů potrubí bobtnajícím páskem	m	12,807	1 779,00	22 783,65	CS ÚRS 2021 02
33	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	0,838	461,35	386,61	CS ÚRS 2021 02
D		01.1.4.b	Výstupní šachta a odkalení				122 353,85	
18	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,299	60 830,90	18 188,44	CS ÚRS 2021 02
44a	K	783836R1	Krystalizační nátěr pro zajištění voděodolnosti	m2	14,067	711,60	10 010,08	
64	K	936311112	Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru přes 0,25 do 2,00 m2	m3	0,761	15 471,50	11 773,81	CS ÚRS 2021 01
65	K	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	39,562	775,71	30 688,64	CS ÚRS 2021 02
66	M	56284705	plech těsnící s oboustranným bitumenem do pracovních spár betonových konstrukcí ve svitku š 150mm	m	39,562	208,07	8 231,67	CS ÚRS 2021 02
69	K	953334121R	Trvale pružný tmel	m	39,562	1 067,40	42 228,48	
70	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	2,672	461,35	1 232,73	CS ÚRS 2021 02

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 19
Název změnového listu :	Chodník ke hřišti
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01.2 Řad surové vody

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o obnovení původního chodníku ke hřišti.
Cena změny :	156 067,42 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	26.04.2024		125
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží ul. č. 4 150 00 Praha 5
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	26.04.2024		
TDS	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží ul. č. 4 150 00 Praha 5
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	26.04.2024		
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 292/19 370 01 České Budějovice
JVS	Jaroslav Gazda	26.04.2024		



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0461 (608188).. **Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II.etapa - dodatek č.2**
Objekt: 19 **SO 01.2 Řad surové vody**
Rozpočet: 1901 **ZMĚNOVÝ LIST č.19 Chodník ke hřišti**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			156 067,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			156 067,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	156 067,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **156 067,42 CZK**

v C.B.

dne _____


OHLA ŽS, a.s.
 Turanka 1554/115b
 602 00 Brno
 IČ: 463 42 796
 DIČ: CZ46342796

125

Za zhotovitele


**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Právoústeň Č. Budějovice
 Křižácká 354/34
 370 01 Č. Budějovice (2)

Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST č.19 Chodník ke hřišti

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:

SO 01.2 Řad surové vody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							156 067,42	
D HSV Práce a dodávky HSV							156 067,42	
D 1 Zemní práce							12 883,96	
45a	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdál. do 20 m nebo s naložením na dopr. prostředek z kameniva hrub. drceného, o tl.100-200mm	m2	186,400	37,71	7 029,14	CS ÚRS 2023 02
21a	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním na skládku do 3m	m	93,200	62,82	5 854,82	CS ÚRS 2023 02
D 5 Komunikace							79 896,24	
47a	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	93,200	226,80	21 137,76	CS ÚRS 2023 02
48a	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	93,200	229,50	21 389,40	CS ÚRS 2023 02
22a	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	93,200	261,90	24 409,08	CS ÚRS 2023 02
23a	M	59217016	Obrubník parkový BEST LINEA II v. 250 x 80 x 1000 mm přírodní	kus	96,000	135,00	12 960,00	CS ÚRS 2023 02
D 998 Přesun hmot							23 503,92	
142	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	98,351	238,98	23 503,92	CS ÚRS 2021 02
D 997 Přesun sutě							39 783,30	
136	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	73,162	39,87	2 916,97	CS ÚRS 2021 02
137	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 829,050	4,52	8 267,31	CS ÚRS 2021 02
138	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	73,162	201,14	14 715,80	CS ÚRS 2021 02
140	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	73,162	189,76	13 883,22	CS ÚRS 2021 02

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 20
Název změnového listu :	Portál P2 – úpravy odkalovacího potrubí
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	01.1a.A Strojně-technologická část portál P2

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o změnu ve skladbě odkalovacího potrubí v místě osazení indukčního průtokoměru z důvodu jeho stálého zavodnění v celém průřezu.
Cena změny :	86 544,00 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b ČZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	26.04.2024		
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	26.04.2024		
TDS	Jméno	Datum	Podpis	
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	26.04.2024		
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	
JVS	Jaroslav Gazda	26.04.2024		



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1060 - Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa

ZMĚNOVÝ LIST č.20 - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: PS 01.1a.A – Strojně-technologická část portál P2

Datum převzetí: 08. 04. 2024
23. 04. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Portál P2 – úpravy odkalovacího potrubí.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o změnu odkalovacího potrubí v místě osazení indukčního průtokoměru z důvodu jeho stálého zavodnění v celém průřezu.

Požadavek zhotovitele: původní + 86.544,00 Kč (bez DPH)
po připomínkování + 86.544,00 Kč (bez DPH)

Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceny cenové nabídky SOD, z ceníku URS a cenové kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 86.544,00 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kněžská 354/34 (2)
370 01 Č. Budějovice

podpis

AD: Ing. David Brábínek



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-14-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0461 (608188)..** **Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II.etapa - dodatek č.2**
 Objekt: **20** **01.1a.A Strojně-technologická část portál P2**
 Rozpočet: **2001** **ZMĚNOVÝ LIST č.20 Portál P2 - úpravy odkalovacího potrubí**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			86 544,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			86 544,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	86 544,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **86 544,00 CZK**

v Č.B.

dne

 VODNĚHOSPODÁŘSKÝ
 PŮVODNÍ A VÝSTAVBA a.s.
 sídlo: Píseň 354/34
 370 01 Píseň (2)

Za zhotovitele

OHLA ŽS, a.s.

125

Turanka 1554/115b

CZ - 627 00 Brno

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796



Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST č.20 Portál P2 - úpravy odkalovacího potrubí

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:

01.1a.A Strojně-technologická část portál P2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							86 544,00	
D	M	M					86 544,00	
D	350		Strojní technologie				86 544,00	
49a	K	1.1.13	těsnění DN 630	ks	1,000	1 344,00	1 344,00	
50a	K	1.1.14	montáž přírub DN 630 vč. spojovacího materiálu	ks	2,000	3 180,00	6 360,00	
51a	K	1.1.15	úprava potrubí DN 200 od pojišťovacích ventilů	ks	2,000	13 980,00	27 960,00	
52a	K	1.1.16	příruba DN 630	ks	2,000	9 072,00	18 144,00	
53a	K	1.1.17	koleno nerez DN 300	ks	2,000	9 252,00	18 504,00	
54a	K	1.1.18	montážní práce nerez DN 300 (úprava výtoku)	ks	1,000	5 832,00	5 832,00	
55a	K	1.1.19	kontrola vizuální a UTZ	ks	2,000	4 200,00	8 400,00	

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 21
Název změnového listu :	Vyznačení trasy potrubí
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01.2 Řad surové vody

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Byl proveden vyšší počet trasírek pro vyznačení trasy nového potrubí nad rámec projektové dokumentace.
Cena změny :	142 000,16 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	26.04.2024		125
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	26.04.2024		
TDS	Jméno	Datum	Podpis	
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	26.04.2024		
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	
JVS	Jaroslav Gazda	26.04.2024		



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1060 - Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa

ZMĚNOVÝ LIST č.21 - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: SO 01.2 – Řad surové vody

Datum převzetí: 12. 04. 2024
23. 04. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Vyznačení trasy potrubí.

Zdůvodnění změny:

Byl proveden větší počet trasírek pro vyznačení trasy nového potrubí nad rámec DPS.

Požadavek zhotovitele:	původní	+ 142.000,16 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	+ 142.000,16 Kč (bez DPH)


Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceny cenové nabídky SOD, z ceníku URS a cenové kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 142.000,16 Kč (bez DPH)


Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot


podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Provozoviště Č. Budějovice
Královská 354/34 (2)
370 01 Č. Budějovice

AD: Ing. David Brábník


podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-14-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0461 (608188).. **Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II.etapa - dodatek č.2**
Objekt: 21 **SO 01.2 Řad surové vody**
Rozpočet: 2101 **ZMĚNOVÝ LIST č.21 Vyznačení trasy potrubí**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			142 000,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			142 000,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	142 000,16 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **142 000,16 CZK**

v

C.B.


dne



ŽS
OHLA

OHLA ŽS, a.s.
 Tř.anka 1554/115b
 CZ - 627 00 Brno
 Za zhotovitele 796
 DIČ: CZ46342796

125



VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ÚSTAV A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Knežská 354/34 (2)
 370 01 Č. Budějovice

Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST č.21 Vyznačení trasy potrubí

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:

SO 01.2 Řad surové vody

01.1.2a

01.1.2a

01.1.2a

01.1.4b

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							142 000,16	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				142 000,16	
D		1	Zemní práce				37 407,65	
10b	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	3,926	308,39	1 210,74	CS ÚRS 2021 01
53	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	311,126	18,81	5 852,28	CS ÚRS 2021 01
58	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,926	41,06	161,20	CS ÚRS 2021 01
62	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,590	116,97	302,95	CS ÚRS 2021 02
64	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	1,400	174,23	243,92	CS ÚRS 2021 02
65	M	58337302	<i>štěrkopísek frakce 0/16</i>	t	2,338	254,40	594,79	CS ÚRS 2021 02
66	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 536,000	13,42	20 613,12	CS ÚRS 2021 02
67	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 536,000	4,15	6 374,40	CS ÚRS 2021 02
68	M	00572100	<i>osivo jetelotráva intenzivní víceletá</i>	kg	23,040	89,16	2 054,25	CS ÚRS 2021 02
D		2	Zakládání				2 471,20	
54b	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,840	2 941,90	2 471,20	CS ÚRS 2021 02
D		4	Vodorovné konstrukce				4 806,45	
56b	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,350	2 874,70	1 006,15	CS ÚRS 2021 02
36b	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	3,500	1 085,80	3 800,30	CS ÚRS 2021 02
D		8	Trubní vedení				95 463,00	
56a	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	7,000	1 053,00	7 371,00	CS ÚRS 2023 02
57a	M	1122146OZ	<i>Skruž TBS-Q. 800/500/120</i>	kus	7,000	1 656,00	11 592,00	CS ÚRS 2023 02
58a	K	89002	Tyč trasírky tr. prům. 76x3,2mm, 3,65m, materiál ocel vč klobouku trasírky dýnko prům 400 mm	soubor	9,000	8 500,00	76 500,00	CS ÚRS 2021 02
D		998	Přesun hmot				1 851,86	
142	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,749	238,98	1 851,86	CS ÚRS 2021 02

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZZV)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 22
Název změnového listu :	Kotevní body
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	01.1.4.b Výstupní šachta

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Z důvodu nových standardů JVS pro zabezpečení pracovníků při vstupu do šachet, byly doplněny u odkalovací a vzdušnickové šachty nové kotevní body pro připevnění jisticích prvků.
Cena změny :	94 060,77 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	26.04.2024		125
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	26.04.2024		
TDS	Jméno	Datum	Podpis	
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	26.04.2024		
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	
JVS	Jaroslav Gazda	26.04.2024		



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1060 - Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa

ZMĚNOVÝ LIST č.22 - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: SO 01.2 – Řad surové vody

Datum převzetí: 16. 04. 2024
23. 04. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Kotevní body.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu nových standardů JVS pro zabezpečení pracovníků při vstupu do šachet, byly doplněny u vzdušниковých a odkalovacích šachty nové kotevní body pro připevnění jistících prvků.

Požadavek zhotovitele:	původní	+ 94.060,77 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	+ 94.060,77 Kč (bez DPH)

Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceny cenové nabídky SOD, z ceníku URS a cenové kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 94.060,77 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Krběšská 354/34 (2)
370 01 Č. Budějovice

podpis

AD: Ing. David Brábínek

podpis



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-14-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0461 (608188)..** **Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II.etapa - dodatek č.2**

Objekt: **22** **01.1.4.b Výstupní šachta**

Rozpočet: **2201** **ZMĚNOVÝ LIST č.22 Kotevní body**

Objednatel: **IČO:**
DIČ:

Zhotovitel: **IČO:**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			94 060,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			94 060,77

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 060,77 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **94 060,77 CZK**

v Č. 3.

dne


**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ÚSTAV A VÝSTAVBA a.s.**
Pracoviště Č. Budějovice
Průmyslová 354/34
370 01 Č. Budějovice (2)


**ŽS
OHLA**
Za zhotovitele
Tuřanka 1554/115b
ČZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST č.22 Kotevní body

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:

01.1.4.b Výstupní šachta

01.1.2a

SO 01.2

SO 01.2

SO 01.2

SO 01.2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 060,77	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				94 060,77	
D	1		Zemní práce				4 583,60	
10b	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	11,011	308,39	3 395,68	CS ÚRS 2021 01
53	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1,750	18,81	32,92	CS ÚRS 2021 01
58	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,750	41,06	71,86	CS ÚRS 2021 01
62	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,260	116,97	1 083,14	CS ÚRS 2021 02
D	2		Zakládání				13 140,90	
59a	K	275313811	Beton základových patek prostý C 30/37	m3	3,140	4 185,00	13 140,90	CS ÚRS 2021 02
D	4		Vodorovné konstrukce				641,70	
60a	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkoříska do 63 mm	m3	0,620	1 035,00	641,70	CS ÚRS 2021 02
D	8		Trubní vedení				72 172,00	
56a	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	1 053,00	4 212,00	CS ÚRS 2023 02
61a	M	59224162	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100 bez stupadel	kus	4,000	4 590,00	18 360,00	CS ÚRS 2023 02
62a	K	89004	Montáž kotevního bodu	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	
63a	K	89005	Výroba a dodávka kotevního bodu z trubky ocelové prům. 152x5 mm	kus	4,000	11 150,00	44 600,00	
D	998		Přesun hmot				3 522,57	
142	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	14,740	238,98	3 522,57	CS ÚRS 2021 02

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 23
Název změnového listu :	Otočení klapky MVE a vzdušníku portál P2
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina,627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	PS-01.2.3a; 01.1a.A

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o otočení klapky DN 800 v MVE z důvodu lepší přístupnosti k ovládání klapky.
Cena změny :	141 900,00 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b ČZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	26.04.2024		
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží ul. 150 00 Praha 5
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	26.04.2024		
TDS	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. České Budějovice Kvěčova 354/34 370 01 České Budějovice (2)
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	26.04.2024		
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	JVS Jaroslav Gazda 26.04.2024
JVS	Jaroslav Gazda	26.04.2024		



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1060 - Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa

ZMĚNOVÝ LIST č.23 - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: PS 01.2.3a, PS 01.1.a.A

Datum převzetí: 16. 04. 2024
26. 04. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Otočení klapky MVE a vzdušníku portál P2.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o otočení klapky DN 800 v budově MVE z důvodu lepší přístupnosti obsluhy k ovládání klapky a vzdušníku v portálu P2.

Požadavek zhotovitele: původní + 141.900,00 Kč (bez DPH)
po připomínkování + 141.900,00 Kč (bez DPH)

Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceny z cenové kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 141.900,00 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot


podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště: Č. Budějovice
Kněžská 334/34 (2)
370 01 Č. Budějovice

AD: Ing. David Brábník


podpis
 VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-14-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0461 (608188).. **Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II.etapa - dodatek č.2**
Objekt: 23 **PS-01.2.3a - Napojení řadu na MVE ÚV Plav - strojně-technologická část; 01.1a.A Strojně-technologické**
Rozpočet: 2301 **ZMĚNOVÝ LIST č.23 Otočení klapky MVE a vzdušníku portál P2**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			141 900,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			141 900,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	141 900,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **141 900,00 CZK**

v C.B. dne _____


OHLA ŽS, a.s.
 Za zhotovitele
 IČ: 463 42 796
 DIČ: CZ46342796


**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Příspěvková organizace
 Křižovatka 354/34
 370 01 Č. Budějovice (2)

Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST č.23 Otočení klapky MVE a vzdušníku portál P2

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:

**PS-01.2.3a - Napojení řadu na MVE ÚV Plav - strojně-technologická část;
01.1a.A Strojně-technologická část portál P2**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							141 900,00	
D	M		Práce a dodávky M				141 900,00	
D	350		Strojní technologie na MVE ÚV Plav				135 400,00	
64a	K	1.2.3.12	Demontáž klapky	soubor	1,000	31 500,00	31 500,00	
65a	M	1.2.3.13	těsnění	kus	2,000	5 350,00	10 700,00	
66a	M	1.2.3.14	šrouby	kus	28,000	750,00	21 000,00	
67a	K	1.2.3.15	Montáž klapky	kpl	1,000	49 000,00	49 000,00	
68a	K	1.2.3.16	Přesun a odvoz vybouraného materiálu	kpl	1,000	7 550,00	7 550,00	
69a	K	1.2.3.17	Demontáž a zpětná montáž kabelové trasy	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
70a	K	1.2.3.18	Úprava kabelové trasy včetně materiálu	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	
D	350		Strojní technologie portál P2				6 500,00	
71a	K	1.2.3.19	Vypuštění řadu včetně zavření 2 ks klapek	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
72a	K	1.2.3.20	Demontáž odvzdušňovacího šoupěte	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00	
73a	K	1.2.3.21	Montáž odvzdušňovacího šoupěte	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00	
74a	K	1.2.3.22	Otevření klapky	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
