




OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Číslo smlouvy objednatele: D/2167/2014/ŘDP/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Vsetínská nemocnice a.s. – realizace úspor energie“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami
takto:

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: Zlínský kraj
: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
: MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán

: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
: Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a
: realizace investic

: 70891320

: CZ70891320

: Česká spořitelna, a.s., Zlín

: 1827552/0800

: 577 043 871 / 577 043 880

: milan.hudec@kr-zlinsky.cz

: frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz

1.1. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

: 1.VASTO spol. s r.o.

: Na Dolanskú 295/9, 755 01 Vsetín

: Ing. Vojtěch Indruch - jednatel

: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1246

: Ing. Vojtěch Indruch - jednatel

: Ing. Vojtěch Indruch a jím pověřený stavbyvedoucí

: 41084900

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. J. Stašková

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák

- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.


Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci OPŽP (Fond soudržnosti)

<http://www.opzp.cz/>

<http://www.sfzp.cz/>



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DIČ : CZ41084900
Bankovní ústav : ČSOB a.s., Vsetín
Číslo účtu¹ : 1513289/0300
Tel. / Fax : 571 411 937 / 571 519 544
E-mail : 1vasto@1vasto.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9.12.2014, č. D/2167/2014/ŘDP na akci:

„Vsetínská nemocnice a.s. – realizace úspor energie“
(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změnový list č. 1 prováděných prací a změna termínu plnění.

2.3. Změnový list řeší změny, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a které vznikly v průběhu realizace stavby. V průběhu realizace stavby vznikly okolnosti, které měly za následek neprovedení některých prací – méněpráce, na druhé straně však je nezbytně nutné provést některé práce a opatření, nezbytné pro dokončení díla. Navržené změny zachovávají požadovaný standard, a nemají vliv na kvalitu díla.

2.4. Změnový list č. 1 zvyšuje celkovou cenu díla a stává se nedílnou součástí Smlouvy.
Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši **11 329 550,80 Kč (bez DPH)** zahrnovala rezervu OPŽP ve výši 543 000 Kč bez DPH, z níž budou předmětné vícepráce hrazeny. Cena díla bez rezervy OPŽP ze Smlouvy činí **10 786 550,80 Kč bez DPH**.
V souvislosti se změnovým listem č. 1 se cena díla bez rezervy OPŽP ze Smlouvy ve výši **10 786 550,80 Kč bez DPH**:
snižuje o méněpráce ve výši **205.562,61 Kč (bez DPH)**
zvyšuje o vícepráce ve výši **454.075,12 Kč (bez DPH)**

2.5. V průběhu realizace stavebních prací v měsících 01 – 02.2015 nastaly takové klimatické podmínky (průměrná denní teplota pod bodem mrazu), které vzhledem k používaným technologickým postupům nedovolily pokračovat v provádění stavby, proto byly práce přerušeny a opět zahájeny v 03.2015. Z toho důvodu dochází k prodloužení termínu pro dokončení a předání díla o 31 dní. Toto prodloužení nemá vliv na čerpání dotace OPŽP.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách Smlouvy:

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně

Za odbor INV - zpracoval: Ing. J. Stašková	Za odbor ŘDP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
---	--


Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci OPŽP (Fond soudržnosti)

<http://www.opzp.cz/>

<http://www.sfzp.cz/>



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

ČL. 2 Předmět smlouvy a rozsah díla se doplňuje o bod 2.7.31, Smlouvy, který zní:

2.7.31. Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

ČL. 3 Termín a místo plnění se v bodech 3.8. a 3.9. smlouvy mění a po změně zní:

3.8. Dokončení stavebních prací: 31.07.2015

3.9. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: 31.07.2015

5. CENA DÍLA

ČL. 4. odst. 4.2. Smlouvy se mění a pozměně zní:

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

Cena díla dle smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1:

11.035.063,31 Kč (bez DPH)

(slovy: jedenáctmilionůtřicetpěttisícšedesáttří korun českých)

2.317.363,30 Kč DPH 21 %

13.352.426,61 Kč (včetně DPH)

(slovy: třináctmilionůtřistapadesátdvatisícečtyřistadvacetšest korun českých)

Z toho čerpaná rezerva činí 248.512,51 Kč bez DPH.

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

Text čl. 21 odst. 21.9. Smlouvy se doplňuje o text:

Za odbor INV - zpracoval: Ing. J. Stašková	Za odbor ŘDP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
---	--

Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci OPŽP (Fond soudržnosti)

<http://www.opzp.cz/>

<http://www.sfzp.cz/>



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodní,
zemědělní a přírodní

Přílohou č. 4 této smlouvy je změnový list č. 1

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
- 6.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
- 6.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 4 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 15.6.2015 č. usnesení 0488/R13/15.

Ve Zlíně dne 26. 06. 2015

Objednatel:



MVDr. Stanislav Mišák – hejtman



Ve Vsetíně dne 22. 06. 2015

Zhotovitel:



Ing. Vojtěch Indruch – jednatel

1. VASTO spol. s r.o.

Na Dolanskú 295/9, 755 01 Vsetín

DIČ: CZ41084900

1

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. J. Stašková

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák

- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.

Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci OPŽP (Fond soudržnosti)

<http://www.opzp.cz/>

<http://www.sfzp.cz/>

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01

Zhotovitel:	1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín	IČ: 41084900
Investor:	Zlínský kraj Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90	Datum: 13.05.2015

Název akce:

Vsetínská nemocnice a. s. – realizace úspor energie

Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
-------------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Odkazy	na specifikaci:	Zápis KD bod 1/7 a 2/1
	na výkresy:	Změnová PD úprava detailu S2 a zápis v SD
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr SO 01 Realizace úspor energie – pavilon A SO 02 Realizace úspor energie – pavilon G
	na jinou část smlouvy:	Bod č. 2.13.7. dle SOD

Předmět změny:

Důvodem níže uvedených změn je provedení prací, které nebylo možno při zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby předpokládat. **Změna byla vyvolána zjištěním skutečného stavu všech konstrukcí v průběhu bouracích prací na staveništi.**

Po zahájení demontáže stávajícího střešního souvrství a odstranění všech částí konstrukce byly účastníky výstavby iniciovány níže popsané změny.

1.1. SO 01 **Objekt A** - úprava skladby S2 střechy1.2. SO 02 **Objekt G** – zvýšený rozsah vrstev stávající střechy k odstranění**Popis a zdůvodnění změny:**Změna 1.1. SO 01 **Objekt A** - úprava skladby S2 střechy

Po provedení rozsáhlejšího sondování stávající konstrukce střechy budovy A byl přizván projektant k posouzení stávající konstrukce stropu. Bylo konstatováno, že oproti sondě provedené v rámci zpracování projektové dokumentace se vyskytují odchylky ve skladbě stávajícího hurdiskového stropu, kdy není v celé ploše rozneseno zatížení střechy na ocelové nosníky a tudíž nelze bezpečně a technicky provést navrženou skladbu S2. Na základě zjištění Generální projektant částečně upravil navrženou skladbu střechy S2 objektu. V nové skladbě se polystyrenbeton nebude realizovat, ale bude nahrazen vzduchovou mezerou zakrytou roznášecí deskou z OSB 3 desek tl. 22 mm na samonosném roznášecím roštu z dřevěných hranolků. Stávající stropní nosné ocelové I profily hurdiskového stropu je třeba oboustranně obetonovat betonem pro dlouhodobou ochranu proti korozi. Následná parozábrana je nově přesunuta na roznášecí desku OSB3 a kotvena pomocí celoplošného kontaktního lepení. Zbývající část původní skladby včetně zateplení zůstává beze změn.

Dle stanoviska GP Změna skladby nemá vliv na navržené tepelné technické vlastnosti nově budovaného zateplení střechy objektu. Tepelné technické parametry dle energetického auditu zateplení a dle PD zůstávají bez změny zachovány. Změna má vliv na cenu díla, ale nemá vliv na konečný termín dokončení díla.

Snížené náklady na změnu skladby S2 činí	-174.133,40 Kč bez DPH
Zvýšené náklady na změnu skladby S2 činí	+ 338. 604,13 Kč bez DPH

Celkové náklady výše uvedených změn 1.1. jsou podloženy naceněním zhotovitele na podkladu od GP v celkové výši
164.470,73,- bez DPH

Změna 1.2. SO 02 Objekt G – Změna bouraných vrstev stávající střechy budovy G

V rámci realizace zateplení střešního pláště budovy G při odstraňování stávajícího souvrství původního střešního pláště byla na části plochy cca 65 % střechy zjištěna škvárobetonová podkladní mazanina - spádová vrstva průměrné tloušťky 92 mm namísto sypké škváry. Podle stanoviska GP pro dodržení navržených parametrů projektu, statického zatížení a nutnosti nenavyšovat celkovou navrženou skladbu dle PD je nutno odstranit (odbourat a likvidovat) kompletní původní souvrství v celé zjištěné mocnosti. Jedná se o zvýšený nárůst bouracích prací při odstraňování škvárobetonové mazaniny ze stávající střechy objektu G a méně práce odstranění škváry. Zjištěná skutečnost neodpovídá dostupným podkladům v PD a sondám provedeným v rámci zpracování PD. Změna má vliv na cenu díla, ale nemá vliv na konečný termín dokončení díla.

Snížené náklady na změnu skladby S2 činí - 31.429,21 Kč bez DPH
Zvýšené náklady na změnu skladby S2 činí + 115.470,99 Kč bez DPH

Celkové náklady výše uvedených změn 1.2. jsou podloženy naceněním zhotovitele na podkladu od GP v celkové výši **84. 041,78 bez DPH**


V průběhu realizace stavebních prací v měsících 01 – 02.2015 **nastaly** takové **klimatické podmínky (průměrná denní teplota pod bodem mrazu)**, které vzhledem k používaným technologickým postupům **nedovolily pokračovat** v provádění stavby, proto byly práce přerušeny a opět zahájeny v 03.2015. Z toho důvodu dochází k prodloužení termínu pro dokončení a předání díla o 31 dní.

Počet připojených listů specifikací: 14 listů	Rekapitulace – 2 listy Rozpočet – změna č. 1.1 – odpočet - 3 listy Rozpočet – změna č. 1.1 – přípočet - 3 listy Rozpočet – změna č. 1.2 – odpočet - 3 listy Rozpočet – změna č. 1.2 – přípočet - 3 listy
Počet připojených listů specifikací:	
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☒ jiné okolnosti ☒	

Oznámení vydává: Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

1. VASTO spol. s r.o.

Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín
DIČ: CZ41084900


Ing. Pavel Šrámek - stavbyvedoucí

2

Stanovisko technického dozoru stavby:

Výše uvedené vyvolané změny souvisí s realizací předmětu díla a jejich realizace je vhodná i s ohledem na řemeslně efektivní k dokončení plně funkčního díla dle projektové dokumentace a dodržení tepelně technických parametrů stanovených auditorem akce.

Změna komplexně řeší technickou a technologickou změnu provádění jednotlivých detailů v zateplení střechy s důrazem na zjištěný stav po provedení bouracích prací na staveništi, tak aby bylo dokončené dílo plně funkční a kvalitně řemeslně proveditelné s ohledem na předpokládanou životnost stavby.

Všechny úpravy či změny byly řádně projednány se zástupci EAZK i auditora akce a oficiálně vydány formou úpravy projektové dokumentace a následně odsouhlaseny na kontrolních dnech stavby.

Technický dozor s vhodností realizace změny souhlasí a doporučuje odsouhlasit

.....
Ing. Viktor Dynka
za RPS-I s.r.o

Stanovisko AD a projektanta stavby:

Generální projektant po zjištění skutečného stavu při realizaci stavby **navrhnul efektivní změny-úpravy řešení tak, aby byly dodrženy všechny kvalitativní parametry díla stanovené projektem stavby.**

Skutečný – původní stav skladby stávající skladby i skrytých konstrukcí bylo možné ověřit v plném rozsahu vždy až po zásahu do nich tj. až po demolicích a odstranění krycích vrstev jako celku. GP nemohl celoplošně ověřit stávající skladbu střešního pláště, proto vycházel z dostupných podkladů a toto zahrnul do PD a VV. Proto generální projektant předpokládal stávající stav na základě výsledků provedení pouze lokálního stavebně technického průzkumu, ten však nemohl všechny následně zjištěné skutečnosti postihnout. **Změny nijak nesnižují standart díla dle projektové dokumentace a energetického auditu.**

Autorský dozor souhlasí s realizací změny a doporučuje odsouhlasit

.....
Ing. Zahradníček
za ATRIS s.r.o.

Přílohy :

položkové rozpočty dle textu

samostatné doklady:

- Schéma nové skladby střechy – doplněk dokumentace
- Fotodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín IČ: 41084900	
Změnový list vystavil:	Zlínský kraj Tř. T. Bati 21 761 90 Zlín	
Datum:	13.5.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Důvodem níže uvedených změn je provedení prací, které nebylo možno při zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby předpokládat. Změna byla vyvolána zjištěním skutečného stavu všech konstrukcí v průběhu bouracích prací na staveništi. Po zahájení demontáže stávajícího střešního souvrství a odstranění všech částí konstrukce byly účastníky výstavby iniciovány níže popsané změny. Popis a zdůvodnění změny: <u>Změna 1.1. SO 01 Objekt A - úprava skladby S2 střechy</u> Po provedení rozsáhlejšího sondování stávající konstrukce střechy budovy A byl přizván projektant k posouzení stávající konstrukce stropu. Bylo konstatováno, že oproti sondě provedené v rámci zpracování projektové dokumentace se vyskytují odchylky ve skladbě stávajícího hurdiskového stropu, kdy není v celé ploše rozneseno zatížení střechy na ocelové nosníky a tudíž nelze bezpečně a technicky provést navrženou skladbu S2. Na základě zjištění Generální projektant částečně upravil navrženou skladbu střechy S2 objektu. V nové skladbě se polystyrenbeton nebude realizovat, ale bude nahrazen vzduchovou mezerou zakrytou roznášecí deskou z OSB 3 desek tl. 22 mm na samonosném roznášecím roštu z dřevěných hranolků. Stávající stropní nosné ocelové I profily hurdiskového stropu je třeba oboustranně obetonovat betonem pro dlouhodobou ochranu proti korozi. Následná parozábrana je nově přesunuta na roznášecí desku OSB3 a kotvena pomocí celoplošného kontaktního lepení. Zbývající část původní skladby včetně zateplení zůstává beze změn. Dle stanoviska GP Změna skladby nemá vliv na navržené tepelně technické vlastnosti nově budovaného zateplení střechy objektu. Tepelně technické parametry dle energetického auditu zateplení a dle PD zůstávají bez změny zachovány. Změna má vliv na cenu díla, ale nemá vliv na konečný termín dokončení díla. <u>Změna 1.2. SO 02 Objekt G – Změna bouraných vrstev stávající střechy budovy G</u> V rámci realizace zateplení střešního pláště budovy G při odstraňování stávajícího souvrství původního střešního pláště byla na části plochy cca 65 % střechy zjištěna škvárobetonová podkladní mazanina - spádová vrstva průměrné tloušťky 92 mm namísto sykové škváry. Podle stanoviska GP pro dodržení navržených parametrů projektu, statického zatížení a nutnosti nenavyšovat celkovou navrženou skladbu dle PD je nutno odstranit (odbourat a likvidovat) kompletní původní souvrství v celé zjištěné mocnosti. Jedná se o zvýšený nárůst bouracích prací při odstraňování škvárobetonové mazaniny ze stávající střechy objektu G a méně práce		

odstranění škváry. Zjištěná skutečnost neodpovídá dostupným podkladům v PD a sondám provedeným v rámci zpracování PD. Změna má vliv na cenu díla, ale nemá vliv na konečný termín dokončení díla.

Bez realizace těchto prací by nebylo možno dodržet předpokládané parametry projektu a dokončit dílo v požadované kvalitě.

V průběhu realizace stavebních prací v měsících 01 – 02.2015 nastaly takové klimatické podmínky (průměrná denní teplota pod bodem mrazu), které vzhledem k používaným technologickým postupům nedovolily pokračovat v provádění stavby, proto byly práce přerušeny a opět zahájeny v 03.2015. Z toho důvodu dochází k prodloužení termínu pro dokončení a předání díla o 31 dní.

Počet připojených listů specifikací: 14	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: -205.562,61 Kč	Cena víceprací bez DPH: +454.075,12 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 248 512, 51 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 31. 07. 2015
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Milan Hudec, Odpovědný zástupce objednatele za věci technické	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Pavel Šrámek stavbyvedoucí  1. VASTO spol. s r.o. Na Bečánsku 295/9, 755 01 Vsetín. DIČ: CZ41084900 2
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil :

Schválil :

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20141608007
Stavba: Vsetínská nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a G

KSO: 801 11
Místo: Vsetín
CC-CZ: 19.05.2015

Zadavatel: Zlínský kraj
IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900

Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vsetín
IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900

Projektant: ATRIS s.r.o.
IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900

Poznámka:

Cena bez DPH		248 512,51
DPH základní	21,00%	Výše daně 52 187,63
DPH snížená	15,00%	
Cena s DPH		300 700,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20141608007

Stavba: Vsetínská nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a G

Místo: Vsetín Datum: 19.05.2015
Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vsetín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

03	Realizace úspor energie - pavilon A - zateplení méně práce	248 512,51	300 700,14	STA
04	Realizace úspor energie - pavilon A - zateplení vícepráce	-174 133,40	-210 701,41	STA
03	Realizace úspor energie - pavilon G - zateplení méně práce	338 604,13	409 711,00	STA
04	Realizace úspor energie - pavilon G - zateplení vícepráce	-31 429,21	-38 029,34	STA
		115 470,99	139 719,90	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vsetínská nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a G
Objekt:

03 - Realizace úspor energie - pavilon G - zateplení

KSO:	801 11	CC-CZ:	
Místo:	Vsetín	Datum:	19.05.2015
Zadavatel:		IČ:	
Zlínský kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41084900
1. VAŠTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vsetín		DIČ:	CZ41084900
Projektant:		IČ:	
ATRIS s.r.o.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	115 470,99		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	115 470,99	21,00%	24 248,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK 139 719,90		

SOUPIS VICEPRACÍ

Stavba: Vsetínská nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a G
Objekt: 03 - Realizace úspor energie - pavilon G - zateplení
Místo: Vsetín
Zadavatel: Zlínský kraj
Uchazeč: 1. VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vsetín
Kód dílu - Popis

Datum: 19.05.2015
Projektant: ATRIS s.r.o.
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	115 470,99
HSV - Práce a dodávky HSV	115 470,99
96 - Bourání konstrukcí	115 470,99

SOUPIS VICEPRACÍ

Stavba:

Vsetínská nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a G

Objekt:

03 - Realizace úspor energie - pavilon G - zateplení

Místo:

Vsetín

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vsetín

Datum: 19.05.2015

Projektant: ATRIS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

115 470,99 0 84,67680

D HSV Práce a dodávky HSV

115 470,99 0 84,67680

D 96 Bourání konstrukcí

40	K	965043341	Bourání podkladů betonových s potěrem tl. do 100mm přes 4m2	m3	35,282	2 020,00	71 269,64	CS ÚRS 2014 01	2,40000	84,67680
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------	---------	----------

viz. v.č. D.1.1.b)G01-G07- stáv. střecha

590*0,65*0,092

35,282

49	K	997013115	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	84,677	120,00	10 161,23	CS ÚRS 2014 01	0,00000	0,00000
50	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	84,677	150,00	12 701,54	CS ÚRS 2014 01	0,00000	0,00000
51	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	762,092	8,00	6 096,74	CS ÚRS 2014 01	0,00000	0,00000

432,233*9 Přepočtené koeficientem množství

3 890,097

52	K	R- 9970138	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	84,677	180,00	15 241,84		0,00000	0,00000
----	---	------------	--	---	--------	--------	-----------	--	---------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vsetínská nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a G
Objekt:

03 - Realizace úspor energie - pavilon G - zateplení

KSO:	801 11	CC-CZ:	
Místo:	Vsetín	Datum:	19.05.2015
Zadavatel:	Zlínský kraj	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41084900
		DIČ:	CZ41084900
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		-31 429,21
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-31 429,21 0,00	21,00% 15,00% -6 600,13 0,00
Cena s DPH		-38 029,34

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Vsetínská nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a G

Objekt:

03 - Realizace úspor energie - pavilon G - zateplení

Místo:

Vsetín

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vsetín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-31 429,21

HSV - Práce a dodávky HSV

-31 429,21

96 - Bourání konstrukcí


-31 429,21

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: Vsetínská nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a G
 Objekt: 03 - Realizace úspor energie - pavilon G - zateplení
 Místo: Vsetín
 Zadavatel: Zlínský kraj
 Uchazeč: 1. VASTO spol. s r.o., Na Dolanskú 295/9, 75501 Vsetín

Datum: 19.05.2015
 Projektant: ATRIS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem										
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-31 429,21		0	-49,39480
D	96		Bourání konstrukcí				-31 429,21		0	-49,39480
40	K	965082941	Odstranění násypů tl přes 200 mm	m3	-35,282	160,00	-5 645,12	CS ÚRS 2014 01	1,40000	-49,39480
vz. v.č. D.1.1.b)G01-G07- stáv. střecha										
-590*0,65*0,092					-35,282					
49	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	-49,395	120,00	-5 927,38	CS ÚRS 2014 01	0,00000	0,00000
50	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-49,395	150,00	-7 409,22	CS ÚRS 2014 01	0,00000	0,00000
51	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-444,553	8,00	-3 556,43	CS ÚRS 2014 01	0,00000	0,00000
432,233-9 Přepočtené koeficientem množství					3 890,097					
52	K	R- 9970138	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-49,395	180,00	-8 891,06		0,00000	0,00000



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu
List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace
2) Rekapitulace

3) Soupis prací
3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vsetínská nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a G
Objekt:

01 - Realizace úspor energie - pavilon A - zateplení

KSO: 801 11
Místo: Vsetín
Zadavatel: Zlínský kraj
Uchazeč: 1. VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vsetín
Projektant: ATRIS s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.04.2015
IČ:
DIČ:
IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

338 604,13

DPH základní
snížená

Základ daně
338 604,13

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
71 106,87

Cena s DPH

v CZK

409 711,00

SOUPIS VICEPRACÍ

Stavba:

Vsetinská nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a G

Objekt:

01 - Realizace úspor energie - pavilon A - zateplení

Místo:

Vsetín

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vsetín

Datum: 24.04.2015

Projektant: ATRIS s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

338 604,13

HSV - Práce a dodávky HSV

4 599,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

4 599,00

PSV - Práce a dodávky PSV

334 005,13

762 - Konstrukce tesařské

334 005,13

SOUPIS VICEPRACÍ

Stavba: Vsetínská nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a G
 Objekt: 01 - Realizace úspor energie - pavilon A - zateplení
 Místo: Vsetín
 Zadavatel: Zlínský kraj
 Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vsetín
 Datum: 24.04.2015
 Projektant: ATRIS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							338 604,13
D	HSV		Práce a dodávky HSV				338 604,13
4			Vodorovné konstrukce				4 599,00
13	K	411388621	Dobetonování stropů ze suchých směsí tl. Do 150mm polchy do 0,25m2	ks	9,000	511,00	4 599,00
kotevní patky pod záchytný systém							
Konstrukce tesařské							334 005,13
VV	762						
D	998762103		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	9,678	400,00	3 871,09
	762083122		Impregnace řeziva v exteriéru	m3	3,259	861,00	2 806,07
95	K	762810046	Základ stopů OSB tl. 22 mm šroubovaný na rošt na pero drážku	m2	460,500	409,00	188 344,50
161+299,5							
VV	762524911		Položení polštářů tl. do 100mm	m	823,000	106,00	87 238,00
VV	767995111		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	91,700	88,10	8 078,77
	dodávka		Dodávka osazovacích úhelníků	kg	91,700	125,00	11 462,50
VV	762		Dodávka řeziva	m3	3,259	6 900,00	22 487,65
823+1,1*0,06*0,06							
	762595001		Spojovací prostředky pro položení podlah a zakrytí kanálů	m2	460,500	21,10	9 716,55

14102:166

KRYCÍ LIST SOUPISU**Stavba:**

Vsetínská nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a G

Objekt:**01 - Realizace úspor energie - pavilon A - zateplení****KSO:**

801 11

Místo:

Vsetín

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

1. VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vsetín

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Poznámka:**CC-CZ:**

Datum:

24.04.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

41084900

DIČ:

CZ41084900

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**-174 133,40****DPH základní
snížená****Základ daně
-174 133,40
0,00****Sazba daně
21,00%
15,00%****Výše daně
-36 568,01
0,00****Cena s DPH****v CZK****-210 701,41**

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Vsetínská nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a G

Objekt:

01 - Realizace úspor energie - pavilon A - zateplení

Místo:

Vsetín

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vsetín

Datum: 24.04.2015

Projektant: ATRIS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-174 133,40

-174 133,40

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

-174 133,40

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Všechná nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a G

Objekt:

01 - Realizace úspor energie - pavilon A - zateplení

Místo:

Vsetín

Datum: 24.04.2015

Zadavatel:

Zlínský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vsetín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV


6

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

13	K	631342132	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 350 kg/m3	m3	-64,470	2 600,00	-167 622,00
	W		viz.v.č.D.1.1.b)A12, skladba S2				
	W		161*0,14+299,5*0,14		64,470		
	W		Součet		64,470		
D	99		Přesuny hmot a sutí				-6 511,40
77	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-32,557	200,00	-6 511,40
	W		64,47*0,35		-22,565		

-174 133,40

-174 133,40


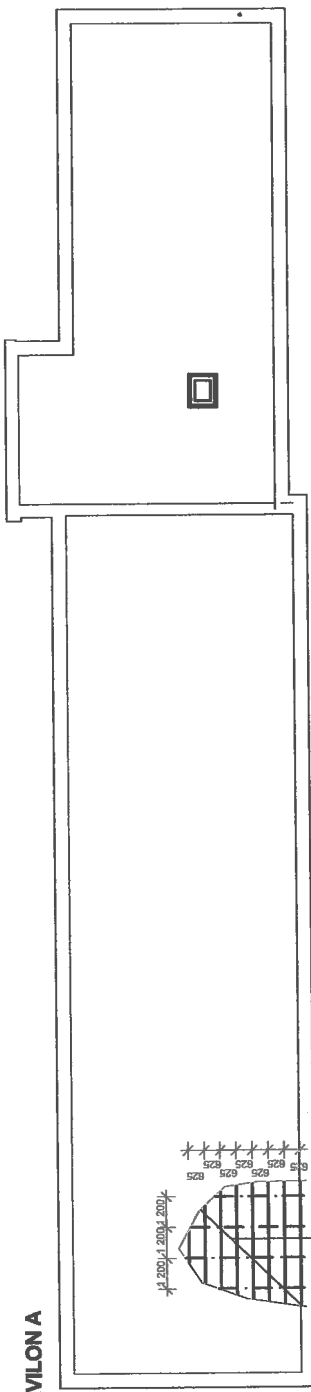




LEGENDA SKLADBY

- SKLADBA STŘECHY**
- PRÁNY KÁČÍREK TL. 50mm
 - GEOTEXTILIE 200g/m2
 - HYDROIZOLACE PVC-P S ODOLNOSTÍ PROTI UV ZÁŘENÍ, TL. 2mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
 - TEPELNÁ IZOLACE Z MV, TL. 60mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, TL. 120mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
 - SPÁDOVÉ KLINY EPS 150S, TL. 60-200mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
 - SAMOLEPIČÍ MODIFIKOVANÝ ASPHALTOVÝ PÁS, TL. 3mm S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKELNÉ ROHOŽE
 - OSB III TL. 22mm
 - DŘEVĚNÝ ROST 80/60mm 6025mm - KOTVENO POMOCÍ ÚHELNIKŮ K OC. NOSNÍKŮM
 - STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE CSD HURDIS A OC. NOSNÍKY 1180
- ZMĚNA SKLADBY**

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK		 PODPIS	 Průmysl Velikého 699/5 703 00 Ostrava-Vítkovice s.r.o.	ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 420/297	
VYPRACOVAL: ING. MICHAL KAWULOK						
INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ, TRŽDA TOMÁŠE BATI 21, 761 90 ZLÍN						
NÁZEV AKCE: VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - REALIZACE ÚSPOR ENERGIE (PAVILON - A)		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01				
OBSAH VÝKRESU: SCHEMA SKLADBY STŘECHY		MĚŘÍTKO: 1:200				
			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)-A18			

FOTO objekt A

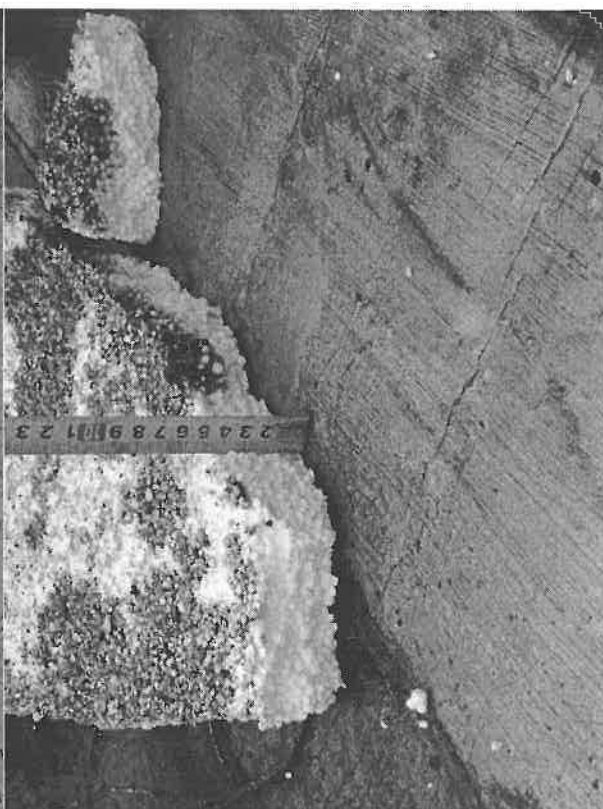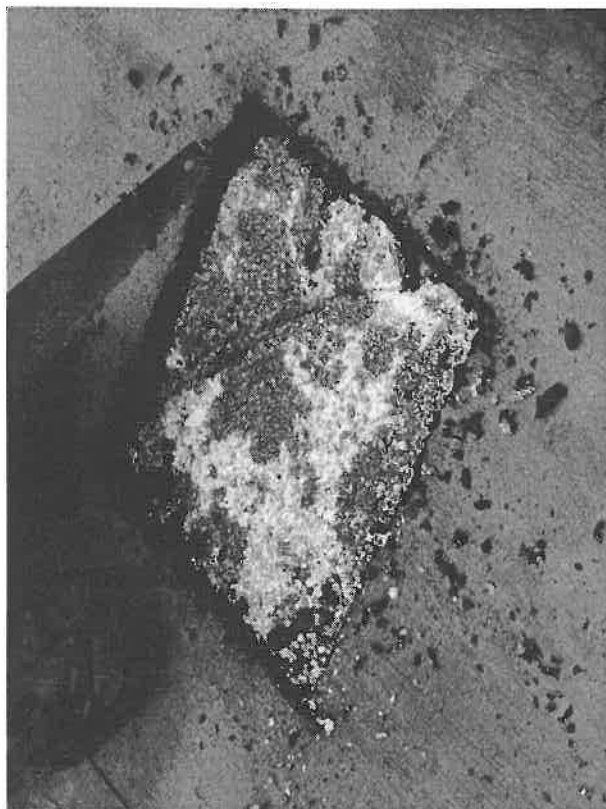

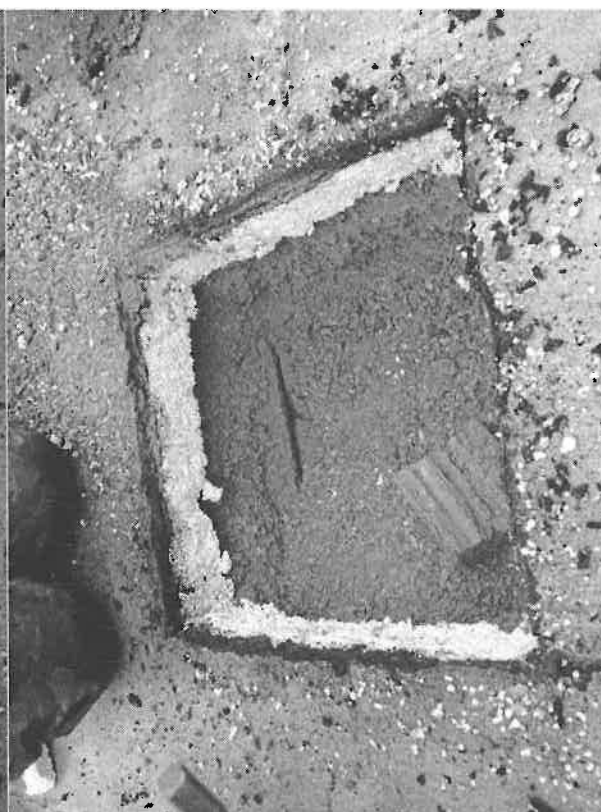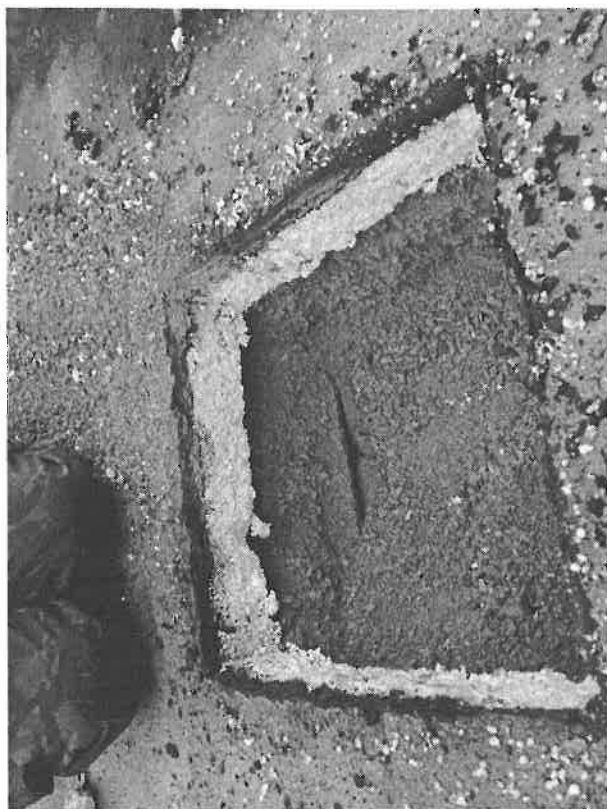




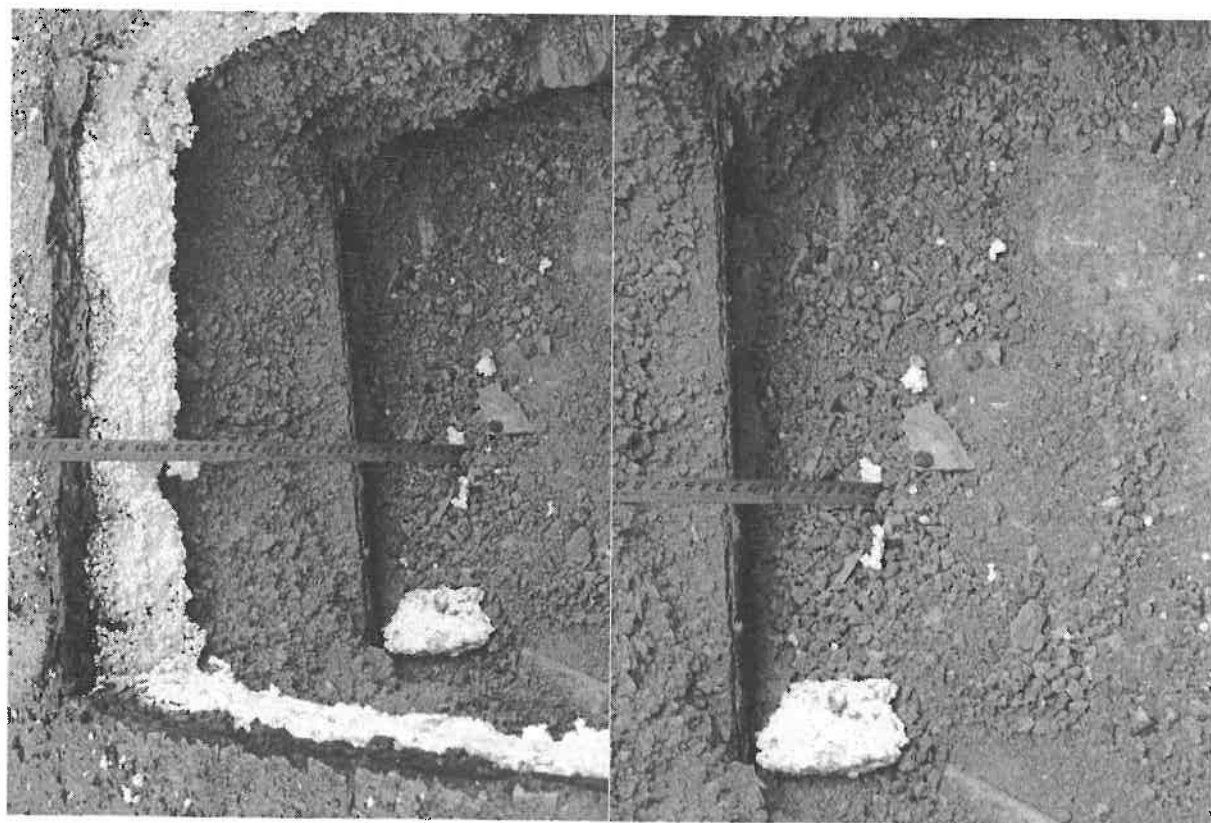


FOTO objekt G

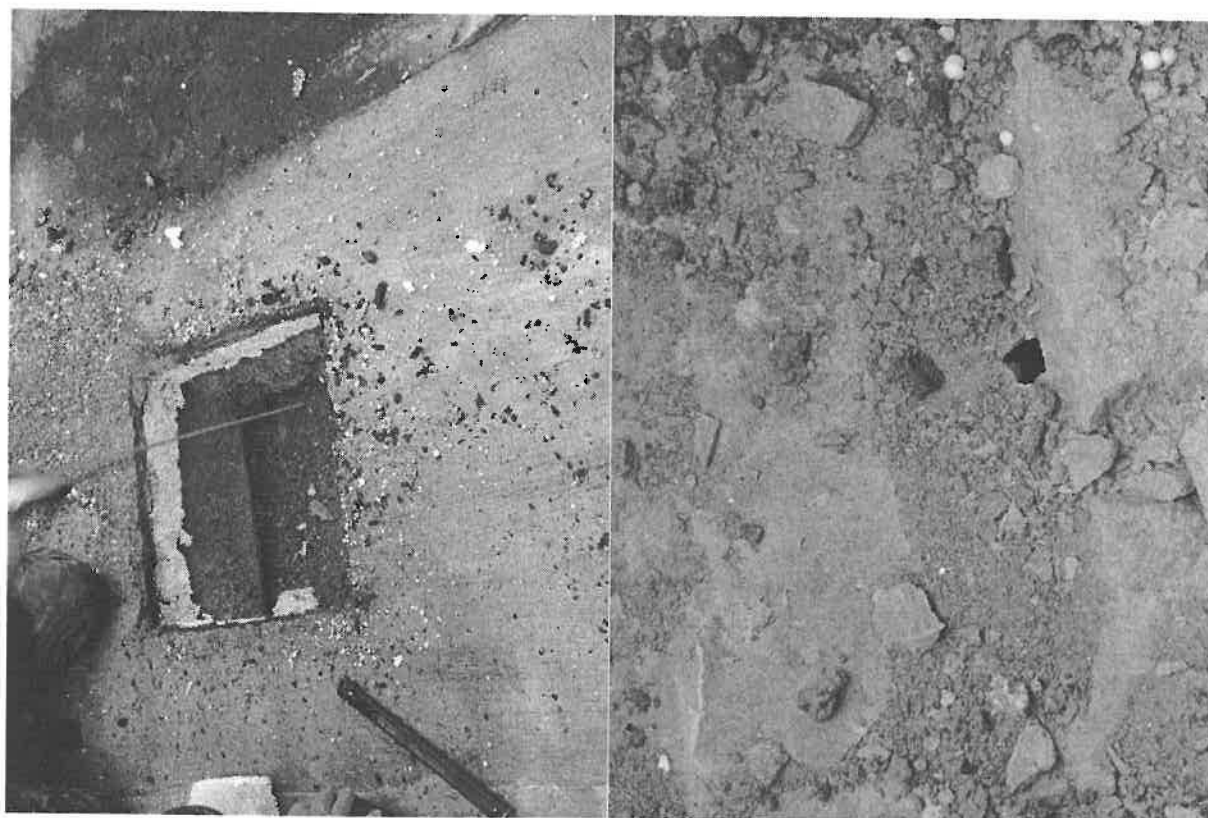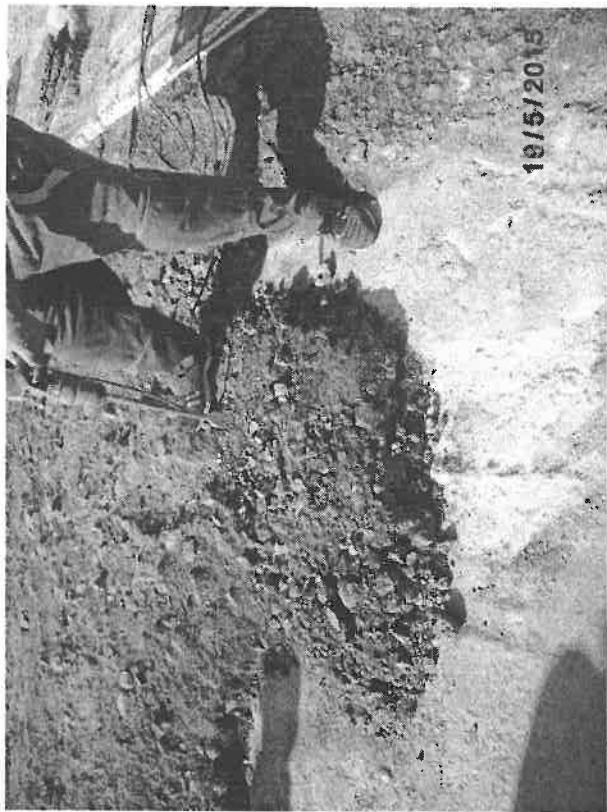

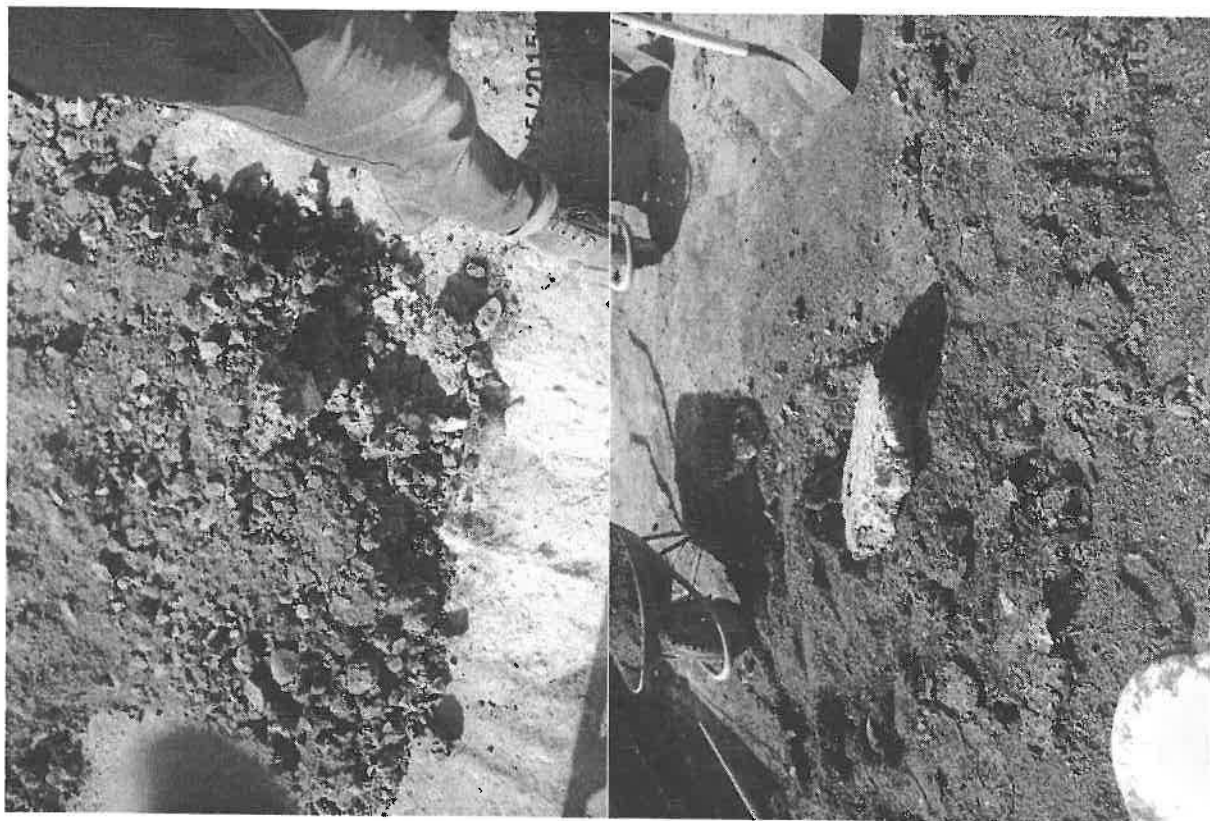

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 74708960-121719-150630101640, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 31 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

30.6.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



74708960-121719-150630101640

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.
