

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na realizaci stavby

Zásobování obcí severního Písecka, II. etapa 1.část Mirovice-Čimelice

číslo smlouvy Zhotovitele: D60189/INV/2016/21

číslo smlouvy Objednatele: 5052/15/s0 -~~d1~~

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel : **HOCHTIEF CZ a. s.**
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
zastoupený : Ing. Tomáš Bílek, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Ing. Marek Čepela, ředitel divize Pozemní stavby Čechy

Ing. Zdeněk Šmitmajer, ředitel závodu Jih

ve věcech technických : Ing. Michal Takács, zástupce ředitele závodu Jih pro obchod

Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
číslo účtu : 2047610104/2600

IČO : 466 78 468

DIČ : CZ 46678468

Tel : 387 729 113

Fax : 387 729 563

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

IČO: 49021117

DIČ: CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice

číslo účtu: 212621693/0300

Tel.: 386 102 430

Fax: 386 102 439

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo takto:

3. Předmět plnění

V Čl. 3 Předmět plnění se odst. 3.1 doplňuje o provedení následujících prací:

Předmět plnění se rozšiřuje o nové stavební a montážní práce, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku.

6. Cena

V Čl. 6 Cena za dílo se v odst. 6.1 mění cena za zhotovení předmětu smlouvy takto:

Rekapitulace:

Cena dle základní SoD bez DPH	33 749 226,00	Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2 073 213,78	Kč
z toho :		
změnový list č. 1	179 872,49	Kč
změnový list č. 3	2 307 475,00	Kč
změnový list č. 3a	-577 754,73	Kč
změnový list č. 4	163 621,02	Kč
Cena celkem bez DPH	35 822 439,78	Kč
DPH 21%	7 522 712,35	Kč
Cena vč. DPH	43 345 152,13	Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1: změnový list č. 1
- Příloha č. 2: změnový list č. 3
- změnový list č. 3a
- Příloha č. 3: změnový list č. 4

V Praze, dne 19.6.2016

V Č. Budějovicích, dne 05-09-2016

Zhotovitel:

Objednatel :

Ing. Marek Čepela
ředitel divize
HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Zdeněk Šmitmajer
ředitel závodu Jih
HOCHTIEF CZ a. s.



Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva
Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumann 19 (1)
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 12.7.16

č. usnesení 242/16

ověřeno Princ



TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

Zásobování obcí severního Písecka II. Etapa, 1. část Mírotice - Čimelice

Číslo rozhodnutí o přidělení dotace MZe - 129D252004206

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Stanovisko TDI

Stavební objekt: SO 03 VDJ Čimelice – příjezdná cesta

Datum převzetí: 10.5. 2016
15.6. 2016 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Oprava položek dle skutečnosti
Z důvodu, že v prostoru přístupové cesty k VDJ Čimelice, byl po vytýčení trasy zjištěn větší počet stromů, než uvádí dokumentace pro provedení stavby (ZDS).
pro provedení stavby (ZDS).

Zdůvodnění změny:

Při prověření skutečného stavu v celé délce přístupové cesty k VDJ Čimelice, byl po vytýčení trasy zjištěn větší počet stromů, než uvádí dokumentace pro provedení stavby (ZDS). Dle provedené zaměření a součtu je v trase příjezdové cesty celkem 178 ks stromů (ve výkazu výměr celkem 25 ks).

Požadavek zhotovitele:	původní	179.872,49 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	179.872,49 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDI:

Z důvodu přesného geodetického vytyčení stavby až při realizaci došlo k přesnému spočítání zasažených stromů až nyní. Kontrola proběhla a měření průměrů bylo provedeno v místě řezu (dle URS). TDI považuje požadavek zhotovitele za oprávněný. K cenové kalkulaci byly použity jen položky z nabídkového rozpočtu SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 179.872,49 Kč (bez DPH)

TDI považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDI: 16.6.2016

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště
Česká Budějovice
datum, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

datum, podpis

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

STAVBA:	Zásobování obcí severního Písecka, II. etapa 1. Část Mirovice - Čimelice
OBJEKT:	SO 03 VDJ Čimelice – příjezdná cesta
SMLOUVA ČÍSLO:	5052/15/s0 ; D60189/INV/2016/21
OBJEDNATEL / IČ	Jihočeský vodárenský svaz / IČ: 49021117
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ: 46678468

Dohodnuté změny:
Popis změny:

V prostoru přístupové cesty k VDJ Čimelice, byl po vytyčení trasy zjištěn větší počet stromů, než uvádí realizační dokumentace a výkaz výměr. Dle provedené zaměření a součtu je v trase příjezdové cesty celkem 178 ks stromů (ve výkazu výměr celkem 25 ks).

Příloha č. 2 : fotodokumentace, situace SO 03, mapa s vyznačením přístupové cesty

Dopad do ceny:

Zvýšení ceny

Příloha č. 1 : položkový rozpočet, oceněný výkaz výměr

Dopad do termínu

Prodloužení/Zkrácení termínu

Jiná ujednání:

Dle požadavku investora, kácení stromů a odstranění ostatního porostu zajistí společnost Almea s.r.o. Zhotovitel hradí kácení a odstranění dřevin, objednateli náleží výzisk z prodeje dřevin.

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena :	Jiná ujednání :
179 872,49 Kč bez DPH	

Vystavil:
(zhotovitel)

Ing. Jan Kafka

Datum: 15. 6. 2016

Podpis:



Doporučuje ke schválení:
(GP)

Ing. Jaroslav Valeček

Datum: 16. 6. 2016

Podpis:

Doporučuje ke schválení:
(TDS)

Ing. Petr Jerhot

Datum: 16. 6. 2016

Podpis:

Schválil:
(objednatel)

Ing. Luděk Kroupa

Datum: 16. 6. 2016

Podpis:

Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

SO 03 - VDJ Čimelice - příjezdná cesta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	HSV		Práce a dodávky HSV				179 872,49
0	1		Zemní práce				179 872,49
6	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	111,000	73,35	8 141,85
7	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	47,000	131,73	6 191,31
8	K	112101123	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 700 mm	kus	20,000	131,73	2 634,60
9	K	112201101	Odstraňování pařezů D do 300 mm	kus	111,000	167,65	18 609,15
10	K	112201102	Odstraňování pařezů D do 500 mm	kus	47,000	295,30	13 879,10
11	K	112201103	Odstraňování pařezů D do 700 mm	kus	20,000	475,47	9 509,40
13	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	111,000	239,20	26 551,20
14	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	47,000	528,35	24 832,45
15	K	162301417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	20,000	981,99	19 639,80
16	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	111,000	60,28	6 691,08
17	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	47,000	209,07	9 826,29
18	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	20,000	400,27	8 005,40
19	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	333,000	8,07	2 687,31
	VV						
	VV		"odvoz do vzdálenosti 16 km				
	VV		111 * (20 - 5) / 5		333,000		
20	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	141,000	43,56	6 141,96
20	VV						
	VV		"odvoz do vzdálenosti 16 km				
20	VV		47 * (20 - 5) / 5		141,000		
21	K	162301917	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	60,000	86,60	5 196,00
20	VV						
	VV		"odvoz do vzdálenosti 16 km				
20	VV		20 * (20 - 5) / 5		60,000		
22	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	333,000	12,42	4 135,86
	VV						
	VV		"odvoz do vzdálenosti 16 km				
	VV		111 * (20 - 5) / 5		333,000		
23	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	141,000	24,73	3 486,93
	VV						
	VV		"odvoz do vzdálenosti 16 km				
	VV		47 * (20 - 5) / 5		141,000		
24	K	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	60,000	61,88	3 712,80
	VV						
	VV		"odvoz do vzdálenosti 16 km				
	VV		20 * (20 - 5) / 5		60,000		





SO 03 Příjezdná cesta k VDJ Čimelice







SO 03 Příjezdná cesta k VDJ Čimelice







TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

Zásobování obcí severního Písecka II. Etapa, 1. část Mirovice - Čimelice

Číslo rozhodnutí o přidělení dotace MZe - 129D252004206

ZMĚNOVÝ LIST č.3 - Stanovisko TDI

Stavební objekt: SO 01 Provozní řad VDJ Mirovice - VDJ Čimelice

Datum převzetí:

13.6. 2016

1. 7. 2016 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

Oprava položek dle skutečnosti

Z důvodu objevení hornin vyšší třídy těžitelnosti v protlacích pod komunikacemi a pod řekou Lomnicí, než uvádí dokumentace pro provedení stavby (ZDS).

Zdůvodnění změny:

Při hloubení startovacích a koncových jam a při provádění protlaků byly zastiženy horniny vyšších tříd těžitelnosti než uvádí dokumentace pro provedení stavby (ZDS), ve skutečnosti se v trase protlaků místy nachází horniny třídy 5 a 6.

Výše uvedené problémy se týkají:

- podchodu silnice č.III./12110 ve staničení ST 1,18380 km (DN 560, délka protlaku 31,5 m)
- podchodu pod řekou Lomnicí ve staničení ST 2,19080 km (DN 400, délka protlaku 2x40,0m)
- podchodu silnice č.III./00423 ve staničení ST 2,51525 km (DN 560, délka protlaku 18,5 m)

Tyto protlaky budou provedeny vrtnou frézou a valivým dlátem.

Požadavek zhotovitele:

původní

2.486.773,20 Kč (bez DPH)

po připomínkování

2.307.475,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDI:

Z výše uvedených důvodů při realizaci stavby došlo k zastavení prací na těchto protlacích. Zajištění cenových nabídek u těchto specializovaných prací, které neobsahuje ceník URS, bylo časově náročné, rovněž při výběru nejlevnější nabídky nebylo možné zajistit nástup subdodavatele obratem – posunuje se termín zahájení těchto protlaků až na 31.týden. TDI považuje požadavek zhotovitele za oprávněný. K cenové kalkulaci nemohly být použity položky ceníku URS, protože tyto speciální práce ceník neobsahuje. Z tohoto důvodu byly pro zjištění ceny obvyklé předloženy 3 cenové nabídky.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

2.307.475,00 Kč (bez DPH)

TDI považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Pro fakturaci tohoto změnového listu bude soupis provedených prací (kontrola výměr TDI dle skutečnosti při provádění).

TDI:

11.7.2016



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.

Nábřeží
150 56 Praha 5

datum, podpis

Objednatel:

souhlasí / ~~nesouhlasí~~

datum, podpis

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 3

STAVBA:	Zásobování obcí severního Písecka, II. etapa 1. Část Mirovice - Čimelice
OBJEKT:	SO 01 Provozní řád VDJ Mirovice – VDJ Čimelice
SMLOUVA ČÍSLO:	5052/15/s0 ; D60189/INV/2016/21
OBJEDNATEL / IČ	Jihočeský vodárenský svaz / IČ: 49021117
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ: 46678468

Dohodnuté změny:
Popis změny:

V trase plánovaných podchodů pod komunikacemi a řekou Lomnice, zjištěn výskyt skalnatého podloží (hornina tř. 5 – 6). Jedná se o podchod silnice č. III/12110, km 1,183.80 (délka protlaku 32,0 m), podchod pod řekou Lomnice, km 2,190.80 (délka protlaku 2x40,0 m) a podchod pod silnicí č. III/00423, km 2,515.25 (délka protlaku 19,0). Tyto protlaky je nutné provádět jinou technologií – vrtnou frézou.

Dopad do ceny:

Zvýšení ceny

Příloha č. 1.: položkový rozpočet

Dopad do termínu

Posunutí termínu realizace armaturních šachet AŠ4, AŠ5, (po dokončení podchodu pod Lomnicí) 08 – 10/2016.

Jiná ujednání:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena:	Jiná ujednání:
2 307 475,00 Kč bez DPH	

Vystavil: Ing. Jan Kafka
(zhotovitel)

Datum: 1.7.2016

Podpis:



Doporučuje ke schválení: Ing. Jaroslav Valeček
(GP)

Datum: 18.7.16

Podpis:



Doporučuje ke schválení: Ing. Petr Jerhot
(TDS)

Datum: 1.1.-07-2016

Podpis:

Schválil: Ing. Luděk Kroupa
(objednatel)

Datum: 11.7.2016

Podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

SO 01 - Přívodní řad VDJ Mirotice - VDJ Čimelice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	HSV		Práce a dodávky HSV				2 307 475
0	1		Zemní práce				2 307 475,00
43a	K		Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 400 mm v hornině tř 5 až 6 "podchod pod řekou Lomnicí" 2 * 39,50	m	79,000	13 225,00	1 044 775,00
43b	K		Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 400 mm - pomocný vrt "od stroje do startovací jámy" 2 * 40,00		80,000	5 865,00	469 200,00
45a	K		Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru 560 mm v hornině tř 5 až 6 "km 1,1838" 32,0 - 0,50 "km 2,51525" 19,0 - 0,50	m	50,000	15 870,00	793 500,00
					31,500		
					18,500		



ZMĚNOVÝ LIST č.3a - Stanovisko TDI

Stavební objekt: SO 01 Provozní řad VDJ Mirovice - VDJ Čimelice

Datum převzetí: 11. 7. 2016
11. 7. 2016 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: **Oprava položek výkazu výměr**
Ve skutečnosti nebylo vyčerpáno množství, které je uvedeno v rozpočtu zadávací dokumentace. Z důvodu objevení hornin vyšší třídy těžitelnosti v protlacích pod komunikacemi a pod řekou Lomnicí, než uvádí dokumentace pro provedení stavby (ZDS).

Zdůvodnění změny:
Při hloubení startovacích a koncových jam a při provádění protlaků byly zastiženy horniny vyšších tříd těžitelnosti než uvádí dokumentace pro provedení stavby (ZDS), ve skutečnosti se v trase protlaků místy nachází horniny třídy 5 a 6.

Výše uvedené problémy se týkají:

- podchodu silnice č.III./12110 ve staničení ST 1,18380 km (DN 560, délka protlaku 31,5 m)
- podchodu pod řekou Lomnicí ve staničení ST 2,19080 km (DN 400, délka protlaku 2x40,0m)
- podchodu silnice č.III./00423 ve staničení ST 2,51525 km (DN 560, délka protlaku 18,5 m)

Tyto protlaky budou provedeny vrtnou frézou a valivým dlatem.

Nebudou provedeny protlaky v horninách třídy 3 a 4 (ZDS).

Požadavek zhotovitele: **původní - 577.754,73 Kč (bez DPH)**
po připomínkování - 577.754,73 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDI:

Uvedený odpočet zhotovitele považuje TDI za odpovídající skutečnosti a vyjadřuje práce na stavbě neprováděné. K cenové kalkulaci byly použity položky z nabídkového rozpočtu (součást SOD).

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 577.754,73 Kč (bez DPH)

TDI považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Změnový list nebude fakturován, ale bude podle něj upravena (ponížena) celková cena díla.

TDI: 11.7.2016



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

datum, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

datum, podpis

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 9.
370 01 České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 3a

STAVBA:	Zásobování obcí severního Písecka, II. etapa 1. Část Mirovice - Čimelice
OBJEKT:	SO 01 Provozní řád VDJ Mirovice – VDJ Čimelice
SMLOUVA ČÍSLO:	5052/15/s0 ; D60189/INV/2016/21
OBJEDNATEL / IČ	Jihočeský vodárenský svaz / IČ: 49021117
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ: 46678468

Dohodnuté změny:
Popis změny:

Podchody pod komunikacemi a řekou Lomnice, nerealizované dle specifikace výkazu výměr (zjištěn výskyt skalnatého podloží, jiná technologie vrtání, viz. ZL č.3).
Jedná se o podchod silnice č. III/12110, km 1,183.80 (délka protlaku 31,5 m), podchod pod řekou Lomnice, km 2,190.80 (délka protlaku 2x39,5 m) a podchod pod silnicí č. III/00423, km 2,515.25 (délka protlaku 18,5).

Dopad do ceny:

Snížení ceny

Příloha č. 1 :: položkový rozpočet

Dopad do termínu
Jiná ujednání:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena :	Jiná ujednání :
- 577 754,73 Kč bez DPH	

Vystavil:
(zhotovitel)

Ing. Jan Kafka

Datum: 11. 7. 2016

Podpis: [Podpis]

Doporučuje ke schválení:
(GP)

Ing. Jaroslav Valeček

Datum: 18. 7. 16

Podpis: [Podpis]

Doporučuje ke schválení:
(TDS)

Ing. Petr Jerhot

Datum: 11 -07- 2016

Podpis: [Podpis]

Schválil:
(objednatel)

Ing. Luděk Kroupa

Datum: 11. 7. 2016

Podpis: [Podpis]



Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

SO 01 - Přívodní řád VDJ Mirovice - VDJ Čimelice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-577 755
D	1		Zemní práce				-577 754,73
43	K	141721119	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 400 mm v hornině tří 1 až 4	m	-79,000	3 816,87	-301 532,73
			"podchod pod řekou Lomnici" 2 * 39,50		79,000		
45	K	141721120 R	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru 560 mm	m	-50,000	5 524,44	-276 222,00
			"km 1,1838" 32,0 - 0,50		31,500		
			"km 2,51525" 19,0 - 0,50		18,500		
			Součet		50,000		



TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

Zásobování obcí severního Písecka II. Etapa, 1. část Mírotice - Čimelice
Číslo rozhodnutí o přidělení dotace MZe - 129D252004206

ZMĚNOVÝ LIST č.4 - Stanovisko TDI

Stavební objekt: SO 01 Provozní řad VDJ Mírotice - VDJ Čimelice

Datum převzetí: 27. 6. 2016
1. 7. 2016 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Oprava položek dle skutečnosti
V projektové dokumentaci pro provedení stavby (ZDS) byl přechod komunikace mezi obcí Boudy a silnicí E55 na pozemku p.č. 1207/2 řešen překopem (hloubením rýhy).

Zdůvodnění změny:

Při provádění pokládky potrubí bylo v předstihu zjištěno, že ZDS obsahuje provedení (přechodu komunikace mezi obcí Boudy a silnicí E55) překopem komunikace. Z důvodu zachování průjezdnosti autobusové dopravy a obslužnosti obce bylo rozhodnuto o provedení protlaku DN 560 v délce 12,0 m v horninách třídy těžitelnosti 3 a 4.

Požadavek zhotovitele:	původní	163.621,02 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	163.621,02 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDI:

Z výše uvedených důvodů při realizaci stavby došlo k pozastavení prací na této části stavby. TDI považuje požadavek zhotovitele za oprávněný. K cenové kalkulaci byly použity výhradně položky nabídkového rozpočtu (součást SOD).

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 163.621,02 Kč (bez DPH)

TDI považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDI: 11.7.2016



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

datum, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

datum, podpis

Jihočeský vodárenský svaz
K. H. Burdakov 12
372 01 Čestlánek

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 4

STAVBA:	Zásobování obcí severního Písecka, II. etapa 1. Část Mírotice - Čimelice
OBJEKT:	SO 01 Provozní řád VDJ Mírotice – VDJ Čimelice
SMLOUVA ČÍSLO:	5052/15/s0 ; D60189/INV/2016/21
OBJEDNATEL / IČ	Jihočeský vodárenský svaz / IČ: 49021117
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ: 46678468

Dohodnuté změny:

Popis změny:

V trase vodovodu u K9 není vyřešen podchod pod komunikací mezi obcí Boudy a silnicí E55 na pozemku č. 1207/2 v k.ú. Boudy. Dle projektové dokumentace, se křížení má provést otevřenou rýhou – překopem. Toto řešení nelze provést, vzhledem k zachování průjezdnosti komunikace (autobusová doprava, obslužnost obce). Křížení vodovodního řádu s komunikací bude tedy provedeno řízeným podvrtem v délce 12,0 m

Příloha č. 2 : výkres podchodu pod komunikací

Dopad do ceny:

Zvýšení ceny

Příloha č. 1 : položkový rozpočet

Dopad do termínu

Jiná ujednání:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena :	Jiná ujednání :
163 621,02 Kč bez DPH	

Vystavil: Ing. Jan Kafka
(zhotovitel)

Datum: 11.7.2016

Podpis:  HOCHTIEF CZ a. s.
IČ: 46678468 (18)

Doporučuje ke schválení: Ing. Jaroslav Valeček
(GP)

Datum: 18.7.16

Podpis:  AQUATIS a.s.
Botanická 634/56, 602 00 Brno

Doporučuje ke schválení: Ing. Petr Jerhot
(TDS)

Datum: 11-07-2016

Podpis:  VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nádražní 1
150 06 Praha 5


Schválil: Ing. Luděk Kroupa
(objednatel)

Datum: 17.7.2016

Podpis:  Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumann 19 9.
370 01 České Budějovice

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

CHRÁNIČKA - PE-100 500x29,7mm, PN10, SDR 17 dl. 12,00m

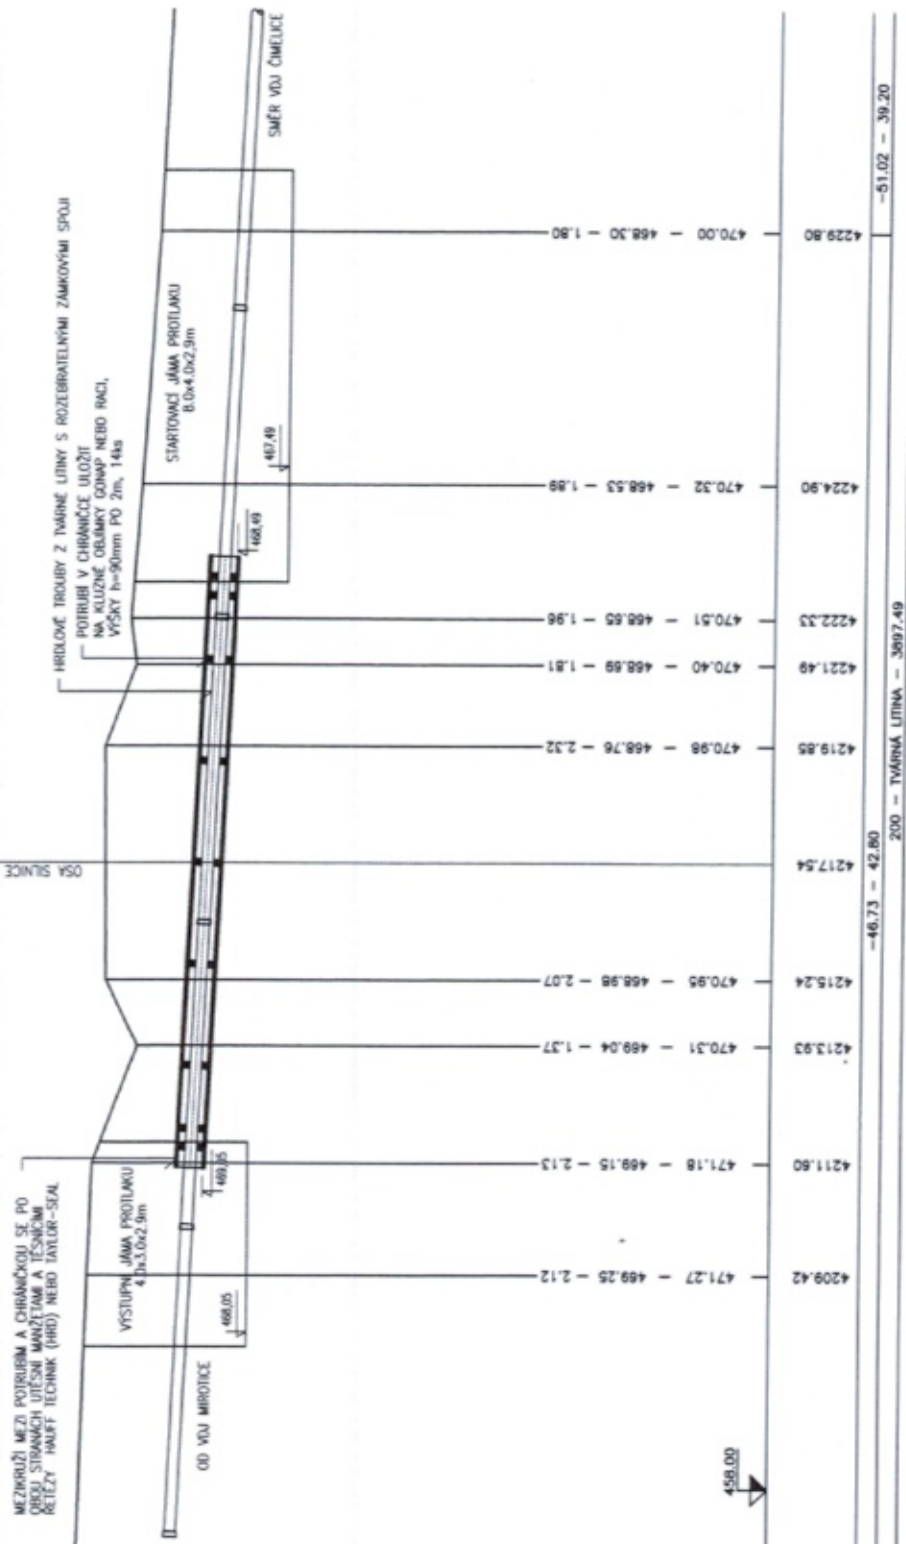

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENI [km]. [m]

SKLON [promile] – DÉLKA [m]
 DN [mm] – MATERIÁL – DELKA [m]
