

DODATEK č.5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
1379 – Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 - kalníková
šachta K4

Číslo smlouvy objednatele : 1379/19/s0-d5

Číslo smlouvy zhotovitele : 20190813

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : Stavitelství Briezstienský s.r.o.
K Rybníku 2838/37, 370 10 České Budějovice
Spisová značka : C12724 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Ing. Františkem Briezstienským, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Ing. František Briezstienský

ve věcech technických : Ing. František Briezstienský

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu : 568268309/0800

IČO : 26080044

DIČ : CZ26080044

Číslo telefonu : 602442073

Číslo faxu : x

Email : briezstiensky@tiscali.cz

ID datové schránky : 4vv4h9

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH 3 969 035,54 Kč

Cena SOD dle Dodatku č.1 bez DPH 4 110 734,46 Kč

Cena SOD dle Dodatku č.2 bez DPH 4 407 661,12 Kč

Cena SOD dle Dodatku č.3 bez DPH 4 484 391,28 Kč

Cena ZL č.12 bez DPH 84 826,39 Kč

Cena ZL č.13 bez DPH 196 850,35 Kč

Cena ZL č.14 bez DPH 39 631,35 Kč

Cena ZL č.15 bez DPH 192 000,00 Kč

Cena ZL č.16 bez DPH 74 200,00 Kč

Cena ZL č.17 bez DPH -469 943,10 Kč

Cena celkem bez DPH 4 601 956,27 Kč

Cena DPH 21% 966 410,82 Kč

Cena včetně DPH 5 568 367,09 Kč

Dodatek č.5 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.5 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL 12, ZL 13, ZL 14, ZL 15, ZL 16, ZL 17

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne

16 -04- 2021

Zhotovitel :

Objednatel :

STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ s.r.o.
K Rybníku 2010/27, 370 10 České Budějovice
IČ:260 80 044 tel: 302 442 073

Ing. František Briezstienský

Jednatel

Antonín Princ

Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 13.4.21 Jihočeský vodárenský svaz

č. usnesení 294/15 sídlo: Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

ověřeno

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 12
Název změnového listu :	Vyčištění pracovní jámy
Stavba :	1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 – Kalníková šachta K4
Objednatel :	JVS , S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Stavatelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1379/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Kalníková šachta K4

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	po přerušení stavebních prací bylo nutné vyčerpat zaplavenou stavební jámu a odstranit usazený kal a bahno, po té je možno pokračovat v dalších pracích k ukončení díla
Cena změny :	84 826,39 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavatelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	23.03.2021	STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ S.R.O. K Rybníku 28/3/37, 370 10 České Budějovice IČ:260820044 tel./802442073
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	23.03.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		23.03.2021	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	23.03.2021	S. K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 48027117 / DIČ CZ48027117

ZMĚNOVÝ LIST Č.12 Vyčištění pracovní jámy

Stavba:

1379 Odkalovací jámy na řadu surové vody DN1400 - Kalníková šachta K4

Objekt:

SO-01 Kalníková šachta K4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							84 826,39
D	HSV		Práce a dodávky HSV				84 826,39
D	1		Zemní práce				84 826,39
1a	K	110001R	Ruční dočištění stavební jámy od nánosů bahna s přemístěním do 20 m	m3	5,922	2 125,00	12 584,25
	VV		"dno výkopu a pod DN 1400"				
	VV		3,5*5,64*0,3		5,922		
3	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	360,000	85,60	30 816,00
	P		Poznámka k položce: předpoklad čerpání po celou dobu zrání betonu při betonáži kalníkové šachty				
	VV		15*24		360,000		
	VV		Součet		360,000		
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,000	85,00	1 275,00
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
2a	K	131151201	Hlubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu hornině tř. skupiny 1 a 2	m3	18,000	416,80	7 502,40
	VV		"výkop splaveného bahna"				
	VV		5*7,2*0,5		18,000		
19	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	23,922	160,60	3 841,87
	VV		18+5,922		23,922		
	VV		Součet		23,922		
25	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,922	288,20	6 894,32
	VV		18+5,922		23,922		
	VV		Součet		23,922		
26	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	191,376	22,00	4 210,27
	VV		(18+5,922)*8 "Přepočtené koeficientem množství"		191,376		
	VV		Součet		191,376		
29	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	47,844	209,00	9 999,40
	VV		"nakládání bahna k vysušení 2x" (18+5,922)*2		47,844		
37	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,922	22,00	526,28
	VV		23,922		23,922		
	VV		Součet		23,922		
31	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	47,844	150,00	7 176,60
	VV		23,922*2		47,844		

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 13
Název změnového listu :	Obetonování potrubí DN1400
Stavba :	1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 – Kalníková šachta K4
Objednatel :	JVS , S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Stavatelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1379/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Kalníková šachta K4

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	změna projektu – původní výměna potrubí DN1400 je nahrazena zaizolováním stávajícího potrubí o obetonováním ŽB C 30/37
Cena změny :	196 850,35 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavatelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	23.03.2021	STAVATELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ S.R.O. K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice IČ: 260 836 044 tel: 602 442 073
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Pavel Chalupa	23.03.2021	S.K. Neumanna 19 (S) 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		23.03.2021	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	23.03.2021	JVS z.s.p.o. S.K. Neumanna 19 (S) 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST Č.13 Obetonování potrubí DN 1400

Stavba:

1379 Odkaľovací jímky na řadu surové vody DN1400 - Kalníková šachta K4

Objekt:

SO-01 Kalníková šachta K4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							196 850,35
D HSV Práce a dodávky HSV							175 129,51
D 2 Zakládání							49 216,00
1a	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	8,000	1 136,00	9 088,00
VV "pod potrubí DN 1400" 8					8,000		
2a	K	273313611R	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	1,500	3 900,00	5 850,00
VV "podkladní beton, ztížené podmínky a čerpání betonu" 1,5					1,500		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	34,461	226,60	7 808,86
10	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	68,922	370,00	25 501,14
48	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,600	485,00	776,00
VV 0,1*(2,4*2+5,6*2)					1,600		
49	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,600	120,00	192,00
D 4 Vodorovné konstrukce							91 650,31
47	K	452323171R	Podkladní bloky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	13,500	3 420,00	46 170,00
VV "včetně čerpání betonu, postupná betonáž"					10,000		
VV 10							
3a	K	452353001R	Opěrná konstrukce bednění o štetovou stěnu	m2	10,000	250,00	2 500,00
VV "zřízení a odstranění"					10,000		
VV 2*5							
4a	K	452353002R	Bednění kapsy pro šrouby šoupěte DN 300, odbednění	kpl	1,000	450,00	450,00
VV "0,5*0,5+0,2*1,2" 1					1,000		
5a	K	452353003R	Odseparování štetové stěny od betonového bloku, OSB deska 22 mm	m2	2,061	510,00	1 051,11
VV "D+M"					2,061		
VV 1,8*2-3,14*0,7*0,7							
6a	K	452353101R	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	22,763	1 200,00	27 315,60
VV "bednění betonového bloku, příplatek za bednění segmenty, odbednění"					22,763		
VV 1,9*5*2+1,9*1,8*2-2*3,14*0,7*0,7							
7a	K	452368211R	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prachů otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari(skrúžený)	t	0,444	31 900,00	14 163,60
VV "skrúžený Kari 10/100/100"					0,444		
VV 0,444							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 850,00
8a	K	949101112R	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,000	150,00	2 850,00
VV "betonáž betonového bloku"					19,000		
VV 1,9*5*2							
D 998 Přesun hmot							31 413,20
133	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	60,410	520,00	31 413,20
D PSV Práce a dodávky PSV							21 720,84
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 183,89
9a	K	711111002R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým, ztížené podmínky	m2	8,792	55,00	483,56
VV "pro ochranu U 140" 8,792					8,792		
10a	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,003	33 520,00	100,56
VV 8,792*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství					0,003		
11b	K	711131821R	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na potrubí, ztížené podmínky	m2	8,792	38,00	334,10
VV "odizolování potrubí od stávající izolace pro aplikaci ochrany sváru z profilu U 140"					8,792		
VV 2*3,14*1,4							
12b	K	711142559R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením kolem potrubí NAIP	m2	8,792	101,60	893,27
VV "izolace ochranného U 140 natavením s ohřevem potrubí DN 1400, s přesahem, ztížené podmínky pod DN 1400"					8,792		
VV 8,792							
13a	M	DEK.1010151220	ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	10,735	122,62	1 316,33
VV 8,792*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					10,735		
146	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšk. do 6 m	t	0,063	890,00	56,07
D 767 Konstrukce zámečnické							18 536,95
14a	K	767995114R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg skrúžený	kg	35,200	105,00	3 696,00
VV "U 140 navařování přes vadný svar, ztížené podmínky" 2,2*16					35,200		
15a	M	13010914R	ocel profilová UE 140 jakost 11 375 včetně skrúžení	kpl	1,000	14 800,00	14 800,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka:

U 140 nelze zakroužit, nutno vyrobit ze tří ks plochých dílů, dvě úseče

vnitřní poloměr r=708 mm,

vnější poloměr r=768 mm

dále chýbaný plech tl. 6 mm 2200 mm×104 mm

Vše svařeno koutovými svary

149	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,039	1 050,00	40,95
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 14
Název změnového listu :	Vyčištění vodoteče a kalníku, odstranění oplocení
Stavba :	1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 – Kalníková šachta K4
Objednatel :	JVS , S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Stavatelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1379/19/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Kalníková šachta K4

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	před dokončením prací na K4, bylo demontováno oplocení, vyčištěna vodoteč a kalníková šachta z důvodu zatopené stavební jámy(přerušení stavebních prací)
Cena změny :	39 631,35 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavatelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	23.03.2021	STAVATELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ S.R.O. K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice IČ:260 60 044 tel: 602 442 073
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	23.03.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		23.03.2021	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	23.03.2021	S. K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ:490 21 117 IČV:0243321117

ZMĚNOVÝ LIST Č.14 Vyčištění vodoteče a kalníku, odstranění oplocení

Stavba:

1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN1400 - Kalníková šachta K4

Objekt:

SO-01 Kalníková šachta K4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 631,35
D	HSV	Práce a dodávky HSV					39 631,35
D	1	Zemní práce					17 702,80
3	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	85,60	4 108,80
	VV		"vyčerpání kalníku dle požadavku zatopeného"				
	VV		2*24		48,000		
	VV		Součet		48,000		
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	85,00	170,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
1a	K	129153101R	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	3,000	1 500,00	4 500,00
	VV		"prohrábka potoka podzim 2020, resp. 12/2020, včetně odstranění zatrubnění"				
	VV		10*0,3		3,000		
25	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,000	288,20	864,60
	VV		10*0,3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
26	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	24,000	22,00	528,00
	VV		3,00*8		24,000		
	VV		Součet		24,000		
29	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	3,000	209,00	627,00
	VV				3,000		
37	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,000	22,00	66,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
31	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	4,800	150,00	720,00
	VV		3,00*1,6		4,800		
2a	K	811441111	Montáž potrubí z trub DN600	m	8,000	764,80	6 118,40
	P		Poznámka k položce: zpětná montáž zatrubnění vodoteče				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					21 512,55
3a	K	952903112	Vyčištění objektů COV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	59,520	45,44	2 704,59
	VV		"vyčištění kalníku od kalu"				
	VV		(4*2+1,9*2)*4,4+1,9*4		59,520		
4a	K	952903119	Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů COV, nádrží, žlabů a kanálů	m2	59,520	25,36	1 509,43
5a	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výškv do 2,0 m	m	40,000	51,71	2 068,40
	VV		"sejmutí pletiva - oplocení bezpečnostní šachty"				
	VV		40		40,000		
6a	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	77,120	94,40	7 280,13
	VV		"vyčištění kalníku včetně armatur s bloky"				
	VV		(4*2+1,9*2)*4,4+4*1,9*2+10		77,120		
7a	K	998001R	Demontáž stávající podpěrné konstrukce potrubí DN 1400	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00
	VV		"ZL 7 - dodatek č. 2 byla provedena montáž, nyní dmtž, odvoz"				
	VV		1		1,000		
8a	K	998002R	Provozovní potrubí odkalení z K4 prům. 300 - dmtž pro vyvutí štětové stěny	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00
	VV		"dmtž potrubí prům. 300 do prostoru výustního objektu 5 bm, po demontáži štětové stěny zpětná montáž dle PD"				
	VV		1		1,000		
D	998	Přesun hmot					416,00
133	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	0,800	520,00	416,00
	VV		313,225		313,225		

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 15
Název změnového listu :	Pronájem pažnic
Stavba :	1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 – Kalníková šachta K4
Objednatel :	JVS , S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Stavatelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1379/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Kalníková šachta K4

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	z důvodu přerušení stavebních prací z požadavku JVS, bylo třeba uhradit pronájem pažnic -6 měsíců
Cena změny :	192 000,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavatelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	23.03.2021	 STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ S.R.O. K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice IČ: 250 60 094 tel: 602 442 877
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	23.03.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		23.03.2021	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	23.03.2021	 S. K. Neumanna 292/19 370 01 České Budějovice IČ: 480 21 117 tel: 380 01 177

ZMĚNOVÝ LIST Č.15 Pronájem pažnic

Stavba:

1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN1400 - Kalníková šachta K4

Objekt:

SO-01 Kalníková šachta K4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							192 000,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				192 000,00
	D	1	Zemní práce				192 000,00
12	K	XPAZ01	Zřízení a odstranění zajišťovací konstrukce stěn výkopu pro zřízení odkalovací šachty - nájemné nad rámec SOD	Kč	1,000	192 000,00	192 000,00
	VV		"nájemné štětových stěn po 1,5 roce od zahájení stavby"				
	VV		" 6 měsíců x 32.000,- = 192000" 1		1,000		

ZMĚNOVÝ LIST

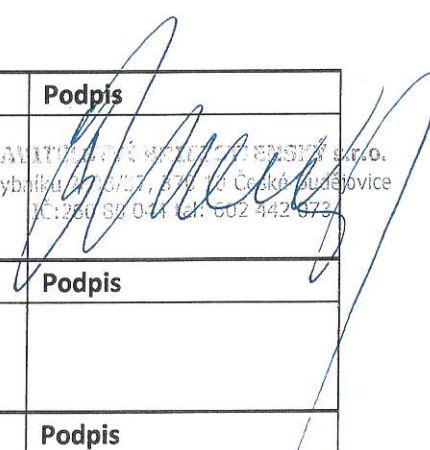

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 16
Název změnového listu :	Vedlejší rozpočtové náklady
Stavba :	1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 – Kalníková šachta K4
Objednatel :	JVS , S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Stavatelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1379/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Kalníková šachta K4

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	z důvodu přerušení stavebních prací, byla prováděna kontrola oplocení a stavu potrubí. Dále byla provedena příprava na demontáž potrubí DN1400. – elektrocentrála, staveništní rozvody EI
Cena změny :	74 200,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavatelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	23.03.2021	 STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ s.r.o. K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice IČ: 250 62 031 tel: 602 442 673
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	23.03.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		23.03.2021	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	23.03.2021	 S. K. Neumanna 292/19 (S) 370 01 České Budějovice IČ: 490 78 117 DIČ: CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST Č.16 Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba: 1379 Odkaľovací jímky na řadu surové vody DN1400 - Kalníková šachta K4
 Objekt: SO-01 Kalníková šachta K4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							74 200,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				27 000,00
1a	K	741001	Staveništní rozvody EI pro potřeby nočního svařování a osvětlení stavby po odvolání nerealizováno	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00
	P		Poznámka k položce: 70 bm 4x25CGSG - přívodní kabel od napojovacího místa EON 2x rozvaděč staveništní rozvody po stavbě ke svárečím agregátům 50 bm rozvody pro noční osvětlení nájem staveništního osvětlení rozvody pro posílení čerpacích souprav záložní zdroje - elektrocentrály 125 kW 2x posílení odběrného místa EON				
	VV		toto vše po odvolání akce demontáže a odvozu "podzim 2020" 1				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				47 200,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				6 000,00
2a	K	045303000	Koordináční činnost	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
	VV		"personální zajištění a koordináční činnost, podzim 2020"1				
	D	VRN9	Ostatní náklady				41 200,00
3a	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	80,000	500,00	40 000,00
	VV		"dohled a hlídání stavby po dobu výluky akce 500Kč/návštěva, 2xza týden, od konce června 2020 do konce března 2021" 40*2				
4a	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
	VV		"kontrola armaturních spojů K4 po vyčerpání a vyčištění K4" 1				

ZMĚNOVÝ LIST

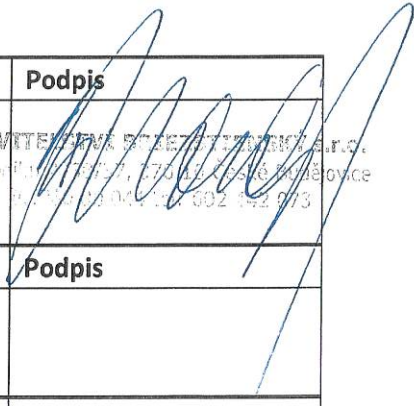

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 17
Název změnového listu :	Montáž potrubí DN1400
Stavba :	1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 – Kalníková šachta K4
Objednatel :	JVS , S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Stavatelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1379/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Kalníková šachta K4

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	z rozhodnutí vedení JVS nebyla provedena výměna potrubí DN 1400 a bylo realizováno obetonování stávajícího potrubí
Cena změny :	- 469 943,10 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavatelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	23.03.2021	 STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ s.r.o. K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice IČ 149025117, DIČ CZ49025117
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	23.03.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		23.03.2021	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	23.03.2021	 S. K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 49025117, DIČ CZ49025117

ZMĚNOVÝ LIST Č.17 Montáž potrubí DN1400

Stavba:

1379 Odkaľovací jímky na řadu surové vody DN1400 - Kalníková šachta K4

Objekt:

SO-01 Kalníková šachta K4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-469 943,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-109 480,00
D	8		Trubní vedení				-109 480,00
75	K	850525921X01	Výřez nebo výsek na potrubí z trub ocelových tlakových s vnější a vnitřní ochrannou vrstvou při opravách DN 1400	kus	-2,000	27 500,00	-55 000,00
P			Poznámka k položce: včetně očištění potrubí pro provedení svalu				
77	K	851521931X01	Vybourání potrubí z trub ocelových svařovaných izolovaných, otevřený výkop DN 1400	m	-4,000	4 590,00	-18 360,00
102	K	891371111XN	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 300	kus	-1,000	7 120,00	-7 120,00
126	K	XVODBEZ0001	Zřízení bezvodí	soubor	-1,000	29 000,00	-29 000,00
D	M		Práce a dodávky M				-360 463,10
D	23-M		Montáže potrubí				-307 663,10
153	K	230011230R01	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 1420 mm, tl. 11,0 mm	m	-4,000	58 800,00	-235 200,00
157	K	230023121	Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 až 13 O 324 mm, tl. 6 mm	kus	-1,000	13 750,00	-13 750,00
162	M	XSIZPETRBAND	petrolátová bandáž Anticor Plast 701-40 150mmx10m	kus	-63,630	650,00	-41 359,50
163	M	XSIZPASAP	páska mechanické ochrany Anticor Plast 732-08 (100mmx20m)	kus	-47,470	180,00	-8 544,60
164	K	230210014X01	Montáž opláštění ruční ovinem páskou za studena - 3-vrstvý systém	m2	-0,283	2 750,00	-778,25
165	M	XSMPOLYKEN9 42-30	pásková plastová PE izolace - třívrstvý systém ve třídě C30	m2	-0,325	2 310,00	-750,75
166	K	XPIZCEM	Dodatečná vnitřní izolace potrubí OC DN1400 cementovou maltou	m	-4,000	1 820,00	-7 280,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-52 800,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				-42 800,00
184	K	043124000	Zkoušky rentgenové	kpl	-1,000	42 800,00	-42 800,00
D	VRN7		Provozní vlivy				-10 000,00
189	K	R71103000	Součinnost provozovatele při stavbě - Pevná cena	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady provozovatele - JVS na součinnost při stavbě tzn. otevírání - zavírání šoupát, vypuštění, napuštění potrubí DN 1400 v délce 1360 m apod. Oceňováno pevnou částkou 10 000,- Kč				
