

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**98107 – Oprava měřících bodů APKO řad Sudoměřice - Hodušín**

Číslo smlouvy objednatele : 98107/21/s0-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : 19/21

1. SMLUVNÍ STRANY**1.1 Zhotovitel :** MIVET, s.r.o.

Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10-Michle

Spisová značka : C 108540 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupený : Milanem Turenou jednatelem

Bc. Vendulou Prausovou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Bc. Vendula Prausová, jednatel

ve věcech technických : Petr Praus, vedoucí výroby

Bankovní spojení : Komerční banka

Číslo účtu : 107-8761460227/0100

IČO : 27363627

DIČ : CZ27363627

Číslo telefonu : 466415042

Číslo faxu : 466415042

Email : mivet@mivet.cz

ID datové schránky : yq9m3s9

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice

Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2ek

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH 973 272,12 Kč

Cena ZL 1 bez DPH 24 247,50 Kč

Cena nová (SOD+ZL) celkem bez DPH 997 519,62 Kč

Cena DPH 21% 209 479,12 Kč

Cena včetně DPH 1 206 998,74 Kč

Dodatek č.1 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL 1

V Praze, dne


30. 08. 2021

Zhotovitel :

MIVET, s.r.o.

Bc. Vendula Prausová

jednatel



MIVET, s.r.o.

Milan Turena

jednatel

MIVET, s.r.o.
Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha-101 Michle
IČ: 273 63 627 DIČ: CZ273 63 627
Tel./fax: 272 761 449 e-mail: mivet@mivet.cz

V Českých Budějovicích, dne 06 -09- 2021

Objednatel :



Jihočeský vodárenský svaz

Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19 (1)

370 01 České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Náhrada řídicí sondy SKAO12 Bežerovice
Stavba :	98107 - Oprava měřicích bodů APKO řad Sudoměřice - Hodušín
Objednatel :	JVS, S. K. Neumann 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Petr Herian JVS
Zhotovitel :	MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Číslo smlouvy :	98107/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01.33 SO2-SKAO

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o náhradu v současné době již nefunkční řídicí sondy stanice katodické ochrany ocelového potrubí řadu Sudoměřice – Hodušín a provedení nového připojení mezi SO2 a potrubím. Závada byla zjištěna v rámci výměny měřicího objektu SO2 SKAO12 Bežerovice. Sonda slouží k řízení správné úrovně ochranného potenciálu ocelového potrubí.
Cena změny :	24 247,50 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace
Příloha č.3 :	graf z dispečinku JVS

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
MIVET, s.r.o.	Ing. Radko Jilemnický	04.08.2021	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	04.08.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	04.08.2021	

MIVET, s.r.o.
 Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10 Michle
 IČ: 273 63 627, DIČ: CZ273 63 627
 Tel./fax: 272 761 444, e-mail: mivet@mivet.cz

Jihočeský vodárenský ústav
 S. K. Neumann 19
 370 01 České Budějovice
 IČ 490 21 117, DIČ CZ490 21 117

Jihočeský vodárenský ústav
 S. K. Neumann 19
 370 01 České Budějovice
 IČ 490 21 117, DIČ CZ490 21 117

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 Náhrada řídicí sondy SKAO12 Bežerovice

Stavba:


98107 Oprava měřicích bodů APKO řad Sudoměřice - Hodušín

Objekt:

SO 01.33 - SO2-SKAO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 247,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							7 903,20	
D 1 Zemní práce							7 903,20	
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	1,200	36,00	43,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,00*3,00*0,20		1,200			
	VV		Součet		1,200			
2	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	15,000	412,00	6 180,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,00*3,00*2,50		15,000			
	VV		Součet		15,000			
3	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny - s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,000	82,00	1 230,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	6,000	71,00	426,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,00*3,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
5	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	6,000	4,00	24,00	CS ÚRS 2019 01
P <i>Poznámka k položce:</i> Úprava terénu po zasypání rýh								
D PSV Práce a dodávky PSV							14 630,00	
D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							14 630,00	
6	K	230250031.2	Montáž měřicí sondy	soubor	1,000	1 026,00	1 026,00	
7	M	35711.2R	Měřicí sonda MS 110 vč kabelu CYKY 3x2,5mm2	kus	1,000	3 590,00	3 590,00	
8	M	341110680	Kabel silový CYKY 4x2mm2 "-M" měřicí vývod potrubí	m	6,000	62,00	372,00	
9	M	341110680	Kabel silový CYKY 4x4mm2 napájení potrubí	m	6,000	87,00	522,00	
10	K	312164170	Aluminitermické připojení + doizolování potrubí	kus	2,000	4 560,00	9 120,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 714,30	
11	K	091604000	Náklady na dopravu	kpl	1,000	1 714,30	1 714,30	

JVS.SKA0.Budejovicka.DT12 Bezervice Body/AI3 EPKAO

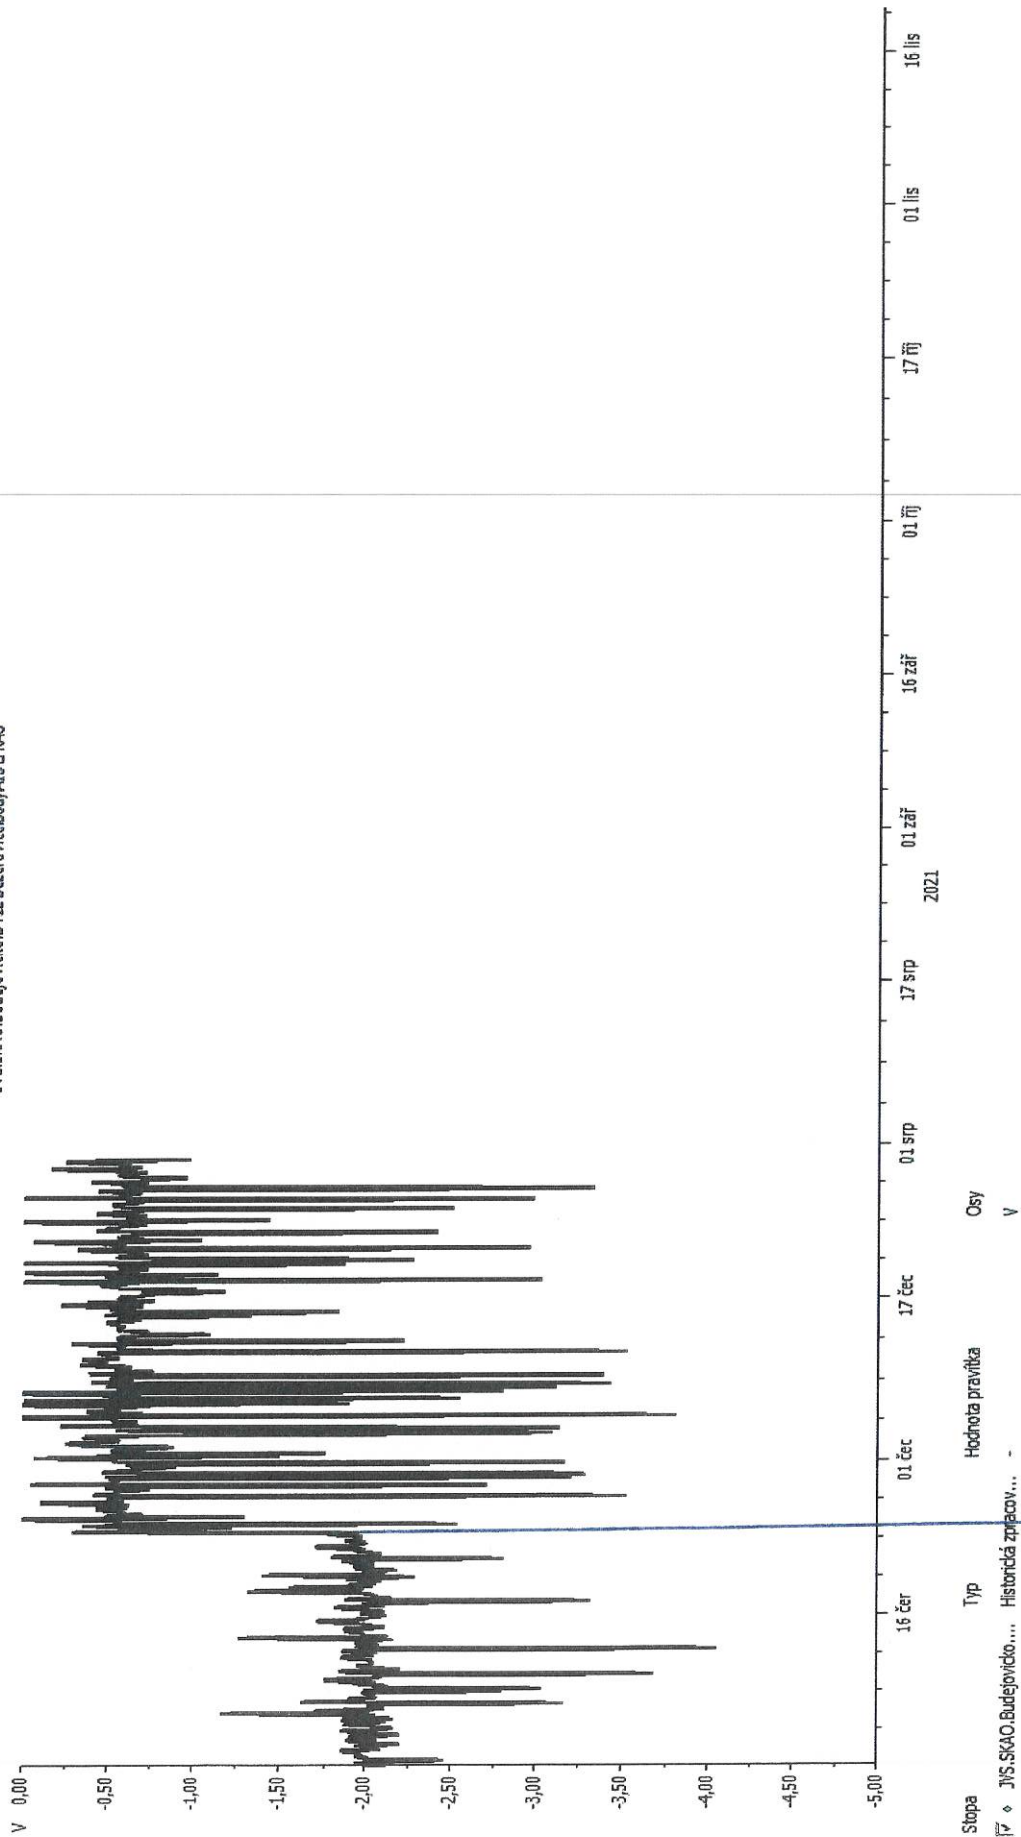


Stopa
JVS.SKA0.Budejovicka.... Historická zpracov....
Typ
Hodnota pravitka
Osy
V


25.6.2021

JVS.SKAO.Budejovicko.DTI2 Bezerovice.Body.A13 BKAO

VÝPNUTO
(MIVET)

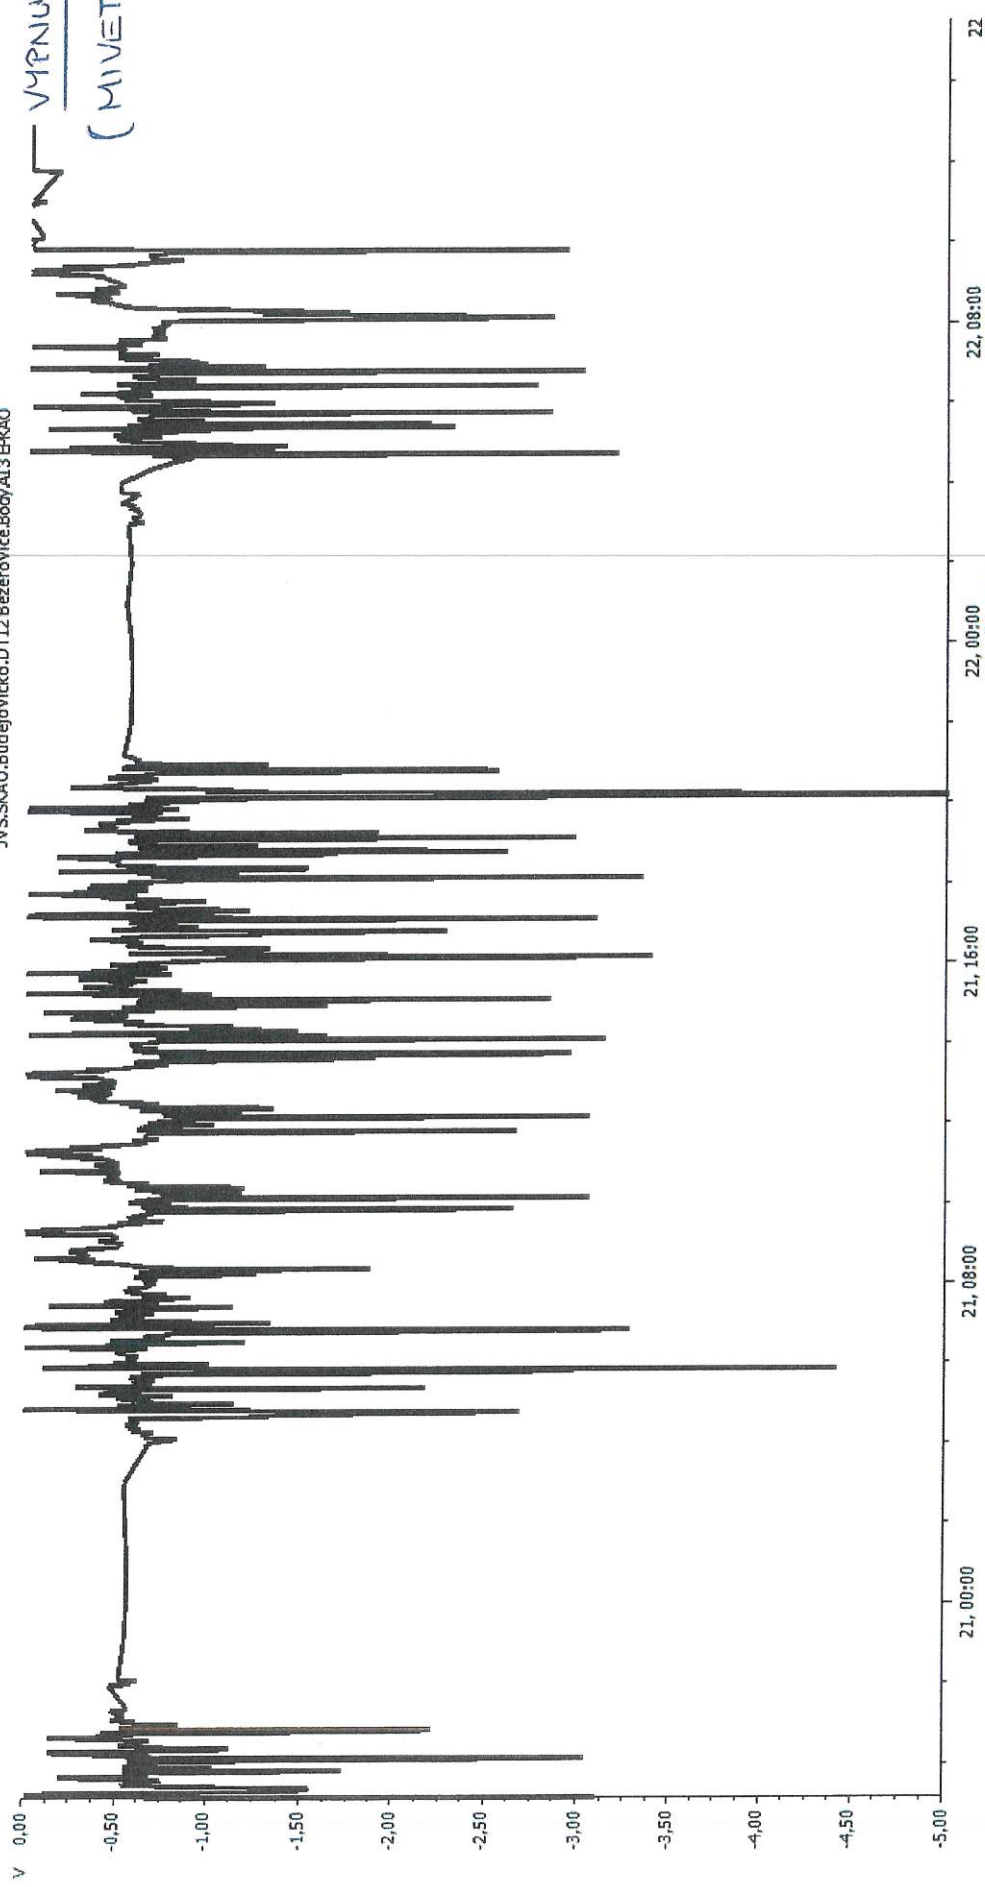


VYPNUTO



ZAPNUTO

(MŮŽE)

JVS.SKAO.Budějovicko.DT12 Bezarovice.BodyA13 SKAO

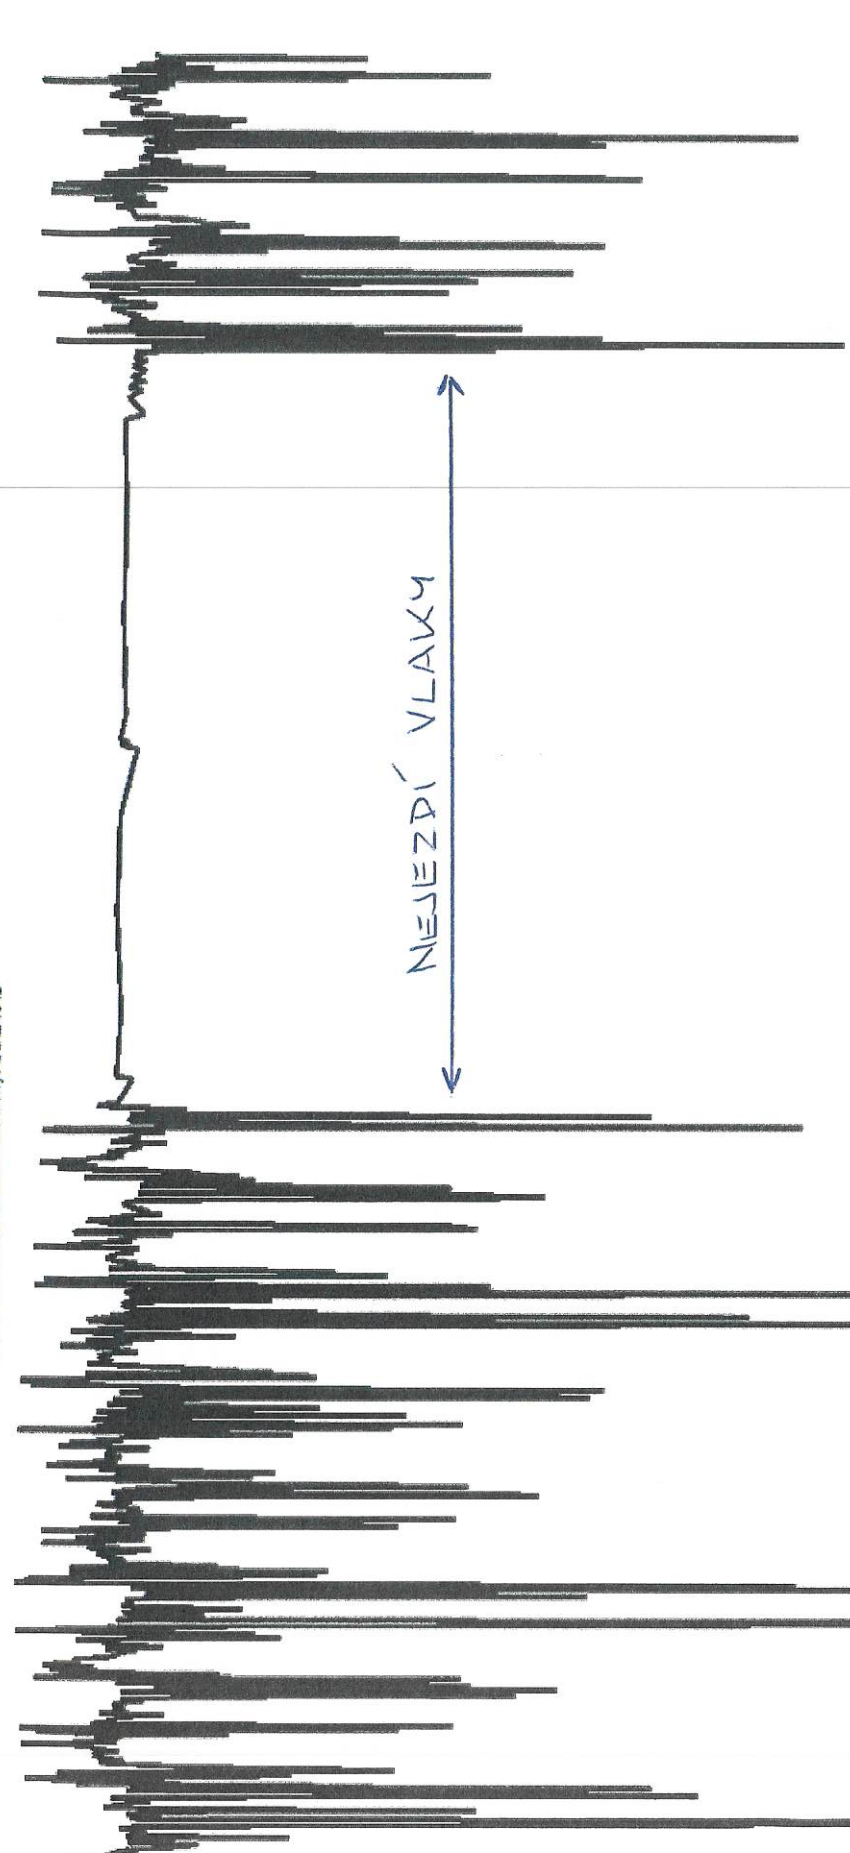

NEJEZDÍ VLAKY

14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00
23 čec 2021

Hodnota drávitka

Osv

V

22.7.2021

su
.228
.959
.154
.103
.199
