



Smlouva o provedení díla

číslo smlouvy zhotovitele: 24/SOD/2013/087 číslo stavby zhotovitele: 924113087

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

adresa:
zastoupený:
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen **Objednatel**)

Město Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
PhDr. Magdou Křivanovou - starostkou města

Ing. Jaroslav Dvořák, vedoucí OIMM
tel. 602 324 500
Milan Kembický
tel. 606 635 719
00270059
CZ00270059
plátce DPH
Komerční banka, a.s.
33628531/0100

a

Zhotovitel

adresa:
**zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka č. 430**
zastoupený:

Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen **Zhotovitel**)

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice
Ing. Martinem Lukešem – ředitelem oblastního
závodu STŘED na základě plné moci

p. Josef Řezníček - výrobní náměstek
tel. 602 381 345

Ing. Milan Orlík - obchodní náměstek
tel. 602 408 287

p. Lukáš Jančárek – stavbyvedoucí
tel. 724 838 997

42196868
CZ42196868
plátce DPH
Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
1080015329/ 0800

Čl. 2 ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1 Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby **Rekonstrukce stávající místní komunikace v úseku od křižovatky ulic Kavánova, Smetanova a v návaznosti na ulici Českobratrská až k plaveckému bazénu v Hlinsku** (viz. projektová dokumentace):

- (1) umístění uličních vpustí
- (2) zřízení nových chodníků a sjezdů
- (3) recyklace za studena na místě
- (4) osazení silniční obruby a vodicího proužku
- (5) pokládka krytové vrstvy
- (6) ohumusování
- (7) dosyp ornici

Realizace zakázky bude provedena v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, a to v rozsahu dle kompletní nabídky zhotovitele ze dne 10.5.2013 a zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace pro provádění stavby, doplněných oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (položkovým rozpočtem). Technické podmínky stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby. PD byla vypracována Ing. Jaroslavem Burešem, Kočí 178, 538 61 Kočí.

Veškeré podklady pro zhotovení stavby uvedené výše budou předány zhotoviteli spolu s podpisem této smlouvy.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.1 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací pro stavební povolení a zadání stavby s podrobnými výkazy výměr, předané Objednatelem Zhotoviteli. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí Smlouvy.

2.1.2 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- 2.1.2.1 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.1.2.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.1.2.3 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- 2.1.2.4 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.1.2.5 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.2.6 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.2.7 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- 2.1.2.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 2.1.2.9 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- 2.1.2.10 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- 2.1.2.11 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 2.1.2.12 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 2.1.2.13 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění.

Čl. 3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Termínem zahájení stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí Staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem. Údaj o předání a převzetí staveniště bude prvním zápisem ve stavebním deníku.
- 3.2 Zhotovitel je povinen započít stavební práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do deseti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.
- 3.3 Termín zahájení je stanoven na **15. července 2013**, pokud se strany následně nedohodnou jinak, nebo pokud z objektivních příčin, které nezapříčinila ani jedna ze smluvních stran, nebude možné termín dodržet.
- 3.4 Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky.
- 3.5 Lhůta plnění je doba ode dne předání Staveniště do Termínu dokončení.
- 3.6 Zhotovitel se zavazuje, že dílo sjednané dle této Smlouvy dokončí a předá nejpozději: **30. září 2013**.
- 3.7 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.8 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

- 3.9 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele a Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.10 Místo plnění je v katastrální území města Hlinsko, pozemková parcela číslo 2601/14, k.ú. Hlinsko v Čechách - Pardubický kraj (viz. projektová dokumentace).

Čl. 4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1 Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla	2 500 829,- Kč bez DPH
Rozpočtová rezerva	200 000,- Kč bez DPH
Cena díla včetně rozpočtové rezervy	2 700 829,- Kč bez DPH
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21%	567 174,- Kč
Celková cena díla včetně rozpočtové rezervy (v základní sazbě 21%)	3 268 003,- Kč s DPH

4.2 Obsah ceny

- 4.2.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 4.2.2 Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 4.2.3 K ceně bude zahrnuta rozpočtová rezerva, pro případ neočekávaných výdajů (víceprací). Čerpání této rezervy musí být odsouhlaseno Objednatelem a Zhotoviteli nevzniká automaticky nárok na její uhrazení.
- 4.2.4 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.6 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.3 Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

- 4.3.2 Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.4 Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
- 4.4.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.4 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

ČI. 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Zálohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. Zálohové faktury nejsou přípustné.

5.2 Postup plateb

- 5.2.1 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně na základě odsouhlasených soupisů stavebních prací. Soupisy prací musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami a stavebním dozorem jako práce dokončené, prosté zjevných vad a nedodělků.
- 5.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádřili se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dn.e příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- 5.2.3 Měsíční fakturaci bude uhrazena do výše 90% z celkové sjednané ceny.
- 5.3 Zádržné (pozastávka) ve výši 10% bude uhrazena po převzetí díla Objednatелеm. Pokud se při předání díla vyskytnou vady a nedodělky, tak úhrada pozastávky proběhne až po jejich úplném odstranění.

5.4 Náležitosti faktury

- 5.4.1 Faktura bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle Zákona o účetnictví a Zákona o DPH v platném znění.
- 5.4.2 Součástí faktury musí být jednoznačná specifikace prací, které byly provedeny a jsou fakturovány, tzn. soupis prací, ve kterém budou podrobně

rozepsány jednotlivé fakturované položky včetně jejich množství a ceny za měrnou jednotku.

5.5 Lhůty splatnosti

Faktury je Zhotovitel povinen vystavit vždy do 10. kalendářního dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 40 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Čl. 6 MAJETKOVÉ SANKCE

6.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.2 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2 Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla

6.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

6.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

6.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

6.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

6.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4 Sankce za nevyklizení staveniště

6.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.4.2 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 30 dnů po obdržení vyúčtování buď pokutu zaplatit nebo sdělit oprávněné straně své námitky. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na úhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

6.5 Sankce za nedodržení splatnosti

Úrok z prodlení za opožděné zaplacení dílčí nebo konečné faktury činí 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. 7 STAVENIŠTĚ

7.1 Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do termínu zahájení stavby nebo do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, přičemž rozhodný je termín, který nastane později. Pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
- 7.1.2 Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.3 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2 Vybudování zařízení staveniště

- 7.2.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.2.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

7.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 7.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací (popř. jiných veřejných ploch) zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 7.3.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 7.3.3 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 7.3.4 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

7.4 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

- 7.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.4.2 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

7.5 Vyklizení staveniště

- 7.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

Čl. 8 STAVEBNÍ DENÍK

8.1 Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 8.1.5 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

- 8.2 Kontrolní dny
- 8.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
 - 8.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a zástupci Zhotovitele.
 - 8.2.3 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
 - 8.2.4 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - 8.2.5 Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
 - 8.2.6 Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

ČI. 9 ZMĚNY V REALIZACI DÍLA

- 9.1 Postup při schvalování změn
- 9.1.1 Zhotovitel je povinen oznámit všechny změny v realizaci díla, a to s dostatečným předstihem před jejich provedením. Součástí oznámení změn bude popis změny, zdůvodnění změny a finanční vyčíslení změny. Zhotovitel je Objednateli musí ohlásit dříve než 10 pracovních dnů před plánovaným provedením změny.
 - 9.1.2 V případě změn, které nemohly být předem očekávány a provedení těchto změn ve vztahu k řádné realizaci projektu nesnese odkladu, je Zhotovitel povinen ohlásit Objednateli nezbytnost změny nejpozději do 2 pracovních dní ode dne jejího zjištění.

ČI. 10 VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

- 10.1 Klasifikace víceprací a méněprací
- 10.1.1 Za vícepráce jsou považovány práce, dodávky a služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla dle této Smlouvy, a to vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu.
 - 10.1.2 Méněpráce jsou práce, dodávky a služby, které jsou zahrnuty v předmětu díla dle této Smlouvy, ale jsou realizovány v menším nebo nulovém rozsahu (při zachování sledovaných parametrů projektu).
 - 10.1.3 Pro uplatnění více či méněprací v průběhu realizace je Zhotovitele povinen zabezpečit, aby:
 - 10.1.3.1 každá více a méněpráce byla řádně a úplně zdokumentována a zaznamenána ve Stavebním deníku nebo jiném adekvátním dokumentu, podepsána technickým dozorem Objednatele.
 - 10.1.3.2 souhrn více a méněprací byl ve finančním vypořádání vzájemně kompenzován, tj. bude proveden jejich vzájemný zápočet.

10.1.3.3 objem víceprací nepřesáhl 10 % celkové sjednané ceny a současně nebyl vyšší než objem méněprací, a to ani v rámci měsíční fakturace.

Čl. 11 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

11.1 Pokyny Objednatele

11.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

11.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

11.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

11.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

11.3.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

11.3.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

11.3.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11.4 Podmínky při změně subdodavatele

V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je povinen Zhotovitel změnu nahlásit a doložit, že nový subdodavatel splňuje podmínky dané zákonem o veřejných zakázkách. V opačném případě není změna subdodavatele možná.

11.5 Další podmínky pro zajištění řádného plnění

Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými českými technickými normami, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků. Předmětné stavební práce budou provedeny v souladu s ustanoveními následujících dokumentů (dokumenty jsou seřazeny v sestupném pořadí, tzn. že ustanovení dokumentů uvedených výše v pořadí jsou nadřazena ustanovením dokumentů uvedených v pořadí nižším):

- české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy
- evropská technická schválení

- obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie
 - mezinárodní normy, nebo
 - jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.
- 11.5.1 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný výrobek a materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a který nemá požadovanou certifikaci, je-li pro jeho použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen dílo provést v obvyklé kvalitě při použití nových nepoužitých zařízení a výrobků.
- 11.5.2 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, technického či autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 11.5.3 Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.

ČI. 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Organizace předání díla
- 12.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.1.2 Od data převzetí přechází odpovědnost za škody způsobené provozováním předaného díla na Objednatele a současně začíná běžet lhůta pro uplatnění odpovědnosti za vady a nedodělky a záruka.
- 12.1.3 Nedokončenou dodávku nebo její část není Objednatel povinen převzít.
- 12.1.4 Odevzdání a převzetí předmětu plnění bude prováděno jako celek, případně může probíhat po jednotlivých zcela dokončených dílčích etapách nebo objektech, schopných samostatného užívání. V případě dílčích přejímek bude dohodnut způsob užívání předaných částí a podmínky provádění dalších prací v předané části objektu.
- 12.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 12.2.1 O průběhu předávacího a převímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 12.2.2 Zhotovitel je povinen připravit k převímacímu řízení nezbytné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, atesty na materiál, originály stavebních a montážních deníků. Nepředložení potřebných dokladů bude považováno za vadu, bránící užívání stavby.
- 12.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad
- 12.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 12.2.5 Objednatel je oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 12.2.6 Zhotovitel zajistí průběžnou fotodokumentaci, která bude zachycovat stav před realizací, průběh výstavby a výsledný stav po realizaci. Tuto fotodokumentaci předá Objednateli při předání a převzetí díla.

Čl. 13 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

13.1 Odpovědnost za vady díla

- 13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost vadu bezplatně odstranit.
- 13.1.2 Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce 60 kalendářních měsíců a začíná běžet dnem protokolárního předání díla.
- 13.1.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 13.1.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 13.1.5 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 13.1.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování Objednatelem a jím určenými osobami v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost

těchto podkladů zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití písemně trval.

- 13.1.7 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
- 13.1.8 Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
- 13.1.9 Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav Zhotovitel nenese odpovědnost.
- 13.1.10 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci, popř. je v rozporu se stavebním povolením, touto smlouvou, jejími přílohami, výsledky zadávacího řízení, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Dílo se považuje za vadné již ke dni jeho předání a převzetí v případě, že nebude příslušným orgánem veřejné správy zkolaudováno.
- 13.1.11 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.
- 13.1.12 Zhotovitel poskytne, resp. tímto poskytuje, Objednateli záruku, že:
- veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,
 - veškeré dodané zboží, technologická zařízení a materiály,
 - veškeré provedené stavební a montážní práce,
 - veškeré poskytnuté služby,

budou prosty jakýchkoliv vad a Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla a které byly v míře stanovené touto smlouvou Objednatelem schváleny.

13.2 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 13.2.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 13.2.2 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 13.2.3 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 13.2.4 Pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení Obchodního zákoníku a ujednání této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou

formou. Vyhlášení konkurzu na Zhotovitele je důvodem pro odstoupení od smlouvy.

ČI. 14 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 14.1 Vlastnictví díla
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 14.2 Nebezpečí škody na díle
Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

ČI. 15 VYŠŠÍ MOC

- 15.1 Definice vyšší moci
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 15.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

ČI. 16 ZMĚNA SMLOUVY

- 16.1 Forma změny smlouvy
- 16.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

ČI. 17 Odstoupení od smlouvy

- 17.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 17.2 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení smlouvy:
- 17.2.1 prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 90 dnů,

- 17.2.2 nepředložení dokladů Zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu Objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- 17.2.3 pokud Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, Objednatel zjednání nápravy požadoval a Zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem.
- 17.3 Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 17.4 Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 17.5 Odstoupí-li Objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:
 - 17.5.1 Objednatel ve lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - 17.5.2 Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
 - 17.5.3 Zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
 - 17.5.4 Zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá Objednateli k odsouhlasení,
 - 17.5.5 Objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení,
 - 17.5.6 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
 - 17.5.7 Objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
 - 17.5.8 Zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací Objednatelem,
 - 17.5.9 Zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči Objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
 - 17.5.10 Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. V. této smlouvy.

Čl. 18 ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- 18.1 Smlouva a nabývá platnost a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
- 18.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 18.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 80 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 18.4 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo Objednatele od smlouvy odstoupit.
- 18.5 Zavínil-li vznik škody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterém není Objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění, odškodnit, ochránit a zbavit Objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 18.6 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit Objednateli informace o tom, pokud by technický dozor Objednatele vykonávala osoba s ním propojená nebo sám Zhotovitel. Takovýto stav je důvodem pro odstoupení Objednatele od smlouvy.
- 18.7 Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní Objednatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li Zhotovitel Objednatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k sjednané ceně v této smlouvě.
- 18.8 Obě strany předem souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím) a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) se zpřístupněním a zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
- 18.9 Projektovou dokumentaci poskytnutou Objednatelem Zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může Zhotovitel použít pouze pro

provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá Objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.


- 18.10 Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení této smlouvy jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného.
- 18.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá ze smluvních strana obdrží po dvou.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Protokol o změně díla - vzor změnového listu
2. Oceněný položkový rozpočet + příloha rozpočtu - situace výměr

V Hlinsku dne 28.6.2013


Za Objednatele


PhDr. Magda Křivanová
Starostka města



V Chrudimi dne 10.5.2013

Za Zhotovitele


M - SILNICE a.s. ⑫
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovareň 611, 537 01 Chrudim

Ing. Martin Lukeš
ředitel oblastního závodu STŘED

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Zhotovitel:

Investor:

Datum:

Název akce:

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Počet připojených listů specifikací: _____

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
,- Kč	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
_____	_____	
Datum:	Datum:	

Krycí list soupisu prací – položkový rozpočet

Název stavby:	Oprava MK Smetanova - výběrové ř		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava místní komunikace a chodníku		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Hlinsko	Zhotovitel:	Výběrové řízení	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	01.05.2013	Konec výstavby:	30.11.2013	Položek: 87
JKSO:		Zpracoval:	J. Bureš	Datum: 03.03.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž		Rezerva 5%	200000	Provozní vlivy
"M"	Dodávky		Vytýčení sítí		Ostatní
	Montáž		Geodet. zaměření		NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		2 500 828,56	DN celkem	200000	NUS celkem

Základ 0%			
Základ 14%	DPH 14%	2 700 828,56	Celkem bez DPH
Základ 21%	DPH 21%	3 268 002,56	Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

M - NICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 681 DIČ: CZ4219668
oblastní úřad STŘED
Za Plzeňskem 537 01 Chýstka

Stavební soupis prací – výkaz výměr - rekapitulace

Název stavby: **Oprava MK Smetanova - výběrové řízení**

Objednatel:

Druh stavby: Oprava místní komunikace a chodníku

Projektant:

Lokalita: Hlinsko

Zhotovitel: Výběrové řízení

Zpracoval: J. Bureš

Zpracováno dne: 03.03.2013

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	47 947,00	47 947,00	0,00
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	199 947,00	199 947,00	771,46
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	7 217,10	7 217,10	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	19 203,72	19 203,72	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	7 360,00	7 360,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	5 772,80	5 772,80	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	45,46	3 004,54	3 050,00	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry	1 319,84	5 980,16	7 300,00	0,03
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	134 753,29	81 488,71	216 242,00	356,44
	57	Kryty šterkových a živichných komunikací a ploch	665 820,43	67 439,57	733 260,00	441,00
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	25 138,49	165 008,51	190 147,00	77,09
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunika	12 506,32	1 455,68	13 962,00	0,36
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc	60 863,05	28 086,97	88 950,02	101,12
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních	195 861,02	104 206,98	300 068,00	187,76
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	36 522,66	36 522,66	0,00
	M46	Zemní práce při montážích	28 370,53	36 042,97	64 413,50	0,09
	S	Přesuny sutí	0,00	219 491,20	219 491,20	0,00
		Ostatní materiál	339 974,56	0,00	339 974,56	400,85

Celkem:

2 500 828,56

Soupis prací – položkový rozpočet

Název stavby: Oprava MK Smetanova - výběrové řízení

Doba výstavby: 214 dní

Objednatel:

Druh stavby: Oprava místní komunikace a chodníku

Začátek výstavby: 01.05.2013

Projektant:

Lokalita: Hlinsko

Konec výstavby: 30.11.2013

Zhotovitel: Výběrové řízení

JKSO:

Zpracováno dne: 03.03.2013

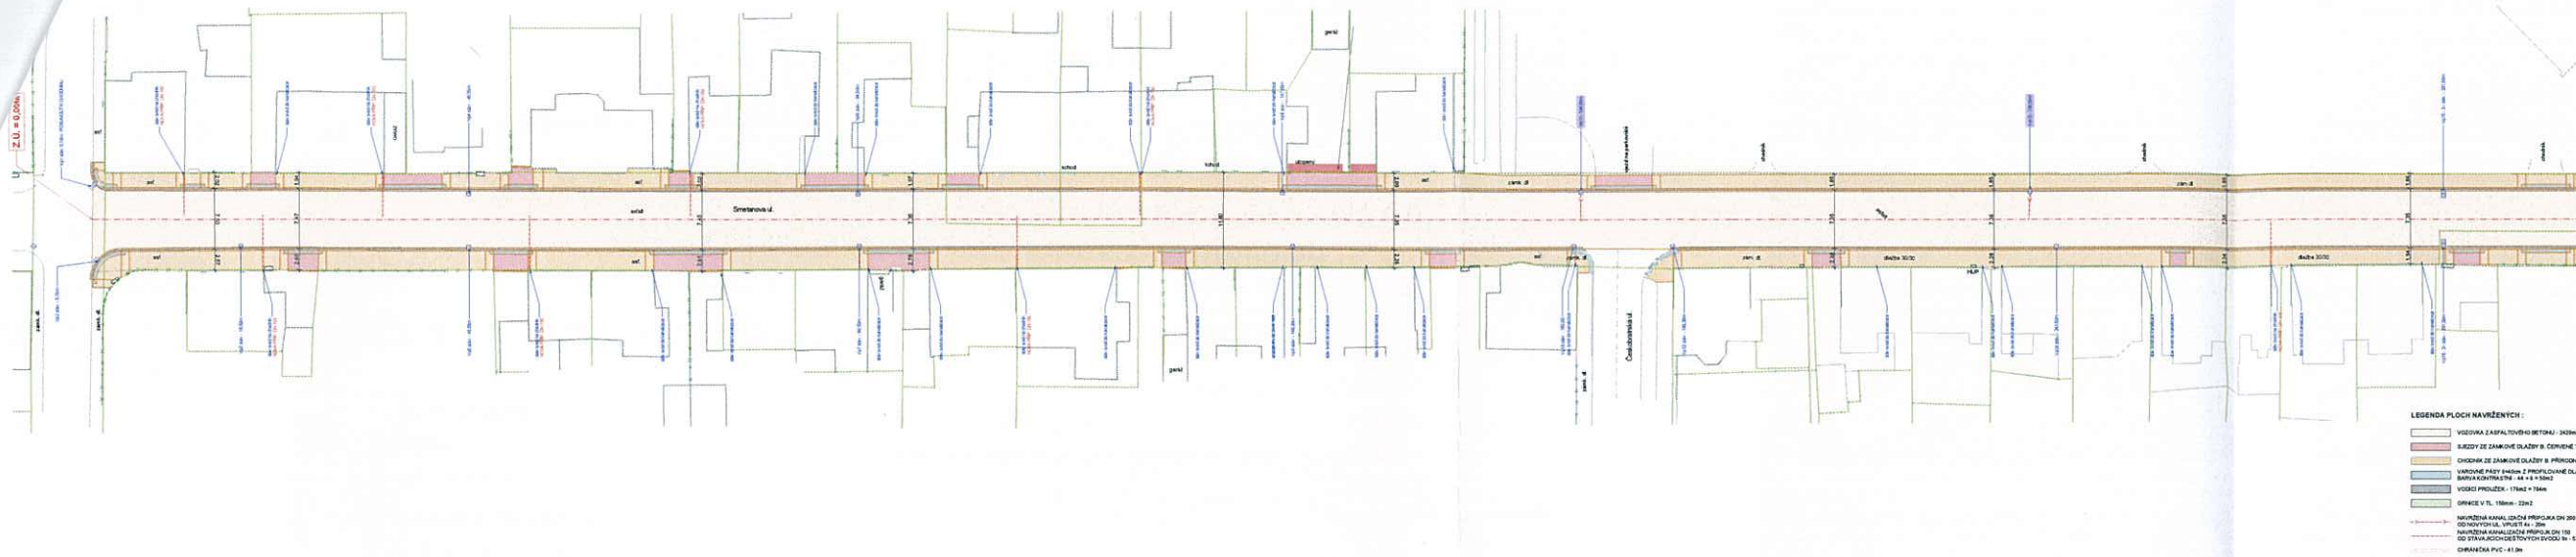
Zpracoval: J. Bureš

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	011123110R00	Vytýčení stavby - soubor				0,00	47 947,00	47 947,00		0,00
2	011123110R00	Vytýčení sítí - soubor	m3	1,00	21153	0,00	21 153,00	21 153,00	0,00	0,00
3	011123110R00	Geometrické zaměření stavby - soubor	m3	1,00	12692	0,00	12 692,00	12 692,00	0,00	0,00
11		Přípravné a přídružené práce	m3	1,00	14102	0,00	14 102,00	14 102,00	0,00	0,00
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho - výkres č. 10	m2	210,00	12	0,00	199 947,00	199 947,00		771,46
5	113106521R00	Rozebrání zámkové dlažeb nad 200 m2, kamenivo - výkres č. 10	m2	318,00	18	0,00	2 520,00	2 520,00	0,14	28,98
6	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm - výkres č. 10	m2	752,00	76	0,00	5 724,00	5 724,00	0,20	63,60
7	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm - výkres č. 10	m2	752,00	31	0,00	57 152,00	57 152,00	0,23	169,20
8	113151314R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm - výkres č. 10	m2	2 593,00	29	0,00	23 312,00	23 312,00	0,10	73,70
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých - 325+331+5,5+3,5+3+4	m	672,00	44	0,00	75 197,00	75 197,00	0,13	331,90
10	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových - 160+6	m	166,00	39	0,00	29 568,00	29 568,00	0,15	97,44
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	6 474,00	6 474,00	0,04	6,64
11	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení - 27x1,5x0,6	m3	24,30	297	0,00	7 217,10	7 217,10	0,00	0,00
13		Hloubené vykopávky				0,00	7 217,10	7 217,10		0,00
12	132101101R00	Hloub. rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 - obruby dočistit - 672x0,35x0,05	m3	11,76	153	0,00	19 203,72	19 203,72		0,00
13	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 přípoky svody - 52,0x0,6x1,4	m3	43,68	153	0,00	1 799,28	1 799,28	0,00	0,00
14	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 nové přípoky - 20,0x0,6x1,40	m3	16,80	153	0,00	6 683,04	6 683,04	0,00	0,00
15	132201102R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 příp. stáv. vpustí - 50x0,6x1,40	m3	42,00	153	0,00	2 570,40	2 570,40	0,00	0,00
16	132201109R00	Příplatek za lepicost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 - suma pol. 12-15	m3	115,00	15	0,00	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00
16		Přemístění výkopku				0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m - pol. 16	m3	115,00	2	0,00	7 360,00	7 360,00		0,00
18	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m - pol.16	m3	115,00	60	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - pol.16	m3	115,00	2	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
17		Konstrukce ze zemin				0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku - pol.16	m3	115,00	13	0,00	5 772,80	5 772,80		0,00
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním -(52+20+50)x0,6x0,8	m3	58,60	73	0,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00
18		Povrchové úpravy terénu				0,00	4 277,80	4 277,80	0,00	0,00
22	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině - výkres č. 10	m2	50,00	11	45,46	3 004,54	3 050,00		0,00
23	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 - pol. 22	m2	50,00	17	0,00	504,54	550,00	0,00	0,00
24	181301102R00	Dovoz a nákup ornice - pol. 22	m2	50,00	33	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
21		Úprava podloží a základové spáry				0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
25	212971122R00	A a M pásu novopové izolace š. 35cm kolem obj. RD - 250x0,40	m2	100,00	73	1 319,84	5 980,16	7 300,00	0,00	0,03
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				1 319,84	5 980,16	7 300,00		0,03
26	561251111R00	Recyklace podkladu za studena cem. poj 2,5-4% 15 cm - výkres č. 10	m2	2 420,00	49	134 753,29	81 488,71	216 242,00		356,44
27	564231111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tl. 10 cm (stáv. dlažba) - výkres č. 10	m2	318,00	53	51 923,67	66 656,33	118 580,00	0,00	0,00
28	564251111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm (živ. chod.) - výkres č. 10	m2	752,00	84	14 273,05	2 580,95	16 854,00	0,20	64,36
29	564251111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tl. 15 cm (chod. z dlaždic) - výkres č. 10	m2	210,00	84	53 591,00	9 577,00	63 168,00	0,30	228,31
		Kryty šterkových a živičných komunikací a ploch				14 965,57	2 674,43	17 640,00	0,30	63,76
						665 820,43	67 439,57	733 260,00		441,00

30	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m ² - pol. 26	m ²	2 420,00	8	17 378,64	1 981,36	19 360,00	0,00	1,72
31	577162114R00	Beton asfaltový ACO 16 (ABH I), nad 3 m, tl. 7 cm - pol. 26	m ²	2 420,00	295	648 441,79	65 458,21	713 900,00	0,18	439,28
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				25 138,49	165 008,51	190 147,00		77,09
32	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm - výkres č. 10 (1131+6)	m ²	1 137,00	141	20 523,93	139 793,07	160 317,00	0,06	63,05
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm - výkres č. (10146+44)	m ²	190,00	157	4 614,56	25 215,44	29 830,00	0,07	14,04
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				12 506,32	1 455,68	13 962,00		0,36
34	870200010R00	Výřez sedla pro kanalizační přípojky DN 200 - viz. kanalizace (info cena)	kus	0,00	482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	871313121RT2	D a M trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 (dešť. svody) - 52m (pol.13)	m	52,00	102	4 660,44	643,56	5 304,00	0,00	0,12
36	871353121RT2	D a M trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 (nové příp.) - 20-4	m	16,00	138	2 000,89	207,11	2 208,00	0,00	0,06
37	871353121RT2	D a M trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 (stáv. příp.) - pol. 15 (50m)	m	50,00	129	5 844,99	605,01	6 450,00	0,00	0,18
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				60 863,05	28 086,97	88 950,02		101,12
38	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky (nové) - výkres č. 10	kus	4,00	2828	9 495,90	1 816,10	11 312,00	2,93	11,72
39	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včet. dod. (stáv. vpustí) - výkres č. 10	kus	14,00	746	8 767,26	1 676,74	10 444,00	2,93	41,01
40	895941311RT2	Odstranění stáv. uliční vpustí - výkres č. 10 (pol. 39)	kus	14,00	912	10 718,13	2 049,87	12 768,00	2,93	41,01
41	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg (stávající) - výkres č. 10 (pol. 39)	kus	14,00	581	125,35	8 008,65	8 134,00	0,01	0,13
42	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky - výkres č. 10 (pol. 38)	kus	4,00	2471	8 239,57	1 644,43	9 884,00	0,12	0,48
43	899331111R00	Výšk. úpr. vstupu do 20 cm, zvýš. poklopu šachty - objekt kanál. (info cena)	kus	0,00	930	0,00	0,01	0,01	0,43	0,00
44	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu vpustí (info cena)	kus	0,00	843	0,00	0,01	0,01	0,43	0,00
45	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte - výkres č. 10	kus	20,00	488	5 354,13	4 405,87	9 760,00	0,32	6,38
46	935326111R00	D a M ostat. mater. k vpustí Ronn - tech. zpráva	m	2,00	466	683,22	248,78	932,00	0,03	0,05
47	935326111R00	D a M žlabu Ronn SF (KE) 100/ C250 do bet. lože s opěrami - tech. zpráva	m	8,00	711	4 169,65	1 518,35	5 688,00	0,03	0,20
48	935326111R00	D a M pozink. roštu Ronn SF (KE) 100 C 250 - tech. zpráva	m	8,00	1633	9 576,70	3 487,30	13 064,00	0,01	0,08
49	935326111R00	D a M vpustí žlabu Ronn SF (KE) 100/ C 250 - tech. zpráva	m	2,00	2418	3 545,11	1 290,89	4 836,00	0,03	0,05
50	936172112R00	Osazení doplňk. ocel. konstrukcí do 50 kg (okna u RD) - výkres č. 10 (4)	kus	4,00	532	188,03	1 939,97	2 128,00	0,00	0,01
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				195 861,02	104 206,98	300 068,00		187,76
51	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. B12,5, 25 cm - výkres č. 10 (176x1/0,25)	m	704,00	141	61 227,97	38 036,03	99 264,00	0,08	57,95
52	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou - výkres č. 10	m	188,00	151	20 375,36	8 012,64	28 388,00	0,11	19,92
53	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m - výkres č. 10 (5,5+3,5+3+8)	m	20,00	15	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
54	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 - výkres č. 10 (pol. 51)	m	704,00	225	107 721,10	50 678,90	158 400,00	0,15	104,12
55	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků š.80mm, s opěrou, lože z BP 12,5 - výkres č. 10	m	28,00	213	4 055,86	1 908,14	5 964,00	0,15	4,14
56	919726213R00	Těsnění spár krytu asphalt. zálivkou za tepla - výkres č. 10 (12,5+12,5+13)	m	38,00	123	455,23	4 218,77	4 674,00	0,00	0,00
57	919735112R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 5 - 10 cm - výkres č. 10 (pol. 56)	m	38,00	81	2 025,50	1 052,50	3 078,00	0,04	1,62
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	36 522,66	36 522,66		0,00
58	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	544,74	9	0,00	4 902,66	4 902,66	0,00	0,00
59	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živichý	t	1 020,00	15	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
60	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živiché, příplatek do 5 km	t	1 020,00	16	0,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00
	M46	Zemní práce při montážích				28 370,53	36 042,97	64 413,50		0,09
61	460010024RT4	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru - výkres č. 10	km	0,70	36895	6 266,02	19 560,48	25 826,50	0,00	0,00
62	460200223RT2	Výkop kabelové rýhy 50/40 cm hor.3 (chránička) - 27x1,5	m	41,00	177	0,00	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00
63	460510271RT1	D a M žlabu kabel. z PVC KRASTEN, rovná část (chránička) - výkres č. 10	m	36,00	666	19 355,36	4 620,64	23 976,00	0,00	0,08
64	460510272RT1	D a M žlabu kabel. z PVC KRASTEN, oblouková část (chránička) - výkres č. 10	m	5,00	700	2 749,15	750,85	3 500,00	0,00	0,01
65	460560224RT1	Zához rýhy 50/40 cm, štěrkodrtí se zhutněním	m	41,00	78	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00
66	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy do 5 km - 41x0,5x0,4	m ³	10,25	64	0,00	656,00	656,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí				0,00	219 491,20	219 491,20		0,00
67	979082318R00	Vod.dopr. sutí a hmot po suchu do 6km (bet. podklad a obruby) - 97,44+6,64+169,2	t	273,28	151	0,00	41 265,28	41 265,28	0,00	0,00
68	979082318R00	Vod.dopr. sutí a hmot po suchu do 6km (stáv. bet. zám. dl.a dlaždice) - 28,98+63,60	t	92,58	151	0,00	13 979,58	13 979,58	0,00	0,00
69	979082318R00	Vod.dopr. sutí a hmot po suchu do 6km (živice chod. a vozov.)	t	405,57	151	0,00	61 241,07	61 241,07	0,00	0,00
70	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot - pol. 67	t	273,28	9	0,00	2 459,52	2 459,52	0,00	0,00
71	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot - pol. 68	t	92,58	9	0,00	833,22	833,22	0,00	0,00
72	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot - pol. 69	t	405,57	9	0,00	3 650,13	3 650,13	0,00	0,00
73	979091221R00	Vodorovné přemístění sutí za každý další 1 km - pol. 72	t	405,57	122	0,00	49 479,54	49 479,54	0,00	0,00

74	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění - pol. 67+68	t	365,89	6	0,00	2 195,34	2 195,34	0,00	0,00
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti (bet. podklad a obruby) - 97,44+6,64+169,2	t	273,28	92	0,00	25 141,76	25 141,76	0,00	0,00
76	979990001R00	Popl. za skládku stavební suti (asfalt z chodníku) - pol. 7	t	73,70	51	0,00	3 758,50	3 758,50	0,00	0,00
77	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti (stáv. zámk. dl. a dlaždice) - 28,98+63,60	t	92,58	92	0,00	8 517,36	8 517,36	0,00	0,00
78	979990001R00	Popl. za skládku stavební suti (živ. fréz. vozovka) - pol. 8	t	331,90	21	0,00	6 969,90	6 969,90	0,00	0,00
Ostatní materiál						339 974,56	0,00	339 974,56		400,85
79	58337332	Štěrkopisek frakce 0-22 - zásypy rýh - {(52+16+50)x0,6x0,8} x 2,02	T	114,42	180	20 595,60	0,00	20 595,60	1,00	114,42
80	592162116	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní - 704x2x1,01	kus	1 422,00	39	55 458,00	0,00	55 458,00	0,02	32,71
81	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm - 704x1,01	kus	711,00	85	60 435,00	0,00	60 435,00	0,08	54,66
82	59217330	Obrubník záhonový BO 5-25 1000x50x250 mm - 188x1,01	kus	190,00	53	10 070,00	0,00	10 070,00	0,03	5,13
83	59217465	Obrubník parkový Granitoid ABO 100/8/25 II nat. - 28x1,01 (pol. 54)	kus	29,00	64	1 856,00	0,00	1 856,00	0,05	1,39
84	59245110R	Dlažba bet. zámk. přírodní (cihla) tl. 60mm - 1131x1,01	m2	1 142,00	121	138 182,00	0,00	138 182,00	0,14	159,88
85	59245266R	Dlažba bet. zámk. barevná (cihla) tl. 80mm - 146x1,01	m2	148,00	201	29 748,00	0,00	29 748,00	0,18	26,05
86	59245267R	Dlažba bet. zámk. barevná pro nevidomé tl. 60mm - 6x1,01	m2	6,06	394	2 387,64	0,00	2 387,64	0,13	0,79
87	59245267R	Dlažba bet. zámk. barevná pro nevidomé tl. 80mm - 44x1,01	m2	44,44	478	21 242,32	0,00	21 242,32	0,13	5,82
Celkem:								2 500 828,56		

NAVRŽENÝ STAV



SOUČASNÝ STAV

