		Jméno	Trvání	Začátek	Konec	…	J…
1		**Stavba**	**232…**	**9.6.14…**	**28.4.1…**		
2		otevření obálek Stavba	0 dní	9.6.1…	9.6.1…		
3		dokončení VVŘ stavba	31 dní	9.6.1…	21.7.…		
4		podpis SOD stavba	0 dní	23.7.…	23.7.…		
5		Začátek stavby	0 dní	30.7.…	30.7.…		
6		demolice	23 dní	30.7.…	29.8.…		
7		zakládání a hydroizolace	32,5…	11.8.…	24.9.…		
8		spodní stavba a sítě pod	30 dní	4.8.1…	12.9.…		
9		poslední úpravy projektu podlah od sceno	0 dní	1.10.…	1.10.…	…	
10		podlahy, včetně sítí	65 dní	1.9.1…	28.11…		
11		vyzdívky a stěny	67,6…	1.9.1…	4.12.…		
12		střecha a krovy, izolace	77 dní	14.8.…	28.11…		
13		výplně otvorů	82,6…	5.8.1…	27.11…		
14		technické rozvody	69,2…	1.9.1…	5.12.…		
15		schodiště	104,…	1.9.1…	23.1.…		
16		technické zařízení budovy	153,…	15.9.…	16.4.…		
17		vnitřní omítky a povrchy	50 dní	24.11…	30.1.…		
18		povrchy podlah	55,5…	28.10…	13.1.…		
19		Předání expo prostor Sceno a mob	0 dní	27.2.…	27.2.…		
20		fasády	122…	27.10…	14.4.…		
21		venkovní sítě	44,5…	1.8.1…	2.10.…		
22		venkovní úpravy ploch a teras	162…	11.9.…	24.4.…		
23		ostatní venkovní úpravy	41,3…	2.3.1…	28.4.…		
24		Kolaudace	0 dní	30.3.…	30.3.…		
25		**Vybavení a nábytek stavby**	**166…**	**1.9.14…**	**20.4.1…**		
26		dílenská dok.	45 dní	1.9.1…	31.10…		
27		schválení vzorků	4,88…	27.10…	31.10…		
28		doměření na stavbě	9,88…	19.1.…	30.1.…		
29		výroba	93,8…	3.11.…	12.3.…		
30		instalace	25,8…	16.3.…	20.4.…		
31		**Mobilář sceno**	**185…**	**1.9.14…**	**15.5.1…**		
32		dílenská dok	45 dní	1.9.1…	31.10…		
33		prototypy a vzorky,výběr AV/ světla , zkušební instalace	50 dní	6.10.…	12.12…		
34		výroba	96,8…	31.10…	16.3.…		
35		instalace	32,8…	2.3.1…	15.4.…	…	
36		zkušební provoz	22 dní	16.4.…	15.5.…		
37		podklady stavbě	22,1…	1.9.1…	1.10.…		
38		**Výtvarné vizual řešení /AV Produkce**	**185…**	**1.9.14…**	**15.5.1…**		
39		AV koncepce, scénář, odsouhlasení	55 dní	1.9.1…	14.11…		
40		participace na zkušebních instalacích, potvrzení výběru AV zařízení a světel	50 dní	6.10.…	12.12…		
41		obrazové podklady (obstarání)	45 dní	1.9.1…	31.10…		
42		výroba	106,…	31.10…	30.3.…		
43		instalace	32,8…	2.3.1…	15.4.…		
44		zkušební provoz	22 dní	16.4.…	15.5.…		
45		**Výtvar vizual řešení – Expoziční grafika**	**185…**	**1.9.14…**	**15.5.1…**		
46		koncept návrhu, manuál, odsouhlasení	45 dní	1.9.1…	31.10…		
47		participace na zkušebních instalacích	50 dní	6.10.…	12.12…		
48		vytvoření podkladů pro tisky	65,8…	31.10…	30.1.…		
49		dohled nad výrobou tisku kontrola výroby	19,8…	2.2.1…	27.2.…		
50		instalace	32,8…	2.3.1…	15.4.…		
51		zkušební provoz	22 dní	16.4.…	15.5.…		
52		**Výtvarně vizuální řešení – výtvarné dekorace**	**185…**	**1.9.14…**	**15.5.1…**		
53		výtvarný návrh, dílenská dokumentace – odsouhlasení	45 dní	1.9.1…	31.10…		
54		participace na zkuš. instalacích, vzorky a prototypy	50 dní	6.10.…	12.12…		
55		výroba	96,8…	31.10…	16.3.…		
56		instalace	32,8…	2.3.1…	15.4.…		
57		zkušební provoz	22 dní	16.4.…	15.5.…		
58		Otevření Centra	0 dní	15.5.…	15.5.…		

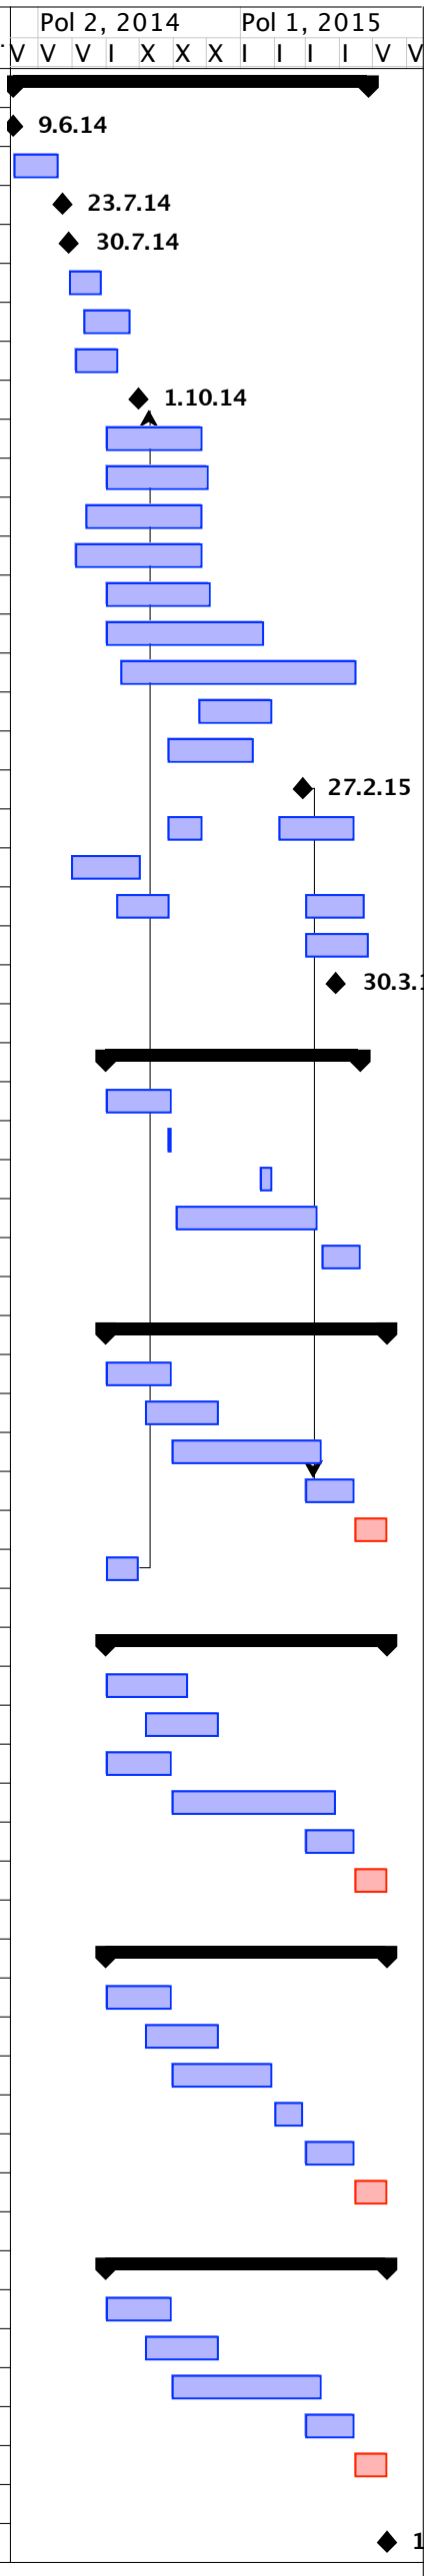

Digitálně podepsáno
Jméno: Lenka Fialová
Datum: 16.06.2014 16:26:23
