

Smlouva o dílo

veřejné zakázky na projektové práce a inženýrskou činnost

Stavba

91146 - Oprava centrálního sání čerpadel v ČS ÚV Plav

Objednatel :

Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 292/19
370 01 České Budějovice



SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy **objednatele** : 91146/23/p0

Číslo smlouvy **zhotovitele** : 12-3272-0100

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel :** Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300
IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2ek
dále také jen „**objednatel**“
- Zhotovitel :** Sweco a.s.
Táborská 31, 140 16 Praha 4
Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený : Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva
Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva
Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : 2 člen. představenstva/písemně pověř. člen
ve věcech technických : Ing. František Mádl, hlavní inženýr projektu
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 1700041/0100
IČO : 264 75 081
DIČ : CZ 264 75 081
Číslo telefonu : 261 102 242
Email : paha@sweco.cz
ID datové schránky : i2cegr3
dále také jen „**zhotovitel**“

dále také **objednatel** a **zhotovitel** dohromady jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“

- 1.2 Osoby oprávněné za **objednatele** jednat ve věci této smlouvy, konkrétně ve věcech technických :

Jaroslav Gazda - územní inspektor, +420 602 697 527, gazda@jvs.cz

Pavel Chalupa - technik, +420 601 122 102, chalupa@jvs.cz

Vladimír Sedláček - přípravář staveb, +420 608 609 168, sedlacek@jvs.cz

- 1.3 Osoby oprávněné za **zhotovitele** jednat ve věci této smlouvy, konkrétně ve věcech technických :

Jméno a příjmení: Ing. František Mádl

Pozice : hlavní inženýr projektu

Mobil : +420724160534

Email : frantisek.madl@sweco.cz

- 1.4 Smluvní strany jsou oprávněny k jednostranné změně osob oprávněných je zastupovat ve věcech smluvních a technických dle odst. 1.1 tohoto článku této smlouvy a osob je oprávněných zastupovat dle odst. 1.2 – 1.3 tohoto článku této smlouvy, a to jednostranným písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

2. PREAMBULE

- 2.1 Tato smlouva je uzavřena dle ustanovení občanského zákoníku upravujících smlouvu o dílo (§ 2586 a násl. občanského zákoníku); práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- 2.2 **Objednatel** má v úmyslu realizovat stavbu s těmito výchozími údaji:

a) Název stavby : Oprava centrálního sání čerpadel v ČS ÚV Plav

b) Místo stavby : k.ú. Plav

c) Investor : Jihočeský vodárenský svaz

d) Předpokládaná doba realizace : 18 měsíců

(dále také jen „stavba“)

- 2.3 **Účelem této smlouvy je zajištění projektových prací a inženýrské činnosti pro přípravu a při realizaci stavby** (dále také jen „účel smlouvy“).

- 2.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

a) **Příloha č. 1: „Výkony dle fází“**, ve které jsou specifikovány jednotlivé fáze přípravy a realizace stavby a s těmito jednotlivými fázemi související projektové práce a inženýrské činnosti (dále také jen „Příloha č. 1“)

b) **Příloha č. 2: „Další výkony“**, ve které jsou specifikovány další výkony související s přípravou a realizací stavby (dále také jen „Příloha č. 2“)

c) **Příloha č. 3: „Autorský dozor“**, ve které je specifikována kalkulace nákladů na autorský dozor projektanta (dále také jen „Příloha č. 3“)

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 **Zhotovitel** se tímto zavazuje pro realizaci účelu této smlouvy za podmínek sjednaných v této smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí pro **objednatele** dílo

spočívající v provedení projektových prací a inženýrské činnosti,

**které jsou v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 ve sloupci „ANO/NE“ označeny „ANO“,
a to dle specifikace v odst. 3.2 až 3.6. tohoto článku této smlouvy
a dalších podmínek sjednaných touto smlouvou
(dále také jen „dílo“)**

- 3.2 Dílo bude prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy. Dílo musí být prováděno tak, aby stavba realizovaná na jeho základě splňovala všechny základní požadavky na územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb stanovené obecně závaznými právními předpisy a požadavky na dodržení Zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Právními předpisy stanovujícími výše uvedené požadavky na danou stavbu jsou zejména (nikoliv však pouze):

- a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- b) Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
- c) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“)
- d) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
- e) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- f) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
- g) Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů
- h) Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
- ch) Vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Vyhláška č. 169/2016 Sb.“)
- i) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
- j) Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- k) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dále předpisy týkající se BOZP zejména (nikoliv však pouze):

- a) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- b) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

c) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek k BOZP

d) Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

e) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Dále **Zásadami sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací** se rozumí

a) požadavek, na nalezení ekonomicky přijatelných řešení, která umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky

b) požadavek, na nalezení ekonomicky přijatelných řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky

- 3.3 Při provádění díla bude **zhotovitel** respektovat připomínky a požadavky **objednatele**, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů.
- 3.4 Provádění díla bude dle potřeby konzultováno s **objednatelem**.
- 3.5 **Projektové dokumentace**, které jsou součástí prováděného díla v rámci projektových činností, budou prováděny takto:
- 3.5.1 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy. Projektová dokumentace bude zpracována dle příslušných platných ČSN (tj. min. ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO) v částech závazných i směrných. Odchytky technického charakteru, které nejsou v rozporu s požadavky právních předpisů, musí být vždy písemně odsouhlaseny **objednatelem**, resp. příslušným orgánem.
- 3.5.2 Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán Vyhláškou č. 499/2006 Sb. Součástí projektové dokumentace bude grafická a textová část.
- 3.5.3 Součástí projektové dokumentace bude:
- a) **oceněný položkový rozpočet** obsahující soupis prací, dodávek a služeb (pořadové číslo položky v zestupně v nepřerušené číselné řadě, číselné zatřídění položky, popis položky, měrná jednotka, množství v měrné jednotce, výkaz výměr k uvedenému množství) oceněný dle, v době zpracování rozpočtu platné, Cenové soustavy ÚRS
- b) **neoceněný položkový rozpočet** obsahující soupis prací, dodávek a služeb
- Položkové rozpočty budou zpracovány dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., v kalkulačním programu KROS 4, s využitím, v době zpracování rozpočtu platné, Cenové soustavy ÚRS.
- 3.5.4 Projektová dokumentace bude po jejím zpracování **zhotovitelem** **objednateli** předána v písemné i grafické podobě, a to v počtu vyhotovení dle Přílohy č.1 a č.2 v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, přičemž výkresová část bude zhotovena ve formátu *.dwg (ver.min.2007), textové části budou zpracovány v programu MS Word ve formátu *.doc, nebo *.docx a tabulkové části budou zpracovány v programu MS Excel ve formátu *.xls, nebo *.xlsx. Veškeré výkresy i texty budou dále převedeny do *.pdf, včetně všech příloh (vyjádření dotčených orgánů, organizací, správců sítí,

apod.). Označení (číslování a popis) jednotlivých souborů bude korespondovat se seznamem příloh.

- 3.6 Předmětem **inženýrských činností**, které budou prováděny v rámci projektových činností jsou (zejména nikoliv však pouze):
a) projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení
- 3.7 **Objednatel** předal **zhotoviteli** pro provádění díla tyto podklady:
a) Základní informace pro zadání stavby, z 06/2022

a **zhotovitel** prohlašuje, že se s těmito podklady seznámil a zároveň prověřil, že podklady nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je možno provést za cenu a v čase sjednaném v této smlouvě.

4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 4.1 **Zhotovitel** se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy. **Zhotovitel** prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla dle této smlouvy.
- 4.2 **Zhotovitel** je povinen bezodkladně písemně upozornit **objednatele** na jakékoliv změny při provádění díla, které budou v rozporu s podklady dle čl. 3. odst. 3.7. této smlouvy, včetně vysvětlení všech konkrétních dopadů na ostatní části díla. Tyto změny s **objednatelem** následně projedná a o výsledku projednání vyhotoví zápis, který podepíší obě smluvní strany.
- 4.3 **Zhotovitel** se zavazuje po podpisu této smlouvy předložit platnou uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za způsobenou újmu v souvislosti s prováděním a provedením díla dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním v minimální výši 5 000 000 Kč tak, aby toto pojištění trvalo po celou dobu účinnosti této smlouvy, tj. do doby uplynutí záruční doby dle čl. 7. odst. 7.2. této smlouvy. Náklady pojištění nese **zhotovitel** a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle této smlouvy. Originál nebo ověřenou kopii dokladu pojistné smlouvy předloží **zhotovitel** **objednateli** do 10 dnů od uzavření této smlouvy. **Zhotovitel** se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
- 4.4. Odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s prováděním a provedením díla dle této smlouvy nese **zhotovitel** v plném rozsahu.
- 4.5 **Zhotovitel** je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, určeným **objednatelem** (bude-li ustanoven dle příslušného Zákona), jak ve fázi při přípravě stavby, tak i ve fázi realizace stavby. **Zhotovitel** je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP všechny potřebné podklady nutné pro jeho činnost a dále je povinen zapracovat všechna opatření navržená koordinátorem BOZP do projektové dokumentace.
- 4.6 **Zhotovitel** je povinen spolupracovat se zpracovatelem plánu BOZP, určeným **objednatelem** (bude-li ustanoven dle příslušného Zákona), jak ve fázi při přípravě stavby, tak i při případné aktualizaci plánu BOZP ve fázi realizace stavby. **Zhotovitel** je povinen poskytnout zpracovateli plánu BOZP všechny potřebné podklady nutné pro jeho činnost a dále je povinen zapracovat všechna opatření navržená zpracovatelem plánu BOZP do projektové dokumentace.

- 4.7 **Zhotovitel** je povinen svolat nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy vstupní výrobní výbor za účasti zástupců **objednatele**, za účelem technické konzultace o předmětu smlouvy při zahájení projektových prací. V případě potřeby nebo na vyzvu **objednatele** je **zhotovitel** povinen svolat výrobní výbory i ve stadiu rozpracovanosti díla dle této smlouvy.
Zápis ze vstupního výrobního výboru a ze všech dalších výrobních výborů ve stadiu rozpracovanosti díla zpracovává volnou formou **zhotovitel**.
- 4.8 **Zhotovitel** je povinen předložit **objednateli** k připomínkování Projektové práce (PČ) (tak, jak jsou definovány Přílohou č. 1 této smlouvy) v rozsahu dle Vyhl. 499/2006 Sb., včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v termínech dle Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy – Maximální doba plnění.
- 4.9 **Zhotovitel** bere na vědomí, že **objednatel** může v průběhu realizace stavby, pro kterou se projektová dokumentace dle této smlouvy zhotovuje, požadovat po **zhotoviteli** další projekční práce, jejichž nutnost provedení vznikne z objektivních a nepředpokládaných důvodů při realizaci stavby, a zavazuje se tyto pro **objednatele** provést.
- 4.10 **Zhotovitel** je povinen informovat **objednatele** o potřebě provedení doplňujících činností, které nejsou specifikovány v Příloze č. 1 a 2 této smlouvy a které jsou potřebné pro řádné provedení díla. Jestliže **zhotovitel** poruší svou povinnost dle předchozí věty a v průběhu následné realizace stavby vznikne **objednateli** v důsledku tohoto porušení povinnosti **zhotovitele** škoda v důsledku neúplných, nesprávných nebo neprovedených doplňujících činností (např., nikoliv však pouze, inženýrsko-geologický průzkum, stavebně technický průzkum, geodetické zaměření apod.), pak za tuto škodu zodpovídá **zhotovitel**.

5. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 5.1 **Objednatel** je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že **zhotovitel** porušuje své povinnosti z této smlouvy, může požadovat, aby **zhotovitel** zjednal okamžitou nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak **zhotovitel** v přiměřené lhůtě mu k tomu **objednatelem** stanovené a postup **zhotovitele** by vedl k podstatnému porušení této smlouvy, je **objednatel** oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.2 **Objednatel** se zavazuje za provedení díla dle této smlouvy zaplatit **zhotoviteli** cenu sjednanou touto smlouvou.
- 5.3 **Objednatel** se zavazuje předat **zhotoviteli** veškeré, **objednateli** dostupné, podklady a informace potřebné pro řádné provedení díla dle této smlouvy.
- 5.4 **Objednatel** se zavazuje poskytnout **zhotoviteli** nezbytnou součinnost pro provádění díla.

6. DOBA PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- 6.1 Práce na provedení díla budou **zhotovitelem** zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a ukončeny v den ukončení stavebních prací na stavbě, tj. po odstranění poslední vady či nedodělku z převímacího řízení (dále také jen „Doba provádění díla“). **Objednatel** předpokládá, že posledním dnem Doby provádění díla bude nejpozději **30.11.2026** (dále jen „předpokládaný termín dokončení stavby“). Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že provedení

díla dle této smlouvy neskončí předpokládaným termínem dokončení stavby, ale bude ukončen v souladu s první větou tohoto odstavce tohoto článku této smlouvy, tj. posledním dnem Doby provádění díla.

- 6.2 **Zhotovitel** se zavazuje provádět dílo po částech, když částí se rozumí vždy projektové práce a inženýrská činnost v rámci jedné fáze realizace stavby dle Přílohy č. 1 této smlouvy nebo každý dílčí další výkon dle Přílohy č. 2 této smlouvy. Dílo je provedeno řádným provedením jeho poslední části.
- 6.3 Dílo nebo jeho části jsou řádně provedeny jeho/jejich dokončením a předáním **objednateli** bez vad. **Objednatel** se zavazuje dílo nebo jeho části převzít pouze v případě, že budou bez vad.
- 6.4 **Zhotovitel** se zavazuje dílo, resp. jeho části, řádně provést v termínech, které jsou stanoveny v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy ve sloupci „MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ“. Řádně provedené dílo, resp. jeho části, předá **zhotovitel** **objednateli** v těchto stanovených termínech v sídle **objednatele** **objednatelem** pověřené osobě, o čemž bude pořízen předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Nebude-li dílo nebo jeho části provedeny řádně, tj. bez vad, **objednatel** dílo nepřevzme a své výhrady a důvody nepřevzetí uvede v příslušném předávacím protokolu.

Důvody nepřevzetí díla nebo jeho částí:

- 6.4.1 Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování (dle Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy):
- projektové práce předložené k připomínkování nejsou vypracovány dle předmětu smlouvy a nejsou vypracovány v souladu s čl. 4.8 této smlouvy.
- 6.4.2 Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze (dle Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy):
- finální verze projektových prací není vypracována dle předmětu smlouvy nebo nemá zapracovány všechny relevantní připomínky **objednatele**, které **objednatel** **zhotoviteli** předal po kontrole projektových prací předložených k připomínkování.
- 6.4.3 Inženýrská činnost (IČ) (dle Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy):
- příslušná inženýrská činnost není vypracována dle předmětu smlouvy.
- 6.4.4 Další výkony (dle Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy):
- příslušný další výkon není vypracován dle předmětu smlouvy.
- 6.5 Převzetím řádně provedeného díla, resp. jeho části, **objednatelem**, nabývá **objednatel** vlastnické právo k dílu, resp. jeho části.
- 6.6 **Zhotovitel** není v prodlení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Termíny řádného provedení díla, nebo jeho částí či částí, dle tohoto článku této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízení, jejichž rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření je **zhotovitel** povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely této smlouvy rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného rozhodnutí, závazného stanoviska či vyjádření. **Zhotovitel** je povinen **objednatele** o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.
- 6.7 **Zhotovitel** není v prodlení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u **objednatele**. Termíny řádného provedení díla, nebo jeho částí či částí, dle tohoto článku této smlouvy se prodlužují o dobu, kterou vyvolalo zdržení na straně **objednatele**.

- 6.8 **Objednatel** si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla, resp. jeho částí či částí. Bude-li mít postup **objednatele** dle předchozí věty vliv na termíny řádného provedení díla, nebo jeho částí či částí, dle tohoto článku této smlouvy, termíny řádného provedení díla, resp. jeho částí či částí, se přiměřeně prodlouží.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1 Práva **objednatele** z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.2 **Zhotovitel** poskytuje na provedené dílo, resp. na jeho jednotlivé části, záruku za jakost se záruční dobou v délce dle Přílohy č. 1 a v Přílohy č. 2 této smlouvy ve sloupci „ZÁRUČNÍ DOBA“.
- 7.3 **Zhotovitel** je povinen započít s odstraněním vad vytknutých **objednatel**em v záruční době do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení **objednatele** o vadě. Vada bude **zhotovitelem** odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací.
- 7.4 Neodstraní-li **zhotovitel** vadu ve stanovené lhůtě, je **objednatel** oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu nebo odstranit vady sám a **zhotovitel** je povinen náklady takto vynaložené **objednateli** v plné výši uhradit.
- 7.5 **Zhotovitel** je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese **zhotovitel** náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
- 7.6 Oznámení o odstranění vady předá **zhotovitel** **objednateli** písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne **zhotovitel** **objednateli** záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 7.2. tohoto článku této smlouvy.

8. CENA

- 8.1 Cena za provedení díla je sjednána na základě cenové nabídky **zhotovitele** dohodou smluvních stran takto:

Cena bez DPH	2 642 696 ,- Kč
Sazba DPH	21%
DPH	554 966 ,- Kč

Cena včetně DPH 3 197 662 ,- Kč

Dále také jen „cena“.

- 8.2 Cena dle odst. 8.1. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná. Změna ceny je možná pouze:

- a) **v případě změny sazby DPH**, a to o částku odpovídající snížení nebo zvýšení sazby DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady **zhotovitele** související s provedením díla dle této smlouvy
- b) **v případě změny rozsahu díla** dle požadavku **objednatele**, a to na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Ocenění změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku bude provedeno dle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 3 této smlouvy a skutečného množství potřebných činností (doba strávená na cestě, doba strávená na stavbě, doba potřebná pro projekční práce, cestovné).

c) u **FÁZE č. 9** - Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby - Výkon občasného autorského dozoru (AD) dle Příloh č. 1 – 3 této smlouvy pak **v případě, že z důvodů nikoliv na straně zhotovitele nebude dodržen předpokládaný termín dokončení stavby.**

V takovém případě je **zhotovitel** oprávněn do konce Doby provádění díla s účinností od následujícího kalendářního měsíce po marném uběhnutí předpokládaného termínu dokončení stavby poprvé a následně každoročně navýšit jednotkové ceny uvedené u **FÁZE č. 9** - Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby - Výkon občasného autorského dozoru (AD) v Přílohách č. 1 a 3 této smlouvy bez DPH o částku odpovídající inflačnímu koeficientu. Inflační koeficient bude určen pomocí veřejné databáze Českého statistického úřadu jako meziroční index (v %) růstu cen tržních služeb klasifikace M 71 – Architektonické a inženýrské služby; technické služby a analýzy za období roku, ve kterém má nastat předpokládaný termín dokončení výstavby, zjištěný ze sloupce „Průměr/od počátku roku“, který bude zveřejněn do konce následujícího kalendářního měsíce po marném uběhnutí předpokládaného termínu dokončení stavby. V době uzavření této smlouvy je zvolený meziroční index možné zjistit z internetových stránek Českého statistického úřadu na adrese: <https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=CEN06A3&katalog=31784&z=T&f=TABULKA&skupId=4149&pvo=CEN06A3&evo=v3381 ! CEN06A2-2022 1&evo=v3348 ! TRZSLU1a2-CISEL 1>.

Pro odstranění výkladových pochybností s aplikací tohoto ujednání slouží tento demonstrativní výpočet:

<i>předpokládaný termín dokončení stavby:</i>	<i>30. 11. 2026</i>
<i>jednotková cena bez DPH:</i>	<i>850,- Kč</i>
<i>inflační koeficient:</i>	<i>7,2 %</i>
<i>navýšená jednotková cena:</i>	<i>850 * 107,2 % = 911,20 Kč</i>
<i>navýšení poprvé za měsíc:</i>	<i>prosinec 2026 (fakturováno v lednu 2027)</i>

další každoroční navýšení vždy za měsíc prosinec (od prosince 2027)

- 8.3 Cena je součtem cen za jednotlivé části díla, které jsou stanoveny v Příloze č. 1 této smlouvy ve sloupci „CENA FÁZE“ a v Příloze č. 2 této smlouvy ve sloupci „CENA“.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1 **Zhotovitel** je oprávněn požadovat úhradu části ceny za každou řádně provedenou část díla, a to ve výši stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy ve sloupci „CENA FÁZE“ a v Příloze č. 2 této smlouvy ve sloupci „CENA“.

S výjimkou fáze č. 9 - Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby - Výkon občasného autorského dozoru (AD), kde je **zhotovitel** oprávněn požadovat měsíční úhradu skutečných nákladů na cestovné, výkon projektanta/ů na cestě a výkon projektanta/ů, a to sumárně do celkové výše ceny za Fázi číslo 9. stanovené v Příloze č. 1 ve sloupci „CENA FÁZE CELKEM“.

- 9.2 Podkladem pro úhradu ceny díla nebo části ceny dle odst. 9.1. této smlouvy je daňový doklad – faktura, kterou **zhotovitel** vystaví nejpozději do 5 dnů po řádném provedení díla a jeho protokolárním převzetí **objednatelem** dle čl. 6. odst. 6.4. této smlouvy.

- 9.3 Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.4 Splatnost daňového dokladu – faktury se sjednává v délce 21 dnů od jejího doručení **objednateli**. Za den doručení se považuje den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny **objednatele**.
- 9.5 **Objednatel** je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit **zhotoviteli** daňový doklad – fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo která obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet po vystavení a doručení **objednateli** nového daňového dokladu – faktury **zhotovitelem**.
- 9.6 Zálohy na cenu se neposkytují. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2611 občanského zákoníku. S výjimkou fáze č.9 - Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby - Výkon občasného autorského dozoru (AD).
- 9.7 Cena nebo části ceny budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet **zhotovitele** uvedený v daňovém dokladu – faktuře.

10. SANKCE

- 10.1 Bude-li **objednatel** v prodlení s úhradou daňového dokladu – faktury, je **zhotovitel** oprávněn účtovat **objednateli** úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti, a to až do doby zaplacení dlužné částky, a **objednatel** je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.
- 10.2 Bude-li **zhotovitel** v prodlení s předáním díla, resp. jeho části, dle čl. 6. odst. 6.4. této smlouvy, je **zhotovitel** povinen zaplatit **objednateli** smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné části díla uvedené ve sloupci „CENA FÁZE“ v Příloze č. 1 této smlouvy či „CENA“ v Příloze č. 2 této smlouvy za každý jednotlivý den prodlení po termínu předání řádně provedeného díla, resp. jeho části, a to až do doby takového předání.
- 10.3 Bude-li **zhotovitel** v prodlení s odstraněním reklamované vady, je **zhotovitel** povinen zaplatit **objednateli** smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý den prodlení a každý jednotlivý případ reklamované vady.
- 10.4 V případě porušení závazků či povinností **zhotovitele** dle této smlouvy je **objednatel** oprávněn požadovat na **zhotoviteli** zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení a **zhotovitel** se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu **objednateli** zaplatit.
- 10.5 V případě porušení požadavků na dodržení „Zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací“ **Zhotovitel** zaplatí **objednateli** smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý případ porušení zásad sjednaných v čl.3., bodu 3.2
- 10.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok **objednatele** na náhradu újmy vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním či opomenutím **zhotovitele**, které je sankcionováno sjednanou smluvní pokutou. Smluvní strany se pro takový případ dohodly na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku.

- 10.7 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy povinná osoba obdrží písemnou výzvu oprávněné strany k zaplacení. Výzva k zaplacení se považuje za doručenou okamžikem, kdy se dostane do dispozice povinné strany. V případě písemné výzvy zasílané poštou se má za to, že se výzva dostala do dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence zastižena a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na provozovně držitele poštovní licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s výzvou byla uložena k vyzvednutí.

11. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1 Závazky stanovené k ochraně informací **objednatele**, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi **objednatele**, platí i po zániku závazků z této smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak.
- 11.3 Pro případ, že by dílo nebo jeho část naplnilo znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **zhotovitel** poskytuje **objednateli** podpisem této smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho části ve smyslu § 2358 občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. **Zhotovitel** tímto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoliv část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru **objednatele**.

12. REGISTR SMLUV

- 12.1 **Zhotovitel** bere na vědomí, že Jihočeský vodárenský svaz je právnickou osobou, v níž mají většinovou účast obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, a proto se na tuto smlouvu v souladu s § 3 odst. 2 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Zákon“), nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Výjimka“).

13. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, veškeré písemnosti týkající se této smlouvy budou zasílány všem účastníkům této smlouvy doporučenou zásilkou na adresy jejich sídla uvedené v záhlaví této smlouvy, když se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, a byla-li odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.


- 13.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 13.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 13.4 Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.5 **Zhotovitel** není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky **objednatele** vůči němu. **Zhotovitel** není oprávněn postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. **Zhotovitel** nemůže tuto smlouvu bez souhlasu **objednatele** dále postupovat.
- 13.6 **Zhotovitel** bere na vědomí povinnosti **objednatele** dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. Smluvní strany si v rámci vzájemného projednávání sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.

V Praze, dne 30.11.2023

V Českých Budějovicích, dne 12-12-2023

Zhotovitel :

Sweco a.s.
ústředí Praha
Taborska 31, 140 16 Praha 4



Sweco a.s.
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva



Sweco a.s.
Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

Objednatel :

Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ
předseda představenstva a ředitel

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 28.11.23

č. usnesení 324/7

ověřeno Princ

Příloha č.1 - Výkony dle fázi

CENA CELKEM
2 403 696 Kč
Relativníhace
2 642 696 Kč

vynikuje uchraceť u "ANO"

	Studie a práce obecného charakteru		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
	0.1 a)	0.1.1 a) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování - Zpracování studií obnoveného a prostorového řešení environmentálních jednotlivých objektů - Zpracování studií vnitřního vyhlášení objektů - Zpracování studií technologických zařízení - Zpracování studií pro podnikatelský záměr - Zpracování studií technico - ekonomických	NE				kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie	
0 a)	STU	0.1.2 a) Projektové a obdobné práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Studie - Zpracování studií pro podnikatelský záměr - Zpracování studií technico - ekonomických					kalendářních dnů, ode dne předání přílohu		
0.2 a)		Inženýrská činnost (IČ)	NE				viz: MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ (dle 0.1.1 a)	měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie	
1	Zabezpečení vstupních podkladů		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
	1.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování Sromaznění podkladů a stanovení a objasnění záhlavních údajů Zabezpečení (= sjednání) potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace	ANO	48 000 Kč	96 000 Kč	NEUPLATNĚ SE	průběžně, podle potřeby, po celou dobu zpracování všech fází Projektových prací (PČ)		NEUPLATNĚ SE
0 b)	Environmental Impact Assessment		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
	0.1 b)	Projektové a obdobné práce (PČ) - předložení k připomínkování Projektové a obdobné práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a koncepci předložených po 1. 4. 2015)	NE				kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy kalendářních dnů, ode dne předání přílohu	měsíců, od data převzetí stavby	
2	EIA		NE				kalendářních dnů pro předání dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze Dokumentace EIA	měsíců, od data převzetí stavby	
	0.2 b)	Inženýrská činnost (IČ)							
3	Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP)		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
	3.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP Vypracování Společné dokumentace uzemnění rozhodnutí a stavebního povolení (rozsaň dle relevantních Příloh č.8, č.9, č.11 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	NE				kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy kalendářních dnů, ode dne předání přílohu	do doby vydání kolaudačního souhlasu	
4 a)	Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) bez předcházející fáze projektu		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
	4.1.1 a)	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování 4.1.2 a) Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS Vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (rozsaň dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	NE				kalendářních dnů, ode dne nabytí právní moci SP kalendářních dnů, ode dne předání přílohu	měsíců, od data převzetí stavby	
4 b)	Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) bez předcházející fáze projektu		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
	4.1.1 b)	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování 4.1.2 b) Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS Vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (rozsaň dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	ANO	1 980 000 Kč	2 004 000 Kč	7	240 kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy kalendářních dnů, ode dne předání přílohu	60 měsíců, od data převzetí stavby	
5	Jednostupňový projekt (DS)		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
	5.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DS Vypracování Projektové dokumentace musí být zpracována v rozsahu projektu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP+DPS), (rozsaň dle Přílohy č.12 v podrobnostech dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	NE				kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy kalendářních dnů, ode dne předání přílohu	měsíců, od data převzetí stavby	
8	Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce společně s prováděním stavby		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
	8.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování Projektové práce (PČ) - zapracování připomínek objednatel Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály žhotevitele, zapracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení (rozsaň dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	NE				kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy kalendářních dnů, ode dne předání přílohu	do doby dokončení realizace stavby (nabude-li vydáno SP) nebo do vydání kolaudačního souhlasu (bude-li vydáno SP)	
9	Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce společně s prováděním stavby		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
	9.1	Projektové práce (PČ) Výkon obecného autorského dozoru (AD) - cestovné Výkon obecného autorského dozoru (AD) - výkon projektanta/i	ANO	66 096 Kč 108 000 Kč 129 600 Kč	303 696 Kč	7	po dobu realizace stavby	60 měsíců, od data převzetí stavby	
11	Fáze po dokončení stavby		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
	11.1	Projektové práce (PČ) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSS) Zabezpečení ZP a kolaudačního souhlasu, případně povolení na představené užívání stavby nebo její část, spolupráce se zadavatelem při plnění požadavků, vyplývajících ze ZP a kolaudačního souhlasu, účast na vyhodnocení žadatebního provozu, spolupráce s provozovatelem při garancích zkušebních, atd.	NE				kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání průběžného souhlasu, ode dne vydání kolaudačního souhlasu, ode dne vyzvání objednatel	měsíců, od vydání kolaudačního souhlasu	
12	Dokumentace bourských prací		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
	12.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Dokumentace bourských prací Dokumentace bourských prací (rozsaň dle Přílohy č.15 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	NE				kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy kalendářních dnů, ode dne předání přílohu	měsíců, od vydání rozhodnutí o zrušení vodního díla a jeho odstranění	

Příloha č.2 - Další výkony

CENA CELKEM
239 000 Kč

vyplňuje uchazeč u "ANO"

Poř.č.	POPIS	ANO NE	CENA	POČET VYHOTOVENÍ	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
1.1	průzkumné práce - geologické	NE				
1.2	průzkumné práce - geodetické	NE				
1.3	průzkumné práce - hydrologické	NE				
1.4	průzkumné práce - seismické	NE				
1.5	průzkumné práce - balneologické	NE				
1.6	průzkumné práce - jiné	NE				
2.	geodetická dokumentace	NE				
3.	zabezpečení zdrojů financování	NE				
4.	správní a jiné poplatky	NE				
5.1	zabezp.majetkoprávní agendy - vstup na pozemky	NE				
5.2	zabezp.majetkoprávní agendy - výkup anebo vyvlastnění a nájem pozemků popř.objektů	NE				
5.3	zabezp.majetkoprávní agendy - správní poplatky	NE				
5.4	zabezp.majetkoprávní agendy - věcná břemena	NE				
5.5	zabezp.majetkoprávní agendy - zabezpečení příslušných smluv s přípravou stavby a výstavbou	NE				
5.6	zabezp.majetkoprávní agendy - projednání s majiteli pozemků	NE				
5.7	zabezp.majetkoprávní agendy - jiné	NE				
6.	účast na zkušebním provozu	NE				
7.	vypracování energetického průkazu budovy podle zákona o hospodaření energií	NE				
8.	uzavírky komunikací, dopravní řešení (DIO)	NE				
9.	projekt postupu výstavby, dočasná opatření, provizorní provoz atd.	ANO	144 000 Kč	7	dle bodu 4.1 přílohy č.1	dle bodu 4.1 přílohy č.1
10.	vyjádření správních orgánů o potřebě/nepotřebě správních aktů (ÚŘ, SP, OHL)	NE				
11.	provozní řád (nový/aktualizace)	NE				
12.	stavebně technický průzkum	ANO	95 000 Kč	7	dle bodu 4.1 přílohy č.1	dle bodu 4.1 přílohy č.1
13.		NE				
14.		NE				
15.		NE				
16.		NE				
17.		NE				
18.		NE				
19.		NE				
20.		NE				

Příloha č.3 - Autorský dozor

Výkon občasného autorského dozoru (AD) na stavbě	91146 Oprava centrálního sání čerpadel v ČS ÚV Plav
--	--

Místo, sídlo	Adresa
Sídlo projektanta	
Místo stavby	k.ú. Plav, úprava vody Plav

Geografické údaje		
Vzdálenost mezi sídlem projektanta a místem stavby (km)	153	
	min	hod
Čas potřebný pro překonání vzdálenosti mezi sídlem projektanta a místem stavby	120	2,00

Jednotkové ceny	Kč
Tarif - Cestovné (Kč/km)	6,00 Kč
Tarif - výkon projektanta/ů na cestě (Kč/hod)	500,00 Kč
Tarif - výkon projektanta/ů (Kč/hod)	800,00 Kč

Náklady na cestovné	měr.jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
Náklady na cestovné za 1 cestu	km	306	6,00 Kč	1 836 Kč
Předpokl.počet návštěv stavby projektantem/ty po dobu výstavby		36		
Náklady na cestovné za předpokl.počet návštěv stavby projektantem/ty po dobu výstavby	km	11016	6,00 Kč	66 096 Kč

Náklady na výkon projektanta/tů na cestě	měr.jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
Náklady na výkon 1 projektanta na cestě	hod	4	500,00 Kč	2 000 Kč
Předpokl.počet návštěv stavby projektantem/ty po dobu výstavby		36		
Předpokl.počet projektantů na jedné cestě		1,5		
Náklady na výkon projektanta/tů na cestě po dobu výstavby	hod	216	500,00 Kč	108 000 Kč


Náklady na výkon projektanta/tů	měr.jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
Náklady na výkon 1 projektanta za 1 návštěvu stavby při předpokládaném množství	hod	3	800,00 Kč	2 400 Kč
Předpokl.počet návštěv stavby projektantem/ty po dobu výstavby		36		
Předpokl.počet projektantů na jedné návštěvě stavby		1,5		
Náklady na výkon projektanta/tů po dobu výstavby	hod	162	800,00 Kč	129 600 Kč

Předpokládané náklady na AD po dobu výstavby	
Náklady na cestovné	66 096 Kč
Náklady na výkon projektanta/tů na cestě	108 000 Kč
Náklady na výkon projektanta/tů	129 600 Kč
Celkem	303 696 Kč

Legenda	
Vyplňuje uchazeč	

Mapa - vzdálenost mezi sídlem projektanta a místem stavby

<https://mapy.cz/zakladni?x=14.4134000&y=48.9345000&z=11>

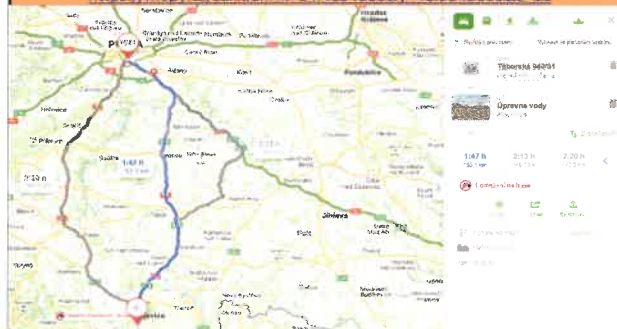

Mapa - vzdálenost mezi sídlem projektanta a místem stavby

VZOR

