

Smlouva o provedení stavby a zajištění souvisejících činností

Číslo smlouvy objednatele: 2012323T

Číslo smlouvy zhotovitele: 8 – 0633A/12 **8-5866**

VÝTISK 1

uzavíraná níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smluvní strany:

(1) Liberecký kraj

Se sídlem: U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Zastoupený: Mgr. Stanislavem Eichlerem – hejtmanem

který na základě Mandátní smlouvy č.OLP/326/2011 zastupuje:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ : 70946078

DIČ: CZ70946078

Zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., odštěpný závod 2 – mosty a inženýrské konstrukce

sídlem Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Zastoupený: Ing. Michalem Tichovským, vedoucím odštěpného závodu 2 a

Ing. Alešem Sládkem, vedoucím inženýrem odštěpného závodu 2 – na základě plné moci (společně)

IČ: 45273910

DIČ: CZ45273910

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1518

Za kterou jedná/zastoupená:

Ing. Antonín Daňa, předseda představenstva

Mag. Alois Janusch, člen představenstva

Ing. Jan Schermer, prokurista

Ing. Pavel Novotný, prokurista

Ing. Michal Tichovský, vedoucí oddělení závodů 2 a
Ing. Aleš Sládek, vedoucí inženýr oddělení závodů 2 – na základě
plné moci
(společně)

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu: 5032769001/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „**Strany**“

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – stavební práce na zakázce „**Rekonstrukce mostu ev č 26836-20 Nové Zákupy**“.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Libereckého kraje, státního rozpočtu České republiky, nebo rozpočtu Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko anebo rozpočtu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
3. Rozsah díla je určen:
 - a) Technickou dokumentací zpracovanou firmou PRAGOPROJEKT a.s./VIAPONT s.r.o. pod zakázkovým číslem 1525 z 05/2010.
 - b) Stavebním povolením nebo ohlášením stavby
 - c) Zadávací dokumentací ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb.
 - d) Nabídkou zhotovitele ze 10.4.2012
 - e) Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky.
 - f) Oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele

Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zároveň na základě tohoto vymezení lze stanovit cenu.

4. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele zajistit pro objednatele následující činnosti a listiny:

- Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.
- Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu (včetně označení a zaměření hranic pozemků). Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v termínu a počtu paré dle potřeb investora.
- Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 134 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. všech souvisejících směrnic a požadavků objednatele včetně zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací dokumentací. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
- Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných revizních zpráv, provozních řádů, havarijních řádů, povodňových plánů, apod. V případě inženýrských sítí je součástí vypracování dokumentace dle předpisů a požadavků jednotlivých správců. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
- Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) a zanesení do systému BMS.
- Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí:
 - náklady spojené s přípravou a realizací stavby
 - náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště
 - staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození
 - kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby
 - dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.)
- Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.
- Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).
- Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.
- Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby až do předání díla.

- Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně zimní údržby.
 - Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace v požadovaném počtu paré (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu.
 - Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:
 - pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě
 - pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě
 - monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě
 - archeologický dohled (fakturace dle prokazatelných nákladů, vyčíslených zpracovatelem)
 - geotechnický monitoring (fakturace dle prokazatelně provedených prací, odsouhlasených dozorem objednatele - TDI)
 - doplňující geotechnický průzkum (fakturace dle prokazatelně provedených prací odsouhlasených geotechnickým dozorem objednatele nebo TDI)
 - zkoušení konstrukcí a prací
5. Objednatel se zavazuje za dílo řádně provedené a činnosti řádně zajištěné zaplatit sjednanou cenu.
6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

II. Termín provádění díla

1. Zahájení realizace předmětu díla:
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že staveniště bude předáno ve stavu, který umožňuje zahájit, provádět a dokončit dílo. Zahájení plnění předmětu smlouvy se předpokládá v 6/2012.
2. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 91 kalendářních dnů** od zahájení plnění předmětu smlouvy do ukončení (protokolární předání stavby) předmětu smlouvy.
3. K započetí plnění díla bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyzván (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky) s uvedením přesného data zahájení plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky).
4. Dílo bude prováděno dle časového plánu výstavby - časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Z časového harmonogramu bude vyplývat:
Řádkový harmonogram
 - podrobný harmonogram výstavby, který bude dokládat uchazečem navrženou celkovou lhůtu výstavby, která zahrnuje veškeré činnosti stanovené zadávací dokumentací a souhrnným listem stavby (v kalendářních dnech) a bude

- obsahovat podrobný věcný a časový postup prací, včetně nasazení rozhodujících zdrojů (materiálů či techniky)
- harmonogram bude obsahovat jasné a přehledné informace, ze kterých bude zřejmá částečná (průjezdny jeden pruh komunikace) a úplná (není průjezdny žádný pruh komunikace) uzavírka (v kalendářních dnech), lhůta bude uvedena zvlášť pro částečnou a zvlášť pro úplnou uzavírku
 - definování a zpracování harmonogramu podle veškerých činností stanovených zadávací dokumentací (stavební a technologická část stavby, požadované projektové dokumentace, zaměření, průzkumy a apod.)
 - uvedení zahájení a ukončení (protokolární předání stavby) činnosti uchazeče, činností uchazeče se rozumí veškeré činnosti stanovené zadávací dokumentací a souhrnným listem stavby (stavební a technologická část stavby, požadované projektové dokumentace, zaměření, průzkumy a apod.)
5. Prodloužení termínu dokončení díla je možné pouze změnou této smlouvy uskutečněné v písemné podobě a z důvodů uvedených v této smlouvě.
6. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je Zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů Objednatele, aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla.
7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele, který mu Objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Celková délka přerušení provádění díla na základě takového pokynu Objednatele však nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu lhůty pro provedení díla sjednané ve smlouvě. V ostatních případech lze lhůtu pro provedení díla nebo jeho části změnit jen dohodou o změně smlouvy. Toto se nevztahuje na přerušení z důvodu klimatických podmínek (zejména přerušení z důvodu zimního období atd.).
8. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla nebo jeho části o dobu, po kterou Zhotovitel na základě pokynu Objednatele podle předchozího odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlídně. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době.

III. Cena díla

1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto:

Cena bez DPH 7.166.746,-- Kč

(slovy: sedmmilionůstošedesátšesttisícsemsetčtyřicetšestkorunčeských)

DPH 20 % 1.433.349,-- Kč

(slovy: jedenmiliónčtyřistatřicettřítisícčtyřicetdevětkorunčeských)

Cena včetně DPH 8.600.095,-- Kč

(slovy: osmmilionůšestsettisícdevadesátčtyřkorunčeských)

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Celková cena díla je platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na straně objednatele.
4. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele.
5. Cenu díla bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených Zhotovitelem.
2. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro Objednatele provedl v předchozím kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je soupis prací písemně odsouhlasený Objednatelem a technickým dozorem investora. Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis prací obsahuje plnění, která Zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený Objednatelem a technickým dozorem investora je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci.
3. Faktury vystavené Zhotovitelem musejí mít náležitosti stanovené právními (zejména daňovými a účetními) předpisy a smlouvou. Vždy musejí obsahovat název projektu (stavby), který je předmětem smlouvy a registrační číslo projektu uvedené v článku I. odst. 1 této smlouvy.
4. Faktury jsou splatné ve lhůtě do 45 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

Fakturační adresa je:

Liberecký kraj

se sídlem: U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2
zastoupený: Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem
IČ: 708 915 08
DIČ: CZ708 915 08
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec
číslo účtu: 19 – 7964200287/0100

5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a těmito obchodními podmínkami, smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručení opravené faktury Objednateli.
6. V průběhu stavebních prací bude zhotovitel vystavovat měsíční faktury za oprávněně provedené práce. Před dokončením celého díla bude vyfakturováno pouze 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla tvoří pozastávku. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli po předání a převzetí díla včetně odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla na základě předložené faktury.
7. Platba faktury se považuje za uskutečněnou odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele.
8. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla má Zhotovitel právo na úrok z prodlení v zákonné výši.
9. Zhotovitel je oprávněn pohledávku na zaplacení ceny díla postoupit nebo zastavit jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

V. Podklady pro provedení díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se seznámil s místními podmínkami na staveništi.
2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro provedení díla objednatel předal, zejména technickou dokumentaci a bez zbytečného odkladu objednatel písemně upozornit na jejich vady.
3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatel. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla.

VI. Místo a způsob provádění díla

1. Místem plnění je Rekonstrukce mostu ev. č. 26836-20 Nové Zákupy.
2. O předání staveniště Zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž uvedou rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí Zhotovitelem, vytyčení základních směrových a výškových bodů, a dále prostory určené pro zařízení staveniště.
3. Zhotovitel zajistí zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude využívat pro provádění díla. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
4. Materiál odstraněný při provádění díla (např. frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví Libereckého kraje a Zhotovitel je povinen tento materiál

předat Objednateli. Objednatel se prostřednictvím stavebního dozoru vyjádří, zda-li materiál požaduje ponechat či zda jej má Zhotovitel vlastním nákladem odvézt a zlikvidovat.

5. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě pěti dnů ode dne předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s Objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v Zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak Zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí.
6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle pokynů Objednatele.

VII. Součinnost účastníků výstavby

1. Současně s prováděním díla zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou činnost také další účastníci výstavby. K běžným omezením, která z toho podle zkušenosti vyplývají, smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy.

VIII. Stavební deník

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.
2. Stavební deník je veden v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

IX. Jakost a provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny Objednatele při provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
3. Zhotovitel stavebních prací zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací stavby zodpovídá v průběhu prací Zhotovitel.
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.

5. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby.
6. Před zahájením provádění díla předloží Zhotovitel Objednateli technologické postupy nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla.

X. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Objednatel je oprávněn sjednat jako stavební dozor odbornou firmu, která směřem ke zhotoviteli v technických věcech bude jednat jménem objednatele. Stavební dozor není oprávněn měnit smlouvu ani žádným jiným způsobem zavazovat objednatele. K vykonání takové kontroly má objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla.
2. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. 1 x za 14 dní), které svolává technický dozor investora na základě požadavku objednatele. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu.
3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli jej k tomu zhotovitel řádně vyzval, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví.
5. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

XI. Zkoušky díla

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou zahrnuty v ceně díla.

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek díla.
3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.

XII. Prodlení při provádění díla

1. Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro provádění díla stanovené harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy anebo jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.
2. Pokud zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem podle předchozího odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména nezačne-li plnit dílčí termíny pro provádění díla stanovené harmonogramem, anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků. Nesplnění závazku provést dílo jako celku je podstatným porušením smlouvy.

XIII. Změny díla

1. Není-li dále stanoveno jinak, vyžaduje změna díla dohodu o změně smlouvy. Jestliže by změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může taková dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání souhlasu s ohlášením takové změny.

XIV. Nebezpečí škody a vlastnické právo

1. Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele převzetím díla Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla. Nebezpečí škody na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem.

XV. Projektová dokumentace

1. Součástí závazku Zhotovitele dle této smlouvy je zhotovení realizační dokumentace stavby včetně výkazu výměr ve třech písemných vyhotoveních způsobitelných k dalšímu rozmnožování a jedenkrát v uzavřené i otevřené digitální formě. Otevřená digitální forma

dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné. Uzavřená forma bude uložena ve formátu *.pdf.

2. Do 6 týdnů od zahájení realizace předmětu díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby v počtu 2 písemného vyhotovení a jedenkrát v digitální formě. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze zadávací projektové dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby. Objednatel je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě, která bude provádět kontrolu správnosti realizační projektové dokumentace a její soulad se zadávací projektovou dokumentací.
3. Objednatel do 14 dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 14 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu. Smluvní strany se v odůvodněných případech mohou dohodnout na jiných termínech.
4. Pokud bude výkaz výměr realizační dokumentace stavby odlišný od výkazu výměr zadávací dokumentace, je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit ke schválení změnové listy. Změnové listy musí obsahovat popis a zdůvodnění změny a budou vyhotoveny na formulářích dle standardu Objednatele.
5. Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu rozmnožování a jedenkrát v elektronické podobě v uzavřené i otevřené digitální formě. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné. Uzavřená forma bude uložena ve formátu *.pdf.

XVI. Předání a převzetí díla

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel alespoň pět dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
2. O průběhu a výsledku předávání díla sepiší smluvní strany zápis.
3. Zhotovitel předává dílo v prvotřídní kvalitě a bez vad a nedodělků. V zápisu o předání a převzetí díla objednatel uvede také soupis vad s určením přiměřené lhůty, ve které má zhotovitel vady odstranit, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatel a zhotovitele o právech objednatel z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady.
4. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, uvede v zápisu o předání a převzetí díla důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání díla.

5. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, a doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.
6. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.

XVII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu **60 měsíců** od předání a převzetí díla.
2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady.
3. Práva z odpovědnosti zhotovitele za vady se nepromlčí dříve než uplynutím čtyř let ode dne oznámení vady zhotoviteli.
4. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady.
5. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž zhotovitel odpovídá.
6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

XVIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku provést dílo včas má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele při odstraňování oznámených vad má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den prodlení.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

XIX. Odstoupení od smlouvy

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li návrh na povolení vyrovnání.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu delší než dvacet dnů.
3. Dále může objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného ukončení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy odpovídá částce, která připadá na již provedené práce, činnosti nebo jiná plnění, pokud zhotovitel nemůže použít jejich výsledek jinak, a náhradě nákladů, které zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil.

XX. Oprávněné osoby

1. Za objednatele bude ve věcech technických jednat:
 - a) koordinátor – Ing. Tomáš Částka – CSW Projekt (tel. 733 728 956)
 - b) externí TDI - Ing. Vladimír Wunsch – W-INVEST (tel. 602 457 653)
 - c) Tomáš Machalík – vedoucí oddělení mostů KSS LK (tel. 725 691 311)
 - d) Ing. Martin Čáp – vedoucí investičního oddělení KSS LK (tel. 724 844 522)
2. Za zhotovitele bude ve věcech technických jednat:
 - a) Ing. Milan Jeřábek, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 724 342 788
 - b) Pavel Šípoš, zástupce hlavního stavbyvedoucího, tel.: 602 691 201.
3. Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o změně smlouvy.

XXI. Podzhotovitelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Seznam podzhotovitelů tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

XXII. Pojištění

1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním stavby sjednává po celou dobu trvání díla až do souhlasu s užíváním stavby vlastním nákladem zhotovitel. Zhotovitel je povinen pojistku udržovat v platnosti po celou dobu výstavby.
2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7720080065 u spol. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

XXIII. Obchodní tajemství

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci.
2. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež se jejich prostřednictvím podílejí na provádění díla.
3. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah odůvodněné potřeby.
4. Zhotovitel nesmí použít údaje týkající se stavby k reklamním účelům bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Tím není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

XXIV. Oddělitelnost

1. Pokud jakýkoli závazek podle této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.
2. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno.


XXV. Zvláštní a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce a rozhodným právem je český právní řád, zejména obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
2. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy jsou povinny vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. Smluvní strany dohodly, že v případě, že se jim nepodaří

některý spor urovnat smírnou cestou, bude spor rozhodnut soudem příslušným dle českých právních předpisů.

4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 výtiscích, přičemž objednatel obdrží 4 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že obsah smlouvy vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho tuto smlouvu podepisují.
6. Smlouva nabývá v účinnosti v den podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí finančních prostředků z dotačních programů, do nichž podal žádost na předmětnou akci.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – časový plán výstavby - časový harmonogram
 - b) Příloha č. 2 – oceněný výkaz výměr
 - c) Příloha č. 3 – seznam podzhotovitelů
 - d) Příloha č. 4 – plná moc za PSVS a.s.

V Jablonci nad Nisou dne: 31.7.2012
za Objednatele:



Ing. Jan Růžička, ředitel
Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace

**Krajská správa silnic
Libereckého kraje,**
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (221)

V Praze dne: 31.7.2012
za Zhotovitele:



Ing. Michal Tichý,
vedoucí odštěpného závodu Pražské
silniční a vodohospodářské stavby, a.s.,
odštěpný závod 2 – mosty a inženýrské
konstrukce



Ing. Aleš Sládek,
vedoucí inženýr odštěpného závodu
Pražské silniční a vodohospodářské
stavby, a.s., odštěpný závod 2 – mosty a
inženýrské konstrukce
(na základě plné moci)

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
odštěpný závod 2 - mosty a inženýrské konstrukce

- 1 -


PSVS, a.s. / Kub.

15

s0633A12

Proveřil a doporučuje k podpisu:
HASOPRUST
Podpis
Datum
31.7.2012



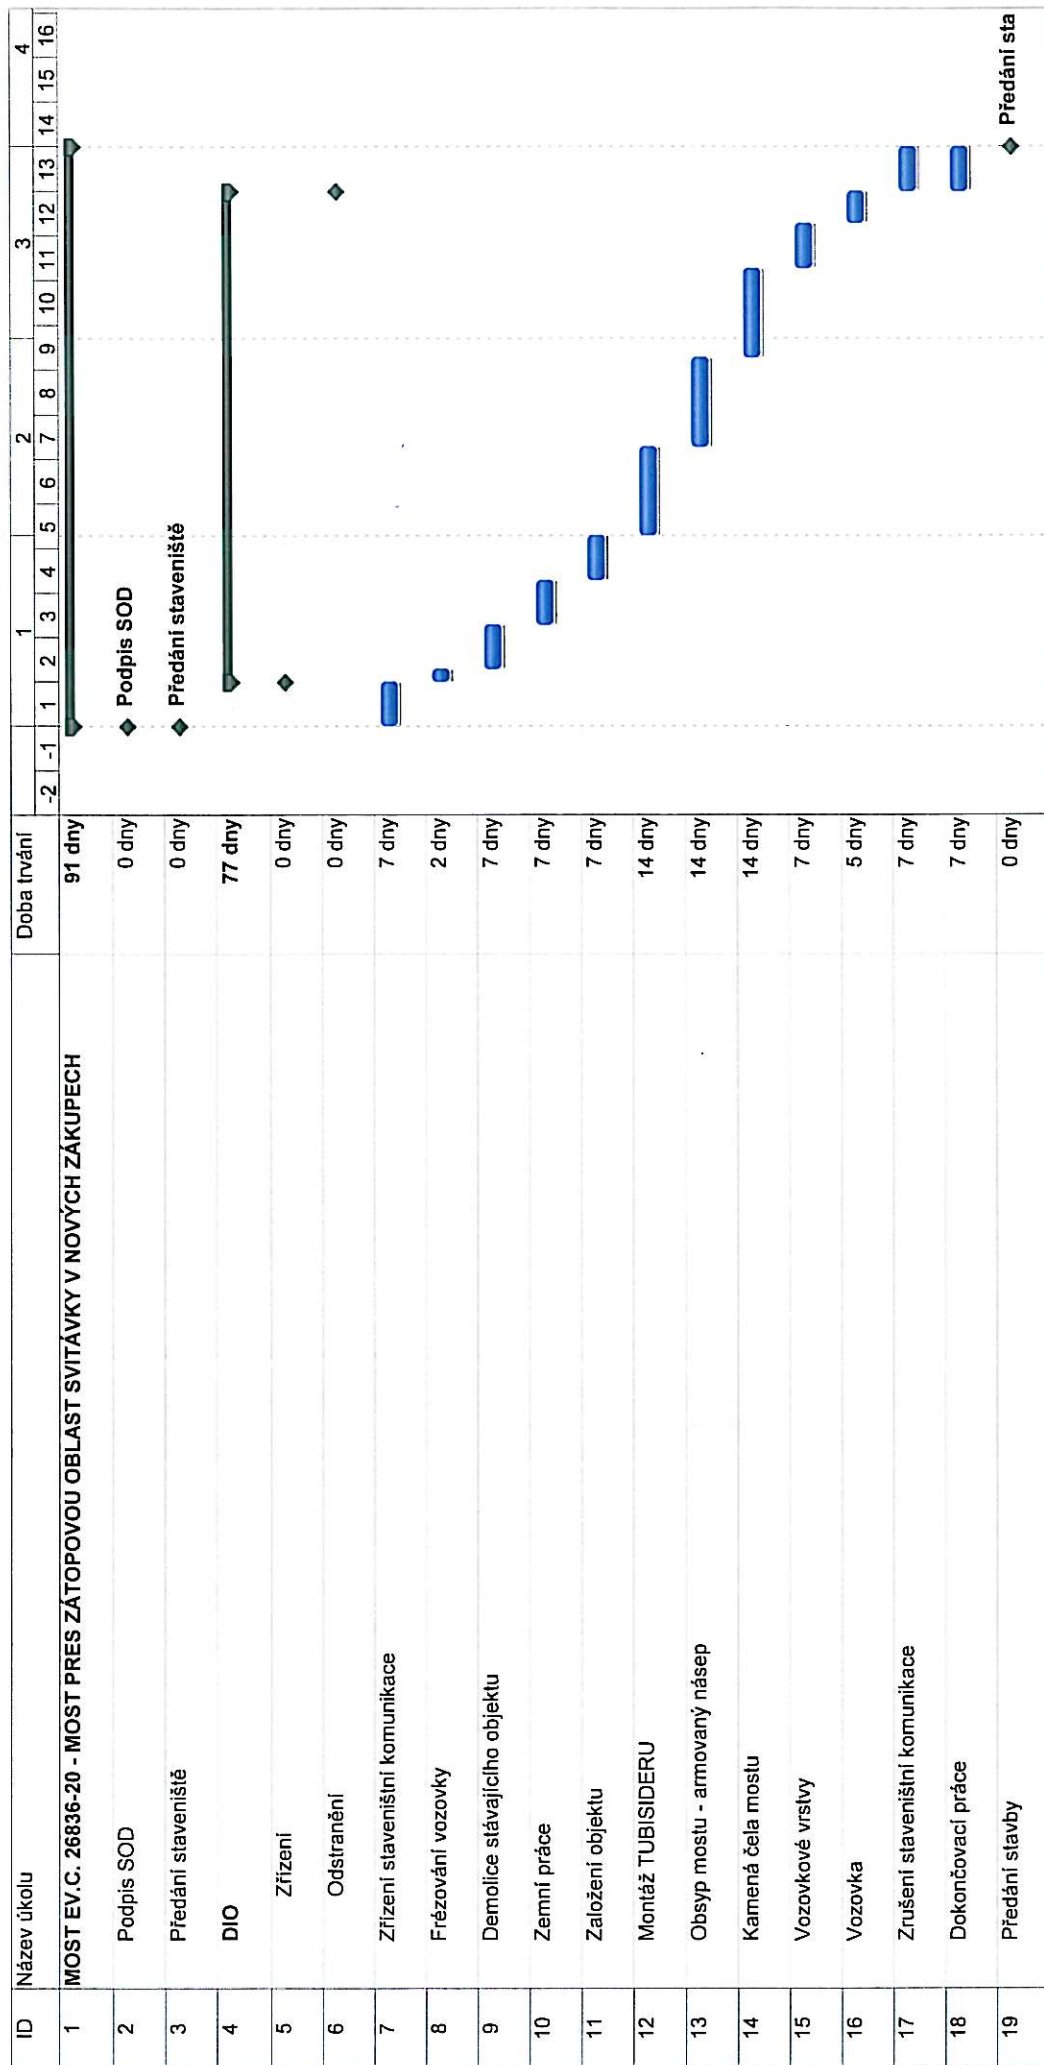

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Praha 10, Dubčeská 3238, PSČ 100 00
odštěpný závod 2 - mosty a inženýrské konstrukce

- 1 -


Ing. Michal Tichovský, vedoucí OZ2


Ing. Aleš Sládek, vedoucí inženýr OZ2

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Název stavby:		Rekonstrukce mostu ev č 26836-20 - NOVÉ ZÁKUPY	
Číslo stavby:		49	
Investor (objednatel):		Krajská správa Libereckého kraje, příspěvková organizace	
Projektant (zpracovatel):		PRAGOPROJEKT a.s. / VIAPONT s.r.o.	
Zhotovitel stavby:			
CÚ		2010	
Datum		červen 2010	
Název souhrnných částí			Cena (Kč)
A Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)			Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč)
Číslo objektu	Název objektu	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO201	Rekonstrukce mostu ev č 26836-20 - NOVÉ ZÁKUPY	6 778 498	8 134 198
STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM		6 778 498	8 134 198
B Technologická část stavby (provozní soubory)			Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč)
Číslo souboru	Název souboru	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
PS		neoceňuje se	
TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM		0	0
C Projektová dokumentace pro realizaci stavby			Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč)
Název dokumentace	Jednotka	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Průzkumy a zaměření Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) Výkon investorsko-inženýrské činnosti při stavebním řízení (SP)		neoceňuje se	
Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 134 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek stanovených zadávací dokumentací.	kpl	156 489	187 787
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů.	kpl	18 457	22 148
Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zanesení do BMS	kpl	16 423	19 708
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM		191 369	229 643
D Zeměměřická měření			Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč)
Činnost	Jednotka	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.	kpl	34 895	41 874
Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora.	kpl	15 423	18 508
ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM		50 318	60 382

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

E Náklady na umístění stavby		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Činnost	Jednotka	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. – náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště – staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, – kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby - dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách a pod.)	kpl	128 326	153 991
Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.			
Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).			
Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.			
Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.			
Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně zimní údržby.			
NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM		128 326	153 991
F Ostatní náklady		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Činnost	Jednotka	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Publicita – identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, přesně dle specifikace objednatele	neoceňuje se		
Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby (monitoring dotčených objektů, geotechnický dozor, inženýrsko geologický průzkum, zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou, archeologický dohled a pod.)	kpl	18 235	21 882
Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě	neoceňuje se		
OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM		18 235	21 882
NÁKLADY CELKEM		7 166 746	8 600 095

Stavba:	NOVÉ ZAKUPY -	Rekonstrukce mostních objektů v okrese Česká Lipa
Objekt:	26836-20 -	Rekonstrukce mostu ev č 26836-20 - NOVÉ ZÁKUPY
Rozpočet:	201 -	Rekonstrukce mostu ev č 26836-20 - NOVÉ ZÁKUPY

						Montáž	
Poř.č.	Položka	Ty	Text	MJ	Množ.	Jedn.cena	Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana stávajících inženýrských sítí v prostoru výkopu	KČ	1	19 236,40	19 236,40
0 Všeobecné konstrukce a práce 19 236,40							
1 Zemní práce							
2	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	300,000	179,50	53 850,00
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	300,000	174,40	52 320,00
4	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PŘEŽŮ	KUS	2,000	4 565,40	9 130,80
5	113166		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM	M3	72,600	991,00	71 946,60
6	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	57,750	282,10	16 291,28
7	113336		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	37,000	589,90	21 826,30
8	113346		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	75,600	897,70	67 866,12
9	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	36,200	1 000,30	36 210,86
10	114126		ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET PROST VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM	M3	20,041	897,70	17 990,81
11	11527		PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	M	15,000	4 873,20	73 098,00
12	122716		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	754,400	230,80	174 115,52
13	123316		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 4 ODVOZ DO 12KM	M3	251,000	256,50	64 381,50
14	124316		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ 4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	329,480	410,40	135 218,59
15	131316		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	319,200	487,30	155 546,16
16	132316		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4 DO 12KM	M3	8,640	525,80	4 542,91
17	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	700,000	771,00	539 700,00
18	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ částečně armované	M3	67,600	754,00	50 970,40
19	17680		VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	727,000	771,00	560 517,00
20	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Po odstr. provizori kom	M2	1030,000	10,30	10 609,00
21	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	72,000	41,00	2 952,00
22	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	72,000	29,50	2 124,00
23	18243		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	150,000	29,50	4 425,00
24	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	40,000	513,00	20 520,00
1 Zemní práce 2 146 152,84							
2 Základy							
25	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	50,250	1 000,30	50 265,08
26	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,016	6 452,20	13 007,64
27	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,198	28 213,30	5 586,23
28	28995		KOTEVNÍ SÍŤ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY pozink. mříže f14/100/100	M2	87,500	493,70	43 198,75
29	28996		ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT Geomříže dle PD	M2	760,000	698,90	531 164,00
30	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE Oddělovací pod násyp	M2	2060,000	99,00	203 940,00
2 Základy 847 161,69							
3 Svislé konstrukce							
31	333213		OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE	M3	6,400	9 618,20	61 556,48
32	333334		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PŘEDPJ BET DO C25/30 (B30)	M3	14,400	7 527,70	108 398,88
33	333365		VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	1,050	28 213,30	29 623,97
3 Svislé konstrukce 199 579,33							
4 Vodorovné konstrukce							
34	429170v		OCELOVÁ FLEXIBILNÍ KONSTRUKCE Z PLECHU Kompletní provedení a dodání konstrukce včetně všech souvisejících prací a dodávek	T	10,008	70 129,40	701 855,04
35	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	25,080	2 305,10	57 811,91
36	46251		ZÁHOZ Z LOM KAMENE	M3	58,560	1 141,40	66 840,38
37	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	51,205	6 139,20	314 357,74
38	467384		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 (B30) VČET VÝŽT	M3	1,920	3 908,50	7 504,32
4 Vodorovné konstrukce 1 148 369,38							

5 Komunikace						
39	56130	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU Dle PD	M3	28,000	2 834,20	79 357,60
40	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 150MM	M2	521,400	246,20	128 368,68
41	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	120,400	1 256,80	151 318,72
42	56343	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 150MM	M2	473,000	150,00	70 950,00
43	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	256,500	125,70	32 242,05
44	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 kation aktivní	M2	441,400	21,90	9 666,66
45	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kation aktivní	M2	1018,750	11,30	11 511,88
46	574131	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 40MM	M2	487,600	230,00	112 148,00
47	574161	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 70MM	M2	501,250	340,00	170 425,00
48	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 100MM	M2	517,500	457,00	236 497,50
49	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM DO 5KG/M2	M2	441,400	10,70	4 722,98
50	58303v	KRYT ZE SILNICÍ DÍLCŮ (PANELŮ) TL DO 220MM Dočasný předpoklad cca 2x použitelnost	M2	330,000	632,00	208 560,00
5 Komunikace						1 215 769,07
9 Ostatní konstrukce a práce						
51	911115	OCEL SILNICÍ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	M	56,000	3 783,20	211 859,20
52	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	18,000	442,40	7 963,20
53	914131	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT dočasné	KUS	15,000	4 424,40	66 366,00
54	914133	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	320,60	4 809,00
55	914431	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT dočasné	KUS	4,000	7 630,40	30 521,60
56	914433	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	320,60	1 282,40
57	916321	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DOD A MONTÁŽ dočasné	KUS	3,000	4 424,40	13 273,20
58	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	192,40	577,20
59	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	56,000	440,30	24 656,80
60	91837v2	Dočasný PROPUST DN 1000 vč všech zem. prací a následného odstranění Kompletní provedení a dodávka, vč všech zemních prací, podkladních vrstev, obetonování, izolace, osazení a dodání trub a následného dstranění. Vše dle PD;	M	51,000	4 827,00	246 177,00
61	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	24,000	74,80	1 795,20
62	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	12,000	97,10	1 165,20
63	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM Skluzy	M	6,000	519,80	3 118,80
64	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	36000,000	2,60	93 600,00
65	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	24000,000	2,90	69 600,00
66	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	112,631	2 963,80	333 815,76
67	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	15,800	3 223,00	50 923,40
68	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	5,500	3 863,40	21 248,70
69	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	32,000	320,90	10 268,80
70	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 718,60	3 437,20
71	96685	ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	KUS	18,000	320,60	5 770,80
9 Ostatní konstrukce a práce						1 202 229,46
Celkem:						6 778 498,17

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

„Rekonstrukce mostu ev. č. 26836-20 Nové Zákupy“

My, zástupci uchazeče - **Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.** (IČ 45 27 39 10), se sídlem Dubečská 3238, 100 00 Praha 10 – prohlašujeme, že firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. nebude využívat žádné subdodavatelské firmy, 100 % plnění zakázky provede vlastními kapacitami.

V Praze dne: 31. 7. 2012

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
odštěpný závod 2 - mosty a inženýrské konstrukce
- 1 -


Ing. Michal Tichovský
vedoucí odštěpného závodu 2
mosty a inženýrské konstrukce


Ing. Aleš Sládek
vedoucí inženýr odštěpného závodu 2
mosty a inženýrské konstrukce

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
se sídlem Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
plně oprávnění k podepsání dle §13 odst.3 zákona č.513/1991 Sb.

PLNÁ MOC

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. (dále jen „akciová společnost“) IČ 45273910, se sídlem v Praze 10, Dubečská 3238, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1518, jejímž jménem jednají Ing. Johann Baumgartner, předseda představenstva, Ing. Antonín Daňa, místopředseda představenstva a Ing. Vladimír Vedral, místopředseda představenstva

zplnomocňuje vedoucího inženýra odštěpného závodu 2

pana **Ing. Aleše Sládka**, nar. 28. června 1955, trvalý pobyt Rudná, Masarykova 617, občanský průkaz č. 112359911

k jednání jménem akciové společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu 2 podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a

k jednání jménem akciové společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu 2 podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádosti o účast v příslušných druzích zadávacích řízení,
- b) nabídky ve všech druzích zadávacích řízení,
- c) smlouvy o realizaci veřejných zakázek,


a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadáva podle tohoto zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.

V Praze dne: 1. prosince 2011.



Ing. Antonín Daňa



Ing. Vladimír Vedral

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 12.12.2011



Ing. Aleš Sládek
