

SMLOUVA O DÍLO
č. SHL/017/2016

**uzavřená podle ustanovení § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.**
Sídlo: Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211
Zastoupená: Ing. Liborem Halasem, předsedou představenstva
IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka v Jeseníku, číslo účtu: 5939330267/0100
Tel.: +420584411545
ID datové schránky: kncgujn

(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: **KUNST, spol. s r.o.**
Sídlo: Palackého 1906, 753 01 Hranice
Zastoupená: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti
IČ: 19010591
DIČ: CZ19010591
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Olomouc, číslo účtu: 234642831/0100
Tel.: +420 581 699 999
ID datové schránky: 26ag9ca

(dále jen: „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

Jednání o záležitostech ve věcech smluvních: Ing. Libor Halas, předseda představenstva
Jednání o záležitostech ve věcech technických: Robert Černý, technický ředitel
Ing. Lumír Proske, vedoucí ČOV

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu).

Osoby pověřené zhotovitelem:

Jednání o záležitostech ve věcech smluvních: Ing. Luboš Maršálek, MBA, obchodní ředitel
Jednání o záležitostech ve věcech technických: Ing. Jan Kundrátek, technický ředitel

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí stavba:

„ČOV ČESKÁ VES – OBNOVA VSTUPNÍ ČS“.

2.

Dílo bude provedeno v souladu s:

- a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce „ČOV ČESKÁ VES – OBNOVA VSTUPNÍ ČS“,
- b) cenovou nabídkou zhotovitele (obsahující zejména soupis prací včetně uvedené ceny) ze dne 18. 8. 2016, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její **přílohu č. 1**.

3.

Zhotovitel potvrzuje, že v rámci zadávacího řízení obdržel všechnu výše uvedenou zadávací dokumentaci.

4.

Součástí předmětu díla je též veškerá činnost zhotovitele související s realizací, zejména pořízení dokumentace o průběhu výstavby (stavební deník, fotodokumentace, popř. video dokumentace se stavem před zahájením a po dokončení stavby), protokoly o splnění kvality, protokoly o provedení zkoušek potrubí, doklady „Prohlášení o shodě“ u použitých materiálů a výrobků.

5.

Bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené ponese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Porušení tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v případě porušení tohoto ustanovení smlouvy povinen nad rámec případné náhrady škody či vynaložených nákladů uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2%** (slovy: Dvě procenta) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené mu tímto odstavcem.

6.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle odstavce 1. a 2., že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Všechny práce a dodávky musí odpovídat parametrům platných norem ČSN.

7.

Pokud nastanou změny na díle a budou mít za následek zvýšení nebo snížení rozsahu prací a v důsledku takového zvýšení nebo snížení i prokazatelné zvýšení či snížení nákladů zhotovitele, což bude mít vliv na výši dohodnuté ceny za dílo, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek ke smlouvě, ve kterém bude smlouva upravena v souladu s nastalou změnou rozsahu prací případně ceny.

8.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele bez zbytečného odkladu o změnách uvedených v předchozím článku této smlouvy.

III. DOBA PLNĚNÍ

1.

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech. Okamžikem zahájení realizace díla se pro účely této smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Protokolárnímu předání staveniště budou za obě dvě strany přítomny osoby oprávněné jednat ve věcech technických dle čl. I. smlouvy, popř. jiné písemně pověřené osoby.

Termín zahájení díla: 29.08.2016

Termín ukončení díla a jeho předání objednateli: 30.12.2016

2.

Ukončení celého díla je splněno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.

IV. CENA DÍLA

1.

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a činí bez DPH: **1.296.857,-**, samostatně DPH: **272.340,-**, celková nabídková cena vč. DPH: **1.569.197,-**,

(slovy: jeden milión pětset šedesát devět tisíc jednosta devadesát sedm včetně DPH).

2.

Ceny uvedené v cenové nabídce jsou pevné. Cena může být zhotovitelem jednostranně upravena pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy účinnými v době zdanitelného plnění. V případě plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 se uplatní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce, jinak se uplatní platná sazba ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí nabídky a souvisí bezprostředně s tímto dílem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění, které bude provedeno podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, dle nabídkového položkového rozpočtu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, přičemž na straně objednatele nepůjde o bezdůvodné obohacení z výše uvedeného titulu. Jednání budou zaznamenána ve stavebním deníku.

4.

V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů k předání dokončené stavby viz čl. IX. (Předání díla) odstavec 4.

V. FAKTURACE

1.

Objednatel neposkytuje zálohy.

Smluvní strany se, dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány jednorázově po předání díla na podkladě oboustranně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla. K faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělený ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Splatnost faktury (daňového dokladu) činí **21 dnů** od data jejího doručení.

3.

Faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat zejména:

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- celkovou výši DPH.

Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol, v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných při protokolárním předání díla.

Faktura k úhradě ceny díla vystavená zhotovitelem bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a podle § 435 občanského zákoníku.

Bez kterékoliv z uvedených náležitostí nebo součástí je konečná faktura neplatná a bez závazných účinků pro objednatele.

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část prací obsažených v konečné faktuře, se kterými souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5. Platební styk bude realizován bezhotovostními platbami. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení nebo náhradu škody vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst jednostranně tuto částku proti částce uvedené na faktuře popř. na více fakturách.

7. Veškeré smluvní sankce (zejména dle článku XII.) nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně uhradit do 21 dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše smluvní sankce.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace, apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla.

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, případně jím písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní úřady.

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným ve stavebním deníku zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor, který je jako staveniště určen.

2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od doručení výzvy k předání staveniště zhotoviteli, a to v souladu s ujednáním čl. III odst. 1 smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.
5. Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti s prováděním díla.
6. Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a časový harmonogram prací vč. plánu kontrolních prohlídek. Časový harmonogram prací tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.
7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. V případě prodlení s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši: **1 000,- Kč** (slovy: Jeden tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů a zabezpečení vybavení ochrannými pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy.
2. Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo subdodavatelé nebudou vykazovat patřičnou kvalifikaci pro provádění díla, považuje se tento stav za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, a zhotovitel je při takovém porušení smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši: **5 000,- Kč** (slovy: Pět tisíc korun českých), a to za každý takovýto jednotlivý případ porušení - za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho subdodavatele.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti, a podmínky stanovené pravomocnými rozhodnutími příslušných správních úřadů vztahující se ke stavbě. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů a norem, které se týkají předmětného díla, a to i pokud k těmto změnám dojde během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou tyto změny objednatelem uplatněny.

4.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou při dalším postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen učinit:

- a) nejméně 3 pracovní dny předem formou elektronické pošty (e-mail) na elektronickou adresu zástupce oprávněného k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků (čl. I) nebo na elektronickou adresu určeného stavebního dozoru nebo
- b) nejméně 7 kalendářních dní předem formou zápisu ve stavebním deníku.

Neučiní-li tak, je povinen zhotovitel na žádost objednatele tyto práce odkrýt či zpřístupnit na své riziko a na své náklady. V případě, že se na tuto výzvu pověřený zástupce objednatele bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla a má se za to, že objednatel zakrývané práce prověřil. Neprovedení kontroly prací zástupcem objednatele nezakládá zhotoviteli možnost zbavení se odpovědnosti za povinnost provést dílo řádně.

5.

Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti dodavatele stavebních prací vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., oboje ve znění pozdějších předpisů. V případě zhotovitelova porušení povinnosti vyplývajících mu ze dvou výše uvedených právních předpisů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** (slovy: Pět tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.

6.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení díla. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí díla.

7.

Bude-li zhotovitel provádět části předmětu díla pomocí subdodavatelů, je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele doložit příslušnou certifikaci vydanou pro využití subdodavatele vztahující se k předmětu činnosti prováděné tímto subdodavatelem na realizovaném díle.

Zhotovitel je povinen zavázat své subdodavatele i ke splnění této povinnosti přímo vůči objednateli, tj. k doložení příslušné certifikace subdodavatele na výzvu objednatele učiněnou přímo využívanému subdodavateli. Změnu subdodavatelů nebo změnu v % podílu plnění jednotlivých subdodavatelů, uvedených zhotovitelem v jeho nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, může zhotovitel v rámci částí díla, které je oprávněn provádět subdodavatelsky, provést pouze s písemným souhlasem objednatele. Provede-li tak bez písemného souhlasu objednatele, považuje se toto porušení povinností za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5%** (slovy: Pět procent), z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to za každou jednotlivou písemně neodsouhlasenou změnu subdodavatelů nebo změnu v % podílu plnění jednotlivých subdodavatelů.

8.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat min. 1 x za kalendářní týden. Konkrétní den v týdnu řádného kontrolního dne bude stanoven v předávacím protokolu.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

2.

Ukončení díla je splněno oboustranně podepsaným předávacím protokolem. Tento protokol o odevzdání a převzetí díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro věci technické, popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V protokolu se pak mimo jiné uvede soupis nedodělků, které dílo obsahuje, s uvedením termínu jejich odstranění.

Zhotovitel je povinen v tomto termínu odstranit všechny takto sepsané vady a nedodělky. Náklady na odstranění vad a nedodělků nese ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody.

3.

Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení a předání díla, především směrem k ustanovení čl. XII. odst. 2 této smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména:

- kopii stavebního deníku,
- prohlášení o vlastnostech – atesty použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů,
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů,
- revize a záznamy zkoušek.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně provedeného díla.

X. ZÁRUKA

1.

Zhotovitel poskytuje na dílo prováděné podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **24 měsíců** od data předání díla.

2.

Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční či jinou majetkovou náhradu.

3.

Zhotovitel je povinen začít s odstraněním reklamovaných závad do 7 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace. V odstraňování závad se zhotovitel zavazuje pokračovat bez přerušení a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné době, nejpozději však v přiměřené lhůtě, kterou objednatel stanovil v reklamaci. Dnem započetí odstraňování reklamovaných závad se rozumí den uvedený v Protokolu o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady. Formulář protokolu o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady je **přílohou č. 3** této smlouvy o dílo. Nebude-li tento protokol obsahovat veškeré dohodnuté náležitosti dle **přílohy č. 3**, má se za to, že zhotovitel k odstranění reklamačních závad nenastoupil. Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen doručit objednateli ve lhůtě pro nastoupení k odstranění reklamačních závad. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad ve stanovené lhůtě nebo v téže lhůtě objednateli nedoručí podepsaný předmětný protokol, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1%** (slovy: Jedno procento) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. X odst. 5 smlouvy.

4.

V případě, že zhotovitel nebude považovat reklamaci objednatele za oprávněnou, zavazuje se nejpozději ve lhůtě dle odst. 4 tohoto článku oznámit objednateli, že požadavek na odstranění vad odmítá včetně uvedení důvodů odmítnutí.

5.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15. dne od vypršení lhůty dle odst. 3 tohoto článku anebo objednateli oznámí, že požadavek na odstranění vad odmítá, je v takových případech objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele a ten je povinen uhradit tyto

náklady objednateli neprodleně po obdržení faktury za provedené práce spojené s odstraněním vad dle tohoto článku, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů od doručení této faktury.

6.

Záruku za jakost lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se pro účely této smlouvy považuje za včas uplatněnou.

7.

Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého díla.

8.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

XI. Odstoupení od smlouvy

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je tato povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou.

2.

Pro odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení obchodního zákoníku, zejména § 344 a násl., není-li dále ujednáno jinak. Odstoupením se smlouva ruší ex nunc, tj. dnem následujícím po doručení právního úkonu odstoupení druhé smluvní straně.

3.

Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

5.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí převjímací řízení“,
- o dílčím předání prací sjednají obě strany protokol,
- strana, která odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy odstoupila, veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky na jiné smluvní sankce, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy zůstávají zachovány, stejně jako i další povinnosti, u kterých z jejich povahy vyplývá, že mají být zachovány i po nastoupení účinků odstoupení od smlouvy.

XII. Některé smluvní sankce

1.

Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřevzme staveniště od objednatele ve sjednaném termínu do 5-ti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, je zhotovitel povinen za každý započatý kalendářní den prodlení zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** (slovy: Půl procenta) z celkové ceny díla

bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo do opožděného zahájení realizace díla.

2.

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla (čl. III.), je povinen za každý kalendářní den prodlení zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** (slovy: Půl procenta) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1).

3.

V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5%** (slovy: Půl procenta) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý případ takového porušení smlouvy.

4.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,03 %** (slovy: Tři setiny procenta) z fakturované dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

5.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby na stavbě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** (slovy: Pět tisíc korun českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní sankce vyvinít, prokáže-li že stavební deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. Nemá-li v době kontroly stavebního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VI. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každou jednotlivou chybějící náležitost.

6.

V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle ZDPH je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1%** (slovy: Jedno procento) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nedoručí objednateli dílčí daňový doklad řádně a včas dle podmínek sjednaných v této smlouvě, a v důsledku tohoto porušení smluvních povinností zhotovitelem následně objednatel nebude objektivně schopen splnit svou zákonnou povinnost přiznat a zaplatit příslušnou daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7.

Pokud zhotovitel poruší ustanovení čl. XIII. odst. 3, této smlouvy (povinnost sjednaného pojištění) nebo na základě výzvy objednatele nepředloží originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** (slovy: Padesát tisíc korun českých).

8.

Jakákoliv ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě neruší povinnost zhotovitele odstranit vady či jiné nedostatky díla ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navíc v plné výši případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativním úmyslem směrem k náhradě škody, tudíž nesnižuje výši případné náhrady škody ani zčásti. Věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

9.

Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil.

XIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této Smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2.

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Poruší-li zhotovitel toto ustanovení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši: 1% (slovy: Jedno procento) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1).

3.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti závazků plynoucích z této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v důsledku provádění díla, a to v min. výši 2.000.000,- Kč (slovy: Tři miliony korun českých). Porušení této povinnosti (sjednání pojistné smlouvy) se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu realizace díla požádat o předložení pojistné smlouvy. Zhotovitel je pak povinen pojistnou smlouvu předložit do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu předložení.

4.

Zhotovitel se dle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zavazuje do 60 dnů od splnění smlouvy předložit objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

5.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6.

Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky ze dne 18. 8. 2016, včetně rozpisu cen a rozsahu a specifikace předmětu plnění
- Příloha č. 2 - Časový harmonogram stavebních prací
- Příloha č. 3 - Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady

V Jeseníku dne

14. 9. 2016



za objednatele

Ing. Libor Halas

předseda představenstva

V Hranicích dne:

12. 9. 2016

za zhotovitele

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.

jednatel společnosti



KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

„ČOV ČESKÁ VES – OBNOVA VSTUPNÍ ČS“

Zadavatel	
Název	Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Sídlo	Tyršova 248, 790 01 Jeseník
IČ	651 38 066
Zastoupený	Ing. Libor Halas, předseda představenstva

Uchazeč	
Obchodní firma/název	KUNST, spol. s r.o.
Sídlo	Palackého 1906, 753 01 Hranice
IČ	19010591
Zapsaný v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka ž90
Statutární orgán	Společnost s ručením omezeným
Osoba zmocněná	Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti
Telefon, mobil	581 699 925, 608 420 354
E-mail kontaktní osoby	Jaroslav.Boran@kunst.cz
ID datové schránky	26ag9ca

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA			
Celková nabídková cena bez DPH	Samostatně DPH		Celková nabídková cena vč. DPH
	15%	21%	
1.296.857,-		272.340,-	1.569.197,-

Níže uvedeným podpisem (y) stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se Zadávací dokumentací. Prohlašujeme, že jsme si před podáním nabídky vyžádali a vyjasnili všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky, v okamžiku podání této nabídky tedy máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Tímto současně prohlašujeme, že přijímáme podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci a tyto jsou nám jasné a srozumitelné.

Datum	18. 8. 2016	 18 KUNST spol. s r.o. Hranice Patentská 1906, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010501
Místo	Hranice	
Podpis		
		Otisk razítka

ČOV Česká Ves - obnova vstupní ČS (rozpis cen)

specifikace zařízení	počet	Cena
Dodávka čerpadel Flygt NP 3153.185 LT vč. chladícího pláště a spouštěcího zařízení	2 sd	612 852
Realizace prací ČS	1 sd	538 005
Provizorní čerpání po dobu výstavby	1 sd	101 000
Uvedení do provozu	1 sd	45 000
Celkem bez DPH v Kč		1 296 857

Rozsah a specifikace předmětu plnění

Předmětem veřejné zakázky je obnova vstupní čerpací stanice na čistírně odpadních vod v České Vsi. Jedná se o dodávku a montáž dvou ponorných čerpadel s parametry $Q=100\text{ l/s}$ $H=9,5\text{ m}$. Čerpadla budou instalována na místě stávajících čerpadel s parametry $Q=210\text{ l/s}$ $H=11\text{ m}$. Čerpadla budou instalována na nová patková kolena a spouštěcí zařízení nerez 1.4301. Na každé patkové koleno bude osazeno nové výtlačné potrubí nerez 1.4301 v dimenzi DN 250mm zaústěné do stávajícího žlabu. Předmětem plnění je rovněž demontáž stávajícího zařízení, potrubí, armatur a vypracování příslušné části projektové dokumentace. Součástí předmětu plnění je i provizorní čerpání splašků během odstávky vstupní ČS na ČOV v České Vsi.

Rozsah dodávky:

- Čerpadlo s chladicím pláštěm **Flygt NP 3153.185 LT**, elektromotor - jmenovitý výkon 13,5 kW, jmenovitý proud 28 A, otáčky 1455 ot/min., napětí 400 V, 50 Hz, start přes FM, krytí IP 68, izolace tř. H (180°C), polootevřené oběžné kolo se samočisticí funkcí, materiálové provedení oběžného kola a protikusu oběžného kola z tvrzené litiny dle EN GJH-HB55
- 10 m kabel připojený k motoru
- Tepelná ochrana vinutí motoru termistory
- Čidlo průsaku ve stroji včetně monitorovací jednotky
- Vyhodnocovací relé
- Patkové koleno včetně montážního materiálu
- Horní držák vodících tyčí nerez včetně montážního materiálu
- ~~Elektronická jednotka pro automatické čištění čerpacích stanic od plovoucích nečistot a usazenin na dně jímky~~ viz. vysvětlení níže
- Spouštěcí zařízení - nerez
- Indukční průtokoměr **SIEMENS** v odděleném provedení pro měření průtoku splašků ve vstupní ČS (průtok 40 – 120 l/s; připojení DN 250, PN 10)
- Potrubí a armatury z nerez
- Revize dokladující funkčnost čerpadel, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu
- Doklady na použité materiály
- Elektro část: odpojení a následné připojení čerpadel a průtokoměrů, úpravy v rozvaděči, přeprogramování frekvenčních měničů, hladinová sonda vč. montáže, úpravy PLC a SW

Další parametry:

- Čerpaná kapalina jsou nepředčištěné splaškové odpadní vody s příměsí písku, max. teplota 25°C
- Čerpané množství 100 l/s
- Dopravní výška 9,5 m
- Průchodnost 100 mm
- Výtlačné hrdlo DN 200 PN 10

Provizorní čerpání splašků během odstávky vstupní ČS:

- Denní bezdeštný přítok je 120-130 l/s
- Noční bezdeštný přítok je 60 - 80 l/s

Vysvětlení nabídky o nepoužití elektronické jednotky pro automatické čištění ČS os plovoucích nečistot.

Funkce elektronické jednotky pro automatické čištění není při chodu čerpadel přes frekvenční měnič technicky možná a nabídka neobsahuje dodávku této elektronické jednotky. Tato funkce je proto řešena v rámci úpravy řídicího systému tak, že čerpadlo bude moci zčerpávat hladinu pod běžnou blokovací úroveň, čímž se vyhovuje požadavku zadání.

Řešení v rámci ŘS: Po uplynutí pauzy mezi automatickým čištěním, nebo po ruční aktivaci automatického čištění povelom z pracoviště operátora, se vypnou všechny čerpadla vstupní ČS.

Jakmile hladina v ČS nastoupá na nastavitelnou zapínací hodnotu, spustí se velké čerpadlo na plný výkon a čerpá do dosažení blokovací hladiny velkých čerpadel.

Poté vypíná a čeká se opět na nastoupání hladiny nad zapínací hodnotu, kdy zapíná druhé velké čerpadlo na max. výkon a vypíná opět na blokovací hladině velkých čerpadel. Opět se počká na nastoupání hladiny na zapínací hodnotu a zapínají na plný výkon obě malé čerpadla, která vypínají na blokovací hladině malých čerpadel (nastavitelné z PC).

Podmínkou pro spuštění automatického čištění je aktuální hodnota součtového průtoku před zahájením čištění. Je-li vyšší než výkon čerpadel, bude čištění odloženo do doby snížení součtového průtoku.

V případě poruchy, nebo vypnutí čerpadla z automatického bude toto z cyklu čištění vyřazeno. Bude-li v poruše nebo vypnuto z aut. režimu jedno z malých čerpadel, bude čištění malými čerpadly z cyklu čištění vyřazeno.

Po ukončení cyklu čištění (ať už spuštěném automaticky, nebo ručně) se začne načítat pauza mezi čištěním. Čas pauzy bude nastavitelný z PC v hodinách.

28/6/2016		1/7/2016		10/7/2016		16/7/2016		22/7/2016		28/7/2016		3/8/2016		9/8/2016		15/8/2016		22/8/2016		28/8/2016		3/9/2016		9/9/2016		15/9/2016		22/9/2016		28/9/2016		3/10/2016		9/10/2016		15/10/2016		22/10/2016		28/10/2016		3/11/2016		9/11/2016		15/11/2016		22/11/2016		28/11/2016		3/12/2016		9/12/2016		15/12/2016		22/12/2016		28/12/2016		3/1/2017		9/1/2017		15/1/2017		22/1/2017		28/1/2017		3/2/2017		9/2/2017		15/2/2017		22/2/2017		28/2/2017		3/3/2017		9/3/2017		15/3/2017		22/3/2017		28/3/2017		3/4/2017		9/4/2017		15/4/2017		22/4/2017		28/4/2017		3/5/2017		9/5/2017		15/5/2017		22/5/2017		28/5/2017		3/6/2017		9/6/2017		15/6/2017		22/6/2017		28/6/2017		3/7/2017		9/7/2017		15/7/2017		22/7/2017		28/7/2017		3/8/2017		9/8/2017		15/8/2017		22/8/2017		28/8/2017		3/9/2017		9/9/2017		15/9/2017		22/9/2017		28/9/2017		3/10/2017		9/10/2017		15/10/2017		22/10/2017		28/10/2017		3/11/2017		9/11/2017		15/11/2017		22/11/2017		28/11/2017		3/12/2017		9/12/2017		15/12/2017		22/12/2017		28/12/2017		3/1/2018		9/1/2018		15/1/2018		22/1/2018		28/1/2018		3/2/2018		9/2/2018		15/2/2018		22/2/2018		28/2/2018		3/3/2018		9/3/2018		15/3/2018		22/3/2018		28/3/2018		3/4/2018		9/4/2018		15/4/2018		22/4/2018		28/4/2018		3/5/2018		9/5/2018		15/5/2018		22/5/2018		28/5/2018		3/6/2018		9/6/2018		15/6/2018		22/6/2018		28/6/2018		3/7/2018		9/7/2018		15/7/2018		22/7/2018		28/7/2018		3/8/2018		9/8/2018		15/8/2018		22/8/2018		28/8/2018		3/9/2018		9/9/2018		15/9/2018		22/9/2018		28/9/2018		3/10/2018		9/10/2018		15/10/2018		22/10/2018		28/10/2018		3/11/2018		9/11/2018		15/11/2018		22/11/2018		28/11/2018		3/12/2018		9/12/2018		15/12/2018		22/12/2018		28/12/2018		3/1/2019		9/1/2019		15/1/2019		22/1/2019		28/1/2019		3/2/2019		9/2/2019		15/2/2019		22/2/2019		28/2/2019		3/3/2019		9/3/2019		15/3/2019		22/3/2019		28/3/2019		3/4/2019		9/4/2019		15/4/2019		22/4/2019		28/4/2019		3/5/2019		9/5/2019		15/5/2019		22/5/2019		28/5/2019		3/6/2019		9/6/2019		15/6/2019		22/6/2019		28/6/2019		3/7/2019		9/7/2019		15/7/2019		22/7/2019		28/7/2019		3/8/2019		9/8/2019		15/8/2019		22/8/2019		28/8/2019		3/9/2019		9/9/2019		15/9/2019		22/9/2019		28/9/2019		3/10/2019		9/10/2019		15/10/2019		22/10/2019		28/10/2019		3/11/2019		9/11/2019		15/11/2019		22/11/2019		28/11/2019		3/12/2019		9/12/2019		15/12/2019		22/12/2019		28/12/2019		3/1/2020		9/1/2020		15/1/2020		22/1/2020		28/1/2020		3/2/2020		9/2/2020		15/2/2020		22/2/2020		28/2/2020		3/3/2020		9/3/2020		15/3/2020		22/3/2020		28/3/2020		3/4/2020		9/4/2020		15/4/2020		22/4/2020		28/4/2020		3/5/2020		9/5/2020		15/5/2020		22/5/2020		28/5/2020		3/6/2020		9/6/2020		15/6/2020		22/6/2020		28/6/2020		3/7/2020		9/7/2020		15/7/2020		22/7/2020		28/7/2020		3/8/2020		9/8/2020		15/8/2020		22/8/2020		28/8/2020		3/9/2020		9/9/2020		15/9/2020		22/9/2020		28/9/2020		3/10/2020		9/10/2020		15/10/2020		22/10/2020		28/10/2020		3/11/2020		9/11/2020		15/11/2020		22/11/2020		28/11/2020		3/12/2020		9/12/2020		15/12/2020		22/12/2020		28/12/2020		3/1/2021		9/1/2021		15/1/2021		22/1/2021		28/1/2021		3/2/2021		9/2/2021		15/2/2021		22/2/2021		28/2/2021		3/3/2021		9/3/2021		15/3/2021		22/3/2021		28/3/2021		3/4/2021		9/4/2021		15/4/2021		22/4/2021		28/4/2021		3/5/2021		9/5/2021		15/5/2021		22/5/2021		28/5/2021		3/6/2021		9/6/2021		15/6/2021		22/6/2021		28/6/2021		3/7/2021		9/7/2021		15/7/2021		22/7/2021		28/7/2021		3/8/2021		9/8/2021		15/8/2021		22/8/2021		28/8/2021		3/9/2021		9/9/2021		15/9/2021		22/9/2021		28/9/2021		3/10/2021		9/10/2021		15/10/2021		22/10/2021		28/10/2021		3/11/2021		9/11/2021		15/11/2021		22/11/2021		28/11/2021		3/12/2021		9/12/2021		15/12/2021		22/12/2021		28/12/2021		3/1/2022		9/1/2022		15/1/2022		22/1/2022		28/1/2022		3/2/2022		9/2/2022		15/2/2022		22/2/2022		28/2/2022		3/3/2022		9/3/2022		15/3/2022		22/3/2022		28/3/2022		3/4/2022		9/4/2022		15/4/2022		22/4/2022		28/4/2022		3/5/2022		9/5/2022		15/5/2022		22/5/2022		28/5/2022		3/6/2022		9/6/2022		15/6/2022		22/6/2022		28/6/2022		3/7/2022		9/7/2022		15/7/2022		22/7/2022		28/7/2022		3/8/2022		9/8/2022		15/8/2022		22/8/2022		28/8/2022		3/9/2022		9/9/2022		15/9/2022		22/9/2022		28/9/2022		3/10/2022		9/10/2022		15/10/2022		22/10/2022		28/10/2022		3/11/2022		9/11/2022		15/11/2022		22/11/2022		28/11/2022		3/12/2022		9/12/2022		15/12/2022		22/12/2022		28/12/2022		3/1/2023		9/1/2023		15/1/2023		22/1/2023		28/1/2023		3/2/2023		9/2/2023		15/2/2023		22/2/2023		28/2/2023		3/3/2023		9/3/2023		15/3/2023		22/3/2023		28/3/2023		3/4/2023		9/4/2023		15/4/2023		22/4/2023		28/4/2023		3/5/2023		9/5/2023		15/5/2023		22/5/2023		28/5/2023		3/6/2023		9/6/2023		15/6/2023		22/6/2023		28/6/2023		3/7/2023		9/7/2023		15/7/2023		22/7/2023		28/7/2023		3/8/2023		9/8/2023		15/8/2023		22/8/2023		28/8/2023		3/9/2023		9/9/2023		15/9/2023		22/9/2023		28/9/2023		3/10/2023		9/10/2023		15/10/2023		22/10/2023		28/10/2023		3/11/2023		9/11/2023		15/11/2023		22/11/2023		28/11/2023		3/12/2023		9/12/2023		15/12/2023		22/12/2023		28/12/2023		3/1/2024		9/1/2024		15/1/2024		22/1/2024		28/1/2024		3/2/2024		9/2/2024		15/2/2024		22/2/2024		28/2/2024		3/3/2024		9/3/2024		15/3/2024		22/3/2024		28/3/2024		3/4/2024		9/4/2024		15/4/2024		22/4/2024		28/4/2024		3/5/2024		9/5/2024		15/5/2024		22/5/2024		28/5/2024		3/6/2024		9/6/2024		15/6/2024		22/6/2024		28/6/2024		3/7/2024		9/7/2024		15/7/2024		22/7/2024		28/7/2024		3/8/2024		9/8/2024		15/8/2024		22/8/2024		28/8/2024		3/9/2024		9/9/2024		15/9/2024		22/9/2024		28/9/2024		3/10/2024		9/10/2024		15/10/2024		22/10/2024		28/10/2024		3/11/2024		9/11/2024		15/11/2024		22/11/2024		28/11/2024		3/12/2024		9/12/2024		15/12/2024		22/12/2024		28/12/2024		3/1/2025		9/1/2025		15/1/2025		22/1/2025		28/1/2025		3/2/2025		9/2/2025		15/2/2025		22/2/2025		28/2/2025		3/3/2025		9/3/2025		15/3/2025		22/3/2025		28/3/2025		3/4/2025		9/4/2025		15/4/2025		22/4/2025		28/4/2025		3/5/2025		9/5/2025		15/5/2025		22/5/2025		28/5/2025		3/6/2025		9/6/2025		15/6/2025		22/6/2025		28/6/2025		3/7/2025		9/7/2025		15/7/2025		22/7/2025		28/7/2025		3/8/2025		9/8/2025		15/8/2025		22/8/2025		28/8/2025		3/9/2025		9/9/2025		15/9/2025		22/9/2025		28/9/2025		3/10/2025		9/10/2025		15/10/2025		22/10/2025		28/10/2025		3/11/2025		9/11/2025		15/11/2025		22/11/2025		28/11/2025		3/12/2025		9/12/2025		15/12/2025		22/12/2025		28/12/2025		3/1/2026		9/1/2026		15/1/2026		22/1/2026		28/1/2026		3/2/2026		9/2/2026		15/2/2026		22/2/2026		28/2/2026		3/3/2026		9/3/2026		15/3/2026		22/3/2026		28/3/2026		3/4/2026		9/4/2026		15/4/2026		22/4/2026		28/4/2026		3/5/2026		9/5/2026		15/5/2026		22/5/2026		28/5/2026		3/6/2026		9/6/2026		15/6/2026		22/6/2026		28/6/2026		3/7/2026		9/7/2026		15/7/2026		22/7/2026		28/7/2026		3/8/2026		9/8/2026		15/8/2026		22/8/2026		28/8/2026		3/9/2026		9/9/2026		15/9/2026		22/9/2026		28/9/2026		3/10/2026		9/10/2026		15/10/2026		22/10/2026		28/10/2026		3/11/2026		9/11/2026		15/11/2026		22/11/2026		28/11/2026		3/12/2026		9/12/2026		15/12/2026		22/12/2026		28/12/2026		3/1/2027		9/1/2027		15/1/2027		22/1/2027		28/1/2027		3/2/2027		9/2/2027		15/2/2027		22/2/2027		28/2/2027		3/3/2027		9/3/2027		15/3/2027		22/3/2027		28/3/2027		3/4/2027		9/4/2027		15/4/2027		22/4/2027		28/4/2027		3/5/2027		9/5/2027		15/5/2027		22/5/2027		28/5/2027		3/6/2027		9/6/2027		15/6/2027		22/6/2027		28/6/2027		3/7/2027		9/7/2027		15/7/2027		22/7/2027		28/7/2027		3/8/2027		9/8/2027		15/8/2027		22/8/2027		28/8/2027		3/9/2027		9/9/2027		15/9/2027		22/9/2027		28/9/2027		3/10/2027		9/10/2027		15/10/2027		22/10/2027		28/10/2027		3/11/2027		9/11/2027		15/11/2027		22/11/2027		28/11/2027		3/12/2027		9/12/2027		15/12/2027		22/12/2027		28/12/2027		3/1/2028		9/1/2028		15/1/2028		22/1/2028		28/1/2028		3/2/2028		9/2/2028		15/2/2028		22/2/2028		28/2/2028		3/3/2028		9/3/2028		15/3/2028		22/3/2028		28/3/2028		3/4/2028		9/4/2028		15/4/2028		22/4/2028		28/4/2028		3/5/2028		9/5/2028		15/5/2028		22/5/2028		28/5/2028		3/6/2028		9/6/2028		15/6/2028		22/6/2028		28/6/2028		3/7/2028		9/7/2028		15/7/2028		22/7/2028		28/7/2028		3/8/2028		9/8/2028		15/8/2028		22/8/2028		28/8/2028		3/9/2028		9/9/2028		15/9/2028		22/9/2028</	
-----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-------------	--

- Příprava

Odsouhlasení typové identifikace investorem

Dodaci lhuba strojů a zařizeni

Montáž


Osazení čerpadel - provozovatel provede bezprostředně před montáží čerpadel

Dokončení, napojení výtlačků

El. instalace

Ovládání

Dokončení dila

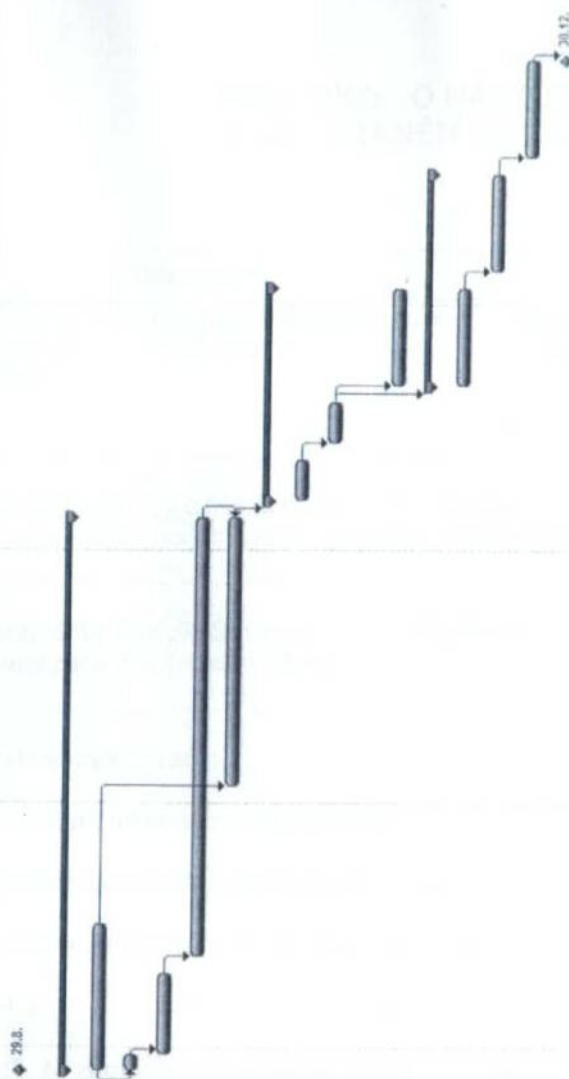

PROTOKOL O NÁSTUPU ZHOTOVITELE K ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY

Objednatel	Zhotovitel
Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01 IČ: 65138066	Název: Sídlo: IČ:
Na základě článku X. ZÁRUKA Smlouvy o dílo ze dne nastupujeme dnem doručení tohoto protokolu k odstranění reklamované vady díla „ČOV ČESKÁ VES – OBNOVA VSTUPNÍ ČS“.	
Délka záruční doby díla dle Smlouvy o dílo: 24 měsíců Ukončení realizace díla (předání stavby):	
1) Název reklamované vady: 2) Datum doručení reklamace objednatelem: 3) Popis způsobu odstranění reklamované vady: 4) Termín odstranění reklamované vady (nesmí být pozdější než termín uvedený v reklamaci objednatele): 5) Poznámka: 6) V případě, že zhotovitel reklamovanou vadu neuznává, popíše níže důvody neuznání reklamované vady (v tomto případě nevyplňuje odrážky 3 – 5):	
Datum a podpis zhotovitele:	
Datum a podpis objednatele prokazující doručení tohoto protokolu:	
